

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXIX
n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289,
E SULL'ENTITÀ DEI LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE,
NONCHÉ RELATIVA RENDICONTAZIONE CONTABILE

(Aggiornata al 30 settembre 2018)

*(Articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97)*

**Presentata dal Commissario di cui all'articolo 86
della legge 27 dicembre 2002, numero 289**

(D'AMBROSIO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2018
—————

PAGINA BIANCA



PREMESSA: La necessità e l'urgenza del trasferimento delle competenze con riferimento alla cessazione dell'Ufficio Commissariale al 31.12.2018

Come già in più occasioni in precedenza segnalato, ferma restando l'utilità di Relazioni di aggiornamento, di elenchi, prospetti, rendiconti (attività peraltro particolarmente gravosa nell'economia della gestione Commissariale basata su una organizzazione assai ristretta¹⁾ e su risorse di funzionamento praticamente nulle²⁾, non è con documentazioni e numeri pur esatti, coerenti e chiari che può pervenirsi ad un trasferimento di competenze organico ed efficace.

E ciò sia in relazione alla varietà e specificità delle competenze Commissariali, sia in relazione alla impossibilità di descrivere e trasmettere quell'essenziale tessuto connettivo che lega i documenti e gli atti a chi dovesse subentrare.

In buona sostanza si è da tempo auspicata da parte di questo Ufficio la individuazione del Soggetto istituzionale subentrante (sempre che sia un solo Soggetto) in un tempo tale da consentire un affiancamento nel corso dell'attuale gestione, per comprenderne le modalità e per acquisire la conoscenza diretta dei rapporti con il territorio, con le Istituzioni, con gli Enti locali ecc., rapporti e riferimenti che hanno valenze diverse non traducibili in resoconti e che concretizzano anni di intenso e certamente produttivo lavoro.

Quanto sopra detto non è banale in quanto l'attività Commissariale, basata su norme degli anni '80 per i completamenti infrastrutturali ex art. 32 L. 219/81, come modificate sotto vari aspetti dal D.Lgs. 163/06, dai Reg. 554/99 e 207/10, dallo stesso D.Lgs. 50/16 per gli appalti e per gli incarichi più recenti, nonché da norme specifiche e speciali in termini progettuali, tecnici, fiscali, di sicurezza ecc., deve contemplare il rispetto rigoroso di tutta la complessa normativa derivante e regolante quindi la propria attività, rispetto confermato ove necessario con pareri giuridici, con controlli successivi da parte degli Organi di Controllo ed indirettamente dalla assenza assoluta di contenziosi nei confronti del Commissario per l'attività specifica ed originale dello stesso e dalle indiscutibili economie registrate a favore della P.A..

D'altronde la nomina del Commissario è intervenuta come espressamente riportato negli atti ufficiali per riconosciuti requisiti e meriti professionali, di integrità e di esperienza nel settore dei LL.PP.³⁾ restando esclusa ogni diversa valutazione.

Si sottolinea che nella malaugurata assenza di individuazione del Soggetto subentrante in tempi idonei, il sottoscritto dovrà necessariamente trasferire al MiSE, che gliel'aveva delegate, le proprie competenze.

Si ritiene che tale eventualità potrebbe determinare un pesante contraccolpo sulla attuale struttura ministeriale, che dovrebbe pertanto urgentemente, ma con tempi ridotti, organizzarsi, con conseguenti rischi di ritardi e di possibili danni economici.

Le numerose proroghe (concretizzate intorno al 30 dicembre di ogni anno) a partire dall'anno 2013 praticamente anno per anno, hanno poi comportato un superlavoro da parte dell'Ufficio impegnato su ricognizioni e rendiconti risultati alla fine non necessari in quella complessità.

¹ L'Ufficio si compone oltre al Commissario come struttura di supporto di sette elementi, uno solo dei quali a tempo pieno. Il Commissario si avvale poi dei Provveditorati competenti per territorio per attività di SUA.

² Come noto la gestione dei lavori per circa 550.000.000 € viene effettuata a fronte di risorse pari a 100.000 €/anno. Si consideri che l'Ufficio è funzionalmente autonomo (acquisto strumentazioni, materiali di consumo ecc.) e che i 100.000 € provengono da economie che lo stesso Ufficio per legge sottrae alle risorse stanziare per lavori.

³ Al sottoscritto è riconosciuta ampia competenza nel settore giuridico ed amministrativo come dimostrano i volumi pubblicati dalla Casa Editrice Giuffrè con contratto decennale.



Anche la presente Relazione, che costituisce la base essenziale sotto il profilo conoscitivo generale dell'attività Commissariale pregressa e residuale, delle strategie gestionali adottate, dell'organizzazione funzionale della Struttura operativa costituita ecc., viene quindi redatta a termini di legge per consentire l'assunzione da parte dei Ministeri competenti delle determinazioni atte a concretizzare il ritorno delle incombenze Commissariali negli ambiti ministeriali istituzionali e/o il trasferimento ad altri soggetti pubblici, a partire dall'1.1.19.

Ancora una volta va poi ribadito che le proroghe non sono state finora concesse per ritardi attribuibili alla gestione Commissariale bensì a differimenti dei finanziamenti (ancora incompleti per la Viabilità Lioni – Grottaminarda), ad attribuzione di competenze ulteriori nel corso degli anni (l'ultima delle quali nell'agosto 2017), ad una burocrazia prossima all'accanimento, a fattori, in una parola, esterni.

Che poi non vi siano mai state pause o intervalli nell'azione Commissariale è rilevabile proprio dalle oltre cento Relazioni di aggiornamento finora prodotte per la DGIAI/MiSE che hanno portato ad oggi la corrispondenza ad oltre 32000 unità ed a quasi 2000 i Decreti con una cadenza ed una periodicità che confermano l'oculatezza della gestione e la capacità di programmazione.

Per ulteriori considerazioni di carattere generale si rinvia necessariamente alle precedenti Relazioni, nelle quali è peraltro ricorrente la segnalazione della gravissima circostanza dell'eliminazione della consulenza giuridica diretta per una distorta ed irrazionale visione della spending-review⁴.

La presente Relazione viene corredata con numerosi allegati grafici, descrittivi e numerici in relazione ai quali, con il Rapporto Finale al 31.12.18, saranno forniti solo e soltanto gli specifici aggiornamenti per ovvie ragioni temporali.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Filippo D'Ambrosio)

⁴ L'appannaggio per funzionamento giusta Finanziaria 2003 era di 300.000 €/anno a carico MiSE, ridotta inopinatamente a 100.000 €/anno a carico Ufficio Commissariale nell'anno 2012. Da considerare che fino a quella data il sottoscritto aveva restituito all'Amministrazione in nome della propria spending-review oltre 100.000€/anno.

**Allegati:**

- 1) **Le principali attività pubbliche delegate al Commissario e qualche considerazione - I finanziamenti**
- 2) **I lavori:**
 - 2a) **Lioni – Grottaminarda – Brochure**
 - 2a.1) I finanziamenti stralcio per stralcio
 - 2a.2) Le Convenzioni di Concessione di Committenza, Atti Aggiuntivi, Contratti stralcio per stralcio
 - 2a.3) Le altre Convenzioni e Concessioni
 - 2a.4) Le spese
 - 2a.5) I cronoprogrammi
 - 2a.6) Le autorizzazioni sismiche
 - 2a.7) I subappalti
 - 2a.8) Le interferenze
 - 2a.9) La trasparenza e la tracciabilità
 - 2a.10) I contenziosi
 - 2a.11) Le transazioni
 - 2a.12) I pareri consultivi
 - 2a.13) L'incentivo
 - 2a.14) Le relazioni sull'attività
 - 2a.15) Gli espropri
 - 2b) **Completamenti ex art. 32 L. 219/81 – Stato dell'arte – Quadro generale economico-finanziario progetti – Tabelle attività contabili e concessorie da concludere**
 - 2b.1) Il trasferimento delle risorse dal MiSE
 - 2b.2) I contratti di appalto
 - 2b.3) I contratti professionali in essere
 - 2b.4) Le spese
 - 2b.5) Lo stato dell'arte
 - 2b.6) I contenziosi e le attività residue
 - 2b.7) Gli espropri e le transazioni
 - 2b.8) I pareri consultivi
 - 2b.9) L'incentivo
 - 2b.10) Le relazioni e i rendiconti
 - 2b.11) La trasparenza – v. punto 2a.9)
- 3) **L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Commissariale**
- 4) **La contabilità ordinaria – La delega dal DG**



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

1) LE ATTIVITA' DELEGATE ALL'UFFICIO COMMISSARIALE (L. 289/02 ART. 86)

L'Ufficio Commissariale è stato istituito con L. 289/02 ed ha assunto tutte le incombenze in materia di infrastrutture di cui all'art. 32 L. 219/81 dell'allora Ufficio B5 della Direzione Incentivi del Ministero delle Attività Produttive, composto nel 2002 da circa 30 elementi, venti dei quali dedicati esclusivamente ai LL.PP.

Commissario è stato nominato l'Ing. Filippo D'Ambrosio con specifico D.M. del 21.2.03 registrato alla Corte dei Conti il 14.4.2003 – Ufficio di controllo atti Ministero delle Attività Produttive (oggi M.S.E.) e pubblicato nella G.U.R.I. n.120 del 26.5.03, successivamente integrato con D.M. 21.12.2005.

Le incombenze dell'Ufficio sono di seguito elencate:

- A) interventi di ripristino su opere ex art. 32 L. 219/81 risultate danneggiate alla data di trasferimento a questo Ufficio, ancora da consegnare agli Enti gestori (c.1 art. 86) pur se già collaudate;
- B) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere ultimate e collaudate (c.1 art. 86), chiusure contabili e concessorie;
- C) programmazione, affidamento a concessione di committenza, direzione, esecuzione, collaudo e consegna di infrastrutture di completamento funzionale di schemi infrastrutturali già attivati ante 28.2.91 comprese tutte le incombenze connesse con le attività espropriative (c.1 art. 86). Sotto tale voce ricade la Viabilità Lioni – Grottaminarda;
- D) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di completamento infrastrutturale ricompresi nell'ambito di concessioni revocate dal MAP (oggi MiSE) e rimasti abbandonati da anni comprese attività espropriativa residua e supporto al Contenzioso (c.2 art. 86). Trattasi di importanti interventi di completamento su quattro originarie, notevoli opere incompiute e in situazione di grave degrado per la parte già realizzata;
- E) completamento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività espropriativa incompiuta e collaudazione di tutte le restanti opere pubbliche già di competenza dell'Ufficio B5/DGSAI (v. DM 21.12.2005) originariamente con una sola eccezione (prog. 6053) in quanto alla data del 21.2.2003 già in istruttoria la certificazione di collaudo presso il MiSE (c.1 e c.2 art. 86); nell'agosto 2017 anche tale progetto è stato trasferito al Commissario con apposito D.M. per il completamento di tutte le attività e per gli eventuali interventi costruttivi.

I progetti ex art. 32 di competenza Commissariale sono stati così portati a 72.



- F) organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Commissariale (c.3 art. 86 L. 289/02; v. anche art. 49 L. 134/12). Nell'ambito del c.3 art. 86 ricade anche l'incombenza di valutare l'onere derivante dal completamento e di informarne il CIPE. A tutt'oggi non è stata chiesta alcuna ulteriore risorsa rispetto a quanto residuo dal 1997 per i lavori di completamento infrastrutturale e restano ferme le previsioni economiche formulate nell'anno 2009 per i lavori di completamento funzionale.

Detto Ufficio è autonomo nella propria gestione (acquisti, materiale di consumo ecc. ecc.) per la quale però dal 2012 riceve € 100.000,00/anno¹⁾, assolutamente insufficienti in quanto comprensive del corrispettivo per il Commissario pari ad € 65.000/anno.

Per giunta tali 100.000 € devono essere prelevate da apodittiche economie sui lavori di competenza dello stesso Commissario.

Il Commissario dimostra la continua e costante presenza, per ragioni di trasparenza, timbrando giornalmente entrata ed uscita, comunicando i giorni di missione alla DGIAI e garantendo la propria reperibilità 24h/24. Non ha alcun giorno di *malattia* dall'anno 2003 e le *ferie* non raggiungono i 15 gg complessivi all'anno.

I risultati dell'attività Commissariale sono riportati:

- bimestralmente in relazioni al MiSE,
- semestralmente e a fine anno al Parlamento,
- annualmente alla Corte dei Conti.

E' facile pertanto comprendere la vastità della materia, la sua diversità, la difficoltà gestionale e le relative responsabilità.

Tutti gli interventi costruttivi sono effettuati sostanzialmente con solo personale pubblico (del MiSE ²⁾ e dei Provveditorati avvalsi³⁾) che svolge pertanto importanti funzioni di D.L., RUP, progettuali ecc.

Il personale MiSE opera anche fuori orario di Ufficio, ed è sempre reperibile anche nei giorni festivi; dall'anno 2012 è escluso da ogni progetto finalizzato (non più possibile per la riduzione da 300.000 a 100.000 €/anno delle risorse gestionali).

Ad oggi sono stati emessi 1952 Decreti e la corrispondenza assomma a oltre 32.200 unità, con una media di circa 10 unità al giorno.

I progetti di competenza relativi ai completamenti infrastrutturali (sostanzialmente conclusi nella gran parte) sono stati come detto 72, oltre alla Viabilità Lioni – Grottaminarda di cui sono in corso 2 lotti per 4 stralci totali. Mancano tuttora 70M€ di competenza MIT (in attesa stanziamento CIPE), perché per il resto le Del. CIPE 62/11, 27/12, 65/16 coprono 360M€ su 430M€ complessivi di progetto.

¹ Da sottolineare che la Legge 289/02 dava al Commissario per la gestione, su fondi Ministero, € 300.000,00/anno (100.000 almeno dei quali restituiti come economie dal Commissario stesso ogni anno). Con la inconcepibile riduzione a 100.000€/anno sono iniziate gravi difficoltà operative e soprattutto la perdita della indispensabile consulenza giuridica diretta.

² Trattasi di sei elementi part-time più uno a tempo pieno (Coordinamento Segreteria).

³ Per le convenzioni con i Provveditorati vedi anche nel seguito

Il Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
MiSE – Viale America 201 – 00144 ROMA
Tel. 06.54927818-7763 – Fax 06.54927828

filippo.dambrosio@mise.gov.it – commissarioadacta@pec.mise.gov.it



Le operazioni di trasferimento delle competenze residue entro il 31.12 p.v. sono pertanto alquanto complesse ed il Commissario fin dall'anno 2012 rappresenta tali difficoltà, superabili a proprio giudizio solo con un affiancamento immediato e costante da parte del/i consegnatario/i.

Il numero notevole di chiari e precisi elenchi, prospetti, previsioni, pratiche in corso (si pensi alle notevoli operazioni in essere in campo espropriativo su alcuni dei progetti di completamento, alle situazioni rappresentate dal prog. 6053 trasferito al Commissario solo nell'anno 2017 ecc.) possono fornire esclusivamente dati statistici, dove invece è necessario entrare nel merito attivo ed operativo.

I risultati principali poi, più volte riportati con relazioni e rendiconti, dell'attività dell'Ufficio sono in sintesi riconducibili a:

- economicità della gestione (risulteranno certamente economie finali sulle risorse risalenti all'anno 1997 per interventi inferiori a quelli realizzati);
- assenza di contenziosi contro il Commissario;
- assenza di incidenti sul lavoro e di rilievi sulla gestione;
- trasparenza e tracciabilità anche con strumenti specifici (rapporti con Prefetture, distribuzione di brochure sull'attività, disponibilità ad ogni incontro e consultazione, pubblicità affidamenti ecc.);
- ottimi rapporti con il territorio e con i cittadini (circa 800 transazioni con risparmi milionari per l'Erario);
- soluzioni progettuali anche di avanguardia e clausole contrattuali più favorevoli all'Amministrazione.

Per quanto esposto il Commissario ribadisce la necessità di attivare ogni azione perché il trasferimento di competenze al 31.12 p.v. non possa determinare possibili soluzioni di continuità nel prosieguo.

Ipotesi di ulteriori proroghe vengono escluse dallo stesso Commissario per motivi che vanno dall'impegno superiore ad ogni resistenza anche fisica propria e del proprio personale, ormai altamente qualificato ma strettamente incardinato in una organizzazione gestionale con criteri e regole non facilmente trasferibili in una struttura ministeriale, alla carenza assoluta di risorse per la gestione, all'assenza di riconoscimenti economici per i propri collaboratori, alla scarsa considerazione del MiSE sull'operazione di recupero e completamento, lavori, contabilità, espropriazioni, contrattualistica finora effettuata ed ampiamente dimostrabile.

Si precisa che tutto quanto riportato e dichiarato è conforme alla verità e dimostrabile per tabulas.



Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero delle Infrastrutture

Regione Campania

S.S.V. LIONI – GROTTAMINARDA



30 settembre 2018

PAGINA BIANCA

È inoltre in previsione la Stazione Comprensoriale "Ariano 2" ovvero l'unica fermata in Irpinia della tratta Caserta -Bari con annesso interporto per scalo merci (località Fiumarelle)

Pertanto il completamento dell'itinerario Contursi (A3) – Grottaminarda (A16) attraverso la realizzazione dei 20 km d'asse della **Lioni – Grottaminarda**, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli ,Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali ferroviari ed intermodali.

In larga scala, l'intervento in esame costituisce la possibilità di realizzare un sistema infrastrutturale maggiormente interconnesso e gerarchizzato, attraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a "rete" auspicato dal Piano Generale dei Trasporti; consentirà, infatti, di inserire le aree interne dell'Irpinia negli itinerari nazionali di comunicazione e nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento dell'arteria con la stazione Irpinia della futura linea ferroviaria ad **alta capacità Napoli - Bari** e con il terminal bus **dell'Air a Grottaminarda**.

Infine rappresenterà una importante via di fuga ovvero di rapido soccorso in caso di calamità ed una certezza in termini di sicurezza e di tempi di percorribilità.

Finalità dell'intervento:

- Collegamento Lioni (S. Angelo dei Lombardi) con Grottaminarda in provincia di Avellino, assolvendo alla funzione di completare l'asse Contursi - Grottaminarda previsto nello schema viario a livello territoriale interregionale ed in buona parte già realizzato (tratto Contursi –Lioni - S. Angelo dei Lombardi).
- Realizzare il collegamento tra le autostrade A16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salerno - Reggio Calabria)
- Prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso sud-ovest fino ad Agropoli e verso nord-est fino a Termoli (A14).



Criticità del sistema viario attuale:

- Inadeguato a realizzare un collegamento di livello interregionale A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli).
- Non connette la rete locale con quella regionale.
- Non è idoneo a soddisfare le caratteristiche della domanda di traffico civile e commerciale attuale e futura.
- Non garantisce sufficiente accessibilità al territorio, alle concentrazioni produttive, ai bacini di manodopera.
- Non è dotato dei necessari ed omogenei livelli di sicurezza.



Vantaggi apportati dall'intervento:

- Favorire lo sviluppo degli insediamenti produttivi presenti nell'area attraverso il collegamento tra di loro e con le direttrici autostradali ed i principali porti del sud Italia
- Conferire maggiore accessibilità ai comuni ed alle attività locali:
 - 14 comuni serviti
 - ≈ 50.000 abitanti
 - 3 Sistemi locali del lavoro
 - 3700 spostamenti generati
 - 3800 spostamenti attratti
- Migliorare l'accessibilità con la valle Ufita
- Ridurre le distanze e i tempi di percorrenza:
- Incrementare l'accessibilità per il territorio interno della provincia di Avellino
- Adeguare i livelli di sicurezza
- Integrare con una ulteriore tratta il previsto corridoio Tirreno - Adriatico

Descrizione sintetica

Al di là delle prospettive di prosecuzione dell'itinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a Termoli (A14), la nuova infrastruttura consentirà nell'immediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona ed un più agevole collegamento tra queste e le Autostrade A16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salerno - Reggio Calabria), oltre che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area.

L'opera stradale è localizzata nella Regione Campania, interamente nel territorio della provincia di Avellino; i territori comunali direttamente interessati sono S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottoamminarda.

L'intero tracciato di lunghezza circa 19,5 km (al netto degli svincoli) è previsto in nuova sede, e insiste sostanzialmente su territori destinati a "zona agricola" nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali.

La fascia di intervento interessata dall'itinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono di modesta entità anche nella zona urbana di Grottoamminarda a maggiore consistenza insediativa.



L'infrastruttura in esame è prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le attraversa.

Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada attraversa territori che, se pur ricadenti in comprensorio di certo interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di prevedibili rinvenimenti di significativa importanza.


Per quanto riguarda il rischio frana, gli studi di settore hanno evidenziato le tratte ricadenti in ambiti di attenzione e per essi sono state dimensionate "opere di risanamento e/o sostegno" compatibili con l'ambiente circostante.

Notevoli sono gli interventi al contorno, con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche.

Caratteristiche tecniche:

• Sezione	tipo C1 D.M. 05/11/2001	
• Intervallo velocità di progetto	60 - 100 Km/h	
• Pendenza longitudinale (corsia di arrampicamento)	max. 4,85 %	max. 6,09% tra km 17+940 e 19+050
• Lunghezza max dei rettilinei	940 m	
• Raggio di curvatura planimetrico minimo:	620 m	
• Raggio di curvatura altimetrico minimo:	10.000 m	
• Sviluppo complessivo del tracciato	19.980 m	
• N. 17 gallerie artificiali	1818,30 m	
• N. 3 gallerie naturali	3265 m	
• N. 16 Viadotti	4357 m	
• N. 6 Sottovia scatolari		
• N. 24 Tombini		
• Tratti in trincea 20% sviluppo complessivo		
• Tratti in rilevato 30% sviluppo complessivo		
• Svincoli previsti (*)	5 :	
		• S. Angelo dei Lombardi;
		• Villamaina - Terme di San Teodoro;
		• Frigento;
		• Gesualdo;
		• di collegamento con la Variante alla S.S. 90

(*) Oltre all'innesto finale in rotatoria sulla SP 36 in prossimità del casello autostradale di Grottaminarda della A16 Napoli - Bari

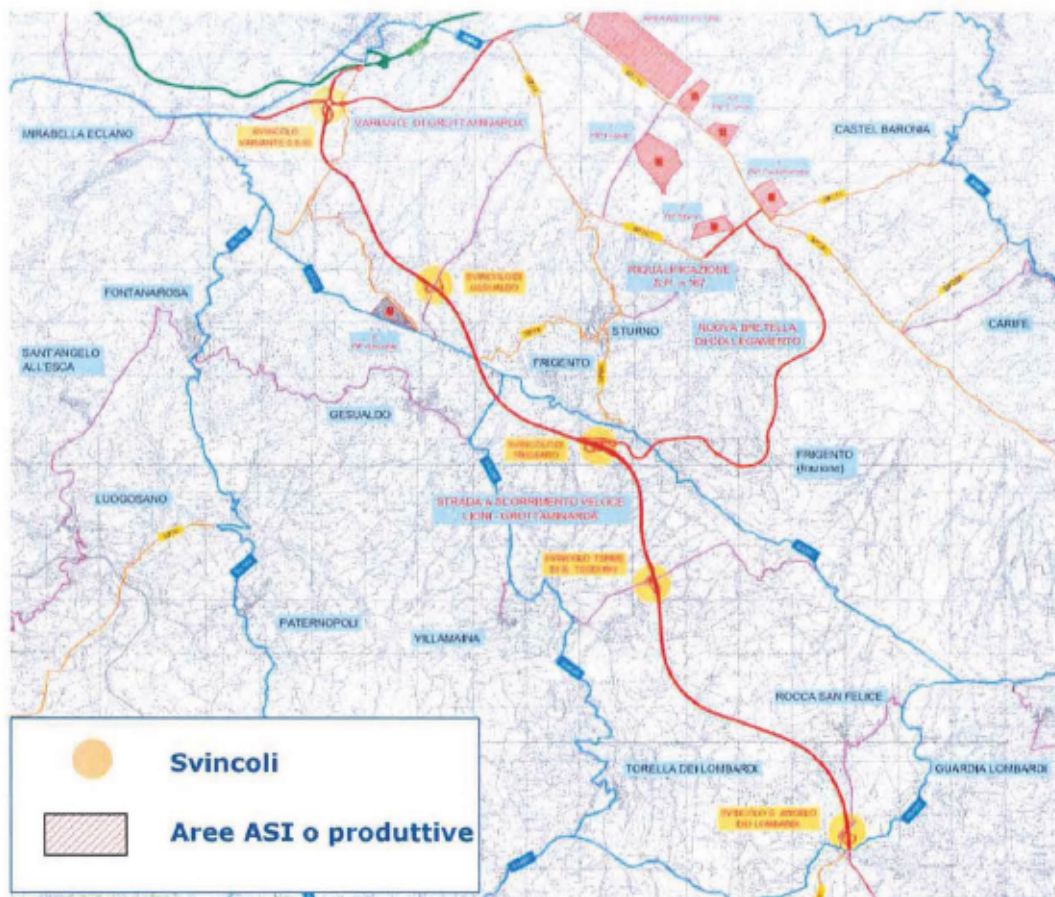

Dall'inquadramento funzionale, per la strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocità di progetto (60+100) km/h. Per quanto riguarda la sezione trasversale, è stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un'unica carreggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banchine laterali pari a 1,50 m, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m.


Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d'arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state prese in considerazione le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato oltre che la configurazione geometrica delle singole opere; la scelta delle tecniche costruttive adottate è passata, come accennato, anche attraverso un'attenta valutazione dell'inserimento ambientale dell'opera stessa e del suo aspetto estetico finale.



Gli interventi d'inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unità ambientali in grado di assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastruttura con le unità ambientali esistenti favorendo, nel contempo, il recupero vegetazionale dell'area interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggio o su specifici aspetti di natura geomorfologica.

Nei primi 6.5 km del tracciato (individuati dall'Ufficio Commissariale come 2° Lotto – Infrasad), ricadono cinque viadotti, sul fiume Fredane e nei valloni compresi tra il sistema collinare e il bacino del Fredane stesso, mentre nella restante parte del tracciato (1° Lotto – Infracv), ricadono dieci viadotti, localizzati nelle aree di maggiore qualità ambientale, nei valloni compresi tra il sistema collinare e i due bacini del Fredane e dell'Ufita.

Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione degli impatti visuali e paesaggistici con impianti di raccordo degli elementi della struttura (pile, spalle) con le formazioni vegetali presenti ai margini; dall'altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree sottoviadotto.



2. Iter amministrativo

Il progetto esecutivo dell'opera, articolato in 1° Lotto (competenza Infrav) e 2° Lotto in continuità (competenza Infrasad) è stato approvato dal Commissario ad Acta ex articolo 2 legge 289/02 con apposito decreto n° 709 del 28/7/2010.

Tale decreto riassume il precedente iter amministrativo a partire dall'originario affidamento in concessione ai Consorzi INFRASUD ed INFR.AV in virtù della art. 32 della legge 219/81 e dell'art. 86 della L. 289/02.

Il suddetto decreto di approvazione all'articolo 1 recita quanto segue:

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA-BA (Svincolo di Grottaminarda)" redatto dal Consorzio INFRASUD per il tratto dalla progressiva 0+450 alla progressiva 6+500 e dal Consorzio INFR.AV per il tratto dalla progressiva 6+500 alla progressiva 19+980 per l'importo complessivo di €430.000.000,00 articolato come segue :

LAVORI IN CONCESSIONE	Tratto INFRASUD (denominato 2° LOTTO) – da progr. 0+450 a progr. 6+500	Tratto INFR.AV (denominato 1° LOTTO) - da progr. 6+500 a progr. 19+980
Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D)	124.278.064,50	227.565.421,77
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima)	5.714.684,74	10.092.570,89
Oneri di concessione (6,00%)	7.456.683,87	13.653.925,31
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio)	1.657.506,16	7.334.028,94
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie	676.150,00	1.302.400,00
Imprevisti	15.362.841,19	
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	14.073.739,45	
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006	831.983,18	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	430.000.000,00	

L'attribuzione dell'importo complessivo del progetto, distribuendo anche le voci comuni, è di euro 150.055.806,69 al tratto INFRASUD e di euro 279.944.193,31 al tratto INFR.AV.

All'articolo 2 dello stesso decreto di approvazione viene stabilito che in caso di finanziamento parziale rispetto alla somma totale sopra determinata si proceda per stralci sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi tempi di assegnazione ferme restando condizioni rivolte a conservare invariato l'importo di progetto a carico dell'Amministrazione.

Tra dette condizioni particolari si richiamano:

- inserimento di una clausola contrattuale che limita il pagamento dei lavori a misura agli importi di stima complessiva progettuale ed ove la contabilità effettiva superasse tale limite esclusione di qualsiasi riconoscimento economico. Ovviamente è prevista la compensazione nell'ambito dei lavori a misura perché obiettivo è che non si superi l'importo totale di tali lavori a misura come stimato ed approvato.

Ovviamente essendo il progetto finanziato per stralci, tale compensazione andrebbe effettuata per ogni stralcio.

Non tutti hanno compreso i benefici di tale condizione.

- Esclusione di riconoscimenti economici e/o di aggiornamenti qualsiasi sia il numero di stralci e qualsiasi siano i tempi di finanziamento, ed altresì esclusione di qualsiasi corrispettivo nel caso di finanziamento parziale dell'opera con contestuale acquisizione da parte dell'Amministrazione del progetto non realizzato a titolo assolutamente gratuito.
- Realizzazione a carico dei Concessionari di qualsiasi interferenza da spostare ove già esistente e non censita progettualmente.
- Assunzione a carico del Concessionario delle spese legali in caso di contenziosi nel settore espropriativo delegato.
- Altre condizioni restrittive e cautelative per l'Amministrazione, che rendono minimi i rischi di maggiori oneri (ad es. per interessi) per il pubblico Erario.

3. Descrizione dei lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all'attualità

Con deliberazione n° 62 del 3/8/2011 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del 31/12/2011, nell'ambito dell'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud, venne assegnato all'opera in oggetto un primo finanziamento regionale di **220 milioni di Euro** per la realizzazione di un lotto funzionale nell'ambito della tratta Lioni - Grottaminarda dell'asse nord/sud Tirreno – Adriatico.

Il Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti i soggetti interessati presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise, individuava la tratta funzionale nella tratta Grottaminarda – Frigento per l'importo suddetto.

Con deliberazione n° 27 del 23/3/2012 del CIPE, vennero assegnati ulteriori **70 milioni di Euro** su finanziamento statale, distribuiti sulle 5 annualità dal 2012 al 2016 e destinati specificamente al tratto tra lo Svincolo di Frigento e lo svincolo Terme di San Teodoro (Villamaina).

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse già trasferite di cui:

- al Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007 di **euro 2,5 milioni**, ad oggi assegnato sulla c.s. commissariale per euro 2,4 milioni;
- al Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania n° 148 del 24 luglio 2009 di **euro 2,5 milioni**.

portava l'ammontare complessivo degli stanziamenti a **euro 295 milioni**.

Tenuto conto delle somme così come sopra definite fu possibile rimodulare nel corso del 2012 gli stralci funzionali realizzabili come appresso:

Una tratta funzionale, di importo pari a **euro 260 milioni** (suddivisibile in stralci secondo gli effettivi finanziamenti), che prevedeva la realizzazione del tratto di strada compreso tra gli svincoli di Grottaminarda - Frigento- San Teodoro (Villamaina) inclusi i due svincoli di estremità e gli svincoli interni per Gesualdo, Frigento e di collegamento con la variante S.S.90. Inoltre è inclusa la riqualificazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S. 428.

Tale tratta consente un agevole collegamento tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Inoltre consente, sempre attraverso la strada comunale Napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428.

Detta tratta funzionale comprendeva per intero lo stralcio Grottaminarda – Frigento di cui al Verbale del 28.11.2011 sopra citato.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale tratta funzionale venne suddivisa nelle seguenti sub tratte:

- da **progressiva 7+125 a progressiva 11+937** per euro 70.000.000 (finanziamento MIT) a valere sulla Delibera CIPE n° 27 del 23 marzo 2012 e definita dall'Ufficio Commissariale 1° Lotto, 1° Stralcio, da Frigento allo Svincolo di San Teodoro (Villamaina);

- da **progressiva 11+937 a progressiva 19+980**; per euro 190.000.000 a valere per :
 - o Euro 186.375.000 sulla Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011;
 - o euro 1.500.000 sul Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007;
 - o euro 2.125.000 sul Decreto Dirig. Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania n° 148.

Una seconda tratta funzionale (finanziamento regionale), di **euro 35 milioni** (completamento ai 295 milioni di euro in argomento), che prevedeva la realizzazione dello svincolo per Sant'Angelo dei Lombardi ed il completamento della strada fino al km 1+925 ed il collegamento con la S.P.217.

Proseguendo lungo la S.P.217 per circa 7.5 km si arriva sulla strada comunale Napoletana di cui si è detto, percorrendo la quale, per circa 1.5 km si arriva allo svincolo di Terme San Teodoro (Villamaina).

Tale tratta (indicata come 2° Lotto 1° Stralcio), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente l'immissione della strada esistente Lioni - S. Angelo dei Lombardi alla S.P. n° 78, permette di migliorare il collegamento attuale, che si presenta, allo stato, parziale e con caratteristiche geometriche non compatibili con le disposizioni della normativa vigente, ma soprattutto, consente attraverso il collegamento con la S.P.217, posto al km 1+925, di allacciarsi al 1° stralcio funzionale che parte dallo svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaina) e termina a Grottaminarda.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomento e alla luce della intervenuta delibera CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale stralcio funzionale veniva così finanziato:

- o Euro 33.625.000 a valere su Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011;
- o euro 1.000.000 a valere su Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007;
- o euro 375.000 a valere su Decreto Dirig. dell'Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania n° 148.

In conclusione, per rendere attuabili tratte funzionali, l'importo di **220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011 del CIPE** venne distribuito in via definitiva come segue:

- 186.375.000 di Euro al lotto n° I (realizzando il secondo stralcio funzionale in prosecuzione con il 1° stralcio finanziato dal MIT per euro 70 milioni)
- 33.625.000 di Euro al lotto n° II (realizzando il primo stralcio di tale lotto)

Al riguardo, con Delibera della Giunta Regionale n° 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC n° 85 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto: FSC 2007 – 2013. Delibera CIPE n° 62/2011. Atto aggiuntivo all'APQ "Sistemi di mobilità". Modifica ed integrazione delle DDGGRR 200/2014 e 473/2014", la Regione Campania ha deliberato "di confermare nell'Atto Aggiuntivo all'APQ "Sistemi di mobilità" l'intervento di competenza nazionale già individuato nella delibera CIPE n. 62/11 che risulta già dotato di OGV, costituito da "Asse Nord/Sud Tirreno Adriatico: Lauria – Contursi – Grottaminarda – Termoli – Candela. Tratta Lioni – Grottaminarda. 1° lotto" del costo di 220,00 ME (Soggetto attuatore Commissario ad Acta ex L. 289/2002).

In data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania (Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo e Dipartimento delle Politiche Territoriali – Direzione Generale per la Mobilità), l'Accordo di Programma Quadro "Sistemi di mobilità" relativo alla più volte richiamata Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011.

A seguire, con Delibera della Giunta Regionale n° 47 del 9 febbraio 2015 pubblicata sul BURC n° 13 del 26 febbraio 2015, avente ad oggetto: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015 – 2017 della Regione Campania – Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017. Modifica n. 367 dell'8 agosto 2014", la Regione Campania ha deliberato "di iscrivere le entrate derivanti da assegnazioni

vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della L.R. 5 gennaio 2015, n. 1* (All. 10 alla Delibera).

Nel dettaglio, nell'Allegato 10, alla voce "FSC 2007 – 2013: Accordo di Programma QuadroTratta Lioni – Grottaminarda 1° Lotto – Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011", vengono previsti per competenza vincolata nel triennio 2015 – 2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui euro 60 milioni per cassa nel 2015, euro 55 milioni nel 2016 ed euro 60 milioni nel 2017. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 45 milioni di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità successive, come da Decreto Dirigenziale n° 12/2015.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la rimodulazione dei flussi finanziari dell'intervento di che trattasi, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17 milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 58.564.010,00 di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità 2019 - 2020.

Le assegnazioni di cui alle Delib. CIPE 62/2011 e 27/2012, congiuntamente alle deliberazioni regionali di cui sopra, erano rivolte, si ripete, a consentire la realizzazione delle due tratte funzionali di cui si è detto, per un ammontare complessivo di **295 milioni di Euro** così distinte:

- **260 milioni** di Euro alla **tratta funzionale I** (competenza Infrav, in costruzione per il 1° Stralcio funzionale e per il 2° Stralcio 1° Costruttivo)
- **35 milioni** di Euro alla **tratta funzionale II** (competenza Infrasad, da affidare)

Si evidenzia quindi che, con tali risorse, sarebbe stato possibile realizzare l'asse stradale per circa due terzi del suo sviluppo, con un significativo incremento sia di funzionalità che in termini di benefici per il territorio attraversato.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei due lotti funzionali, come definito nel corso dell'anno 2012, in analogia con il quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07.2010.

LAVORI IN CONCESSIONE	Tratto INFRASUD Progr. 0+450 a 1+925	Tratto INFR.AV Progr. 7+125 a 19+980
Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D)	28.508.080,00	211.485.356,24
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima)	1.229.237,00	9.575.816,51
Oneri di concessione (6,00%)	1.710.435,00	12.689.121,37
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio)	865.409,27	7.830.076,73
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie	434.650,00	1.302.400,00
Imprevisti	9.192.810,74	
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	9.599.737,25	
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006	576.819,89	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	295.000.000	

Successivamente, nel corso dell'anno 2016, la Regione Campania ha richiesto un ulteriore importo per **€/mln 65** nell'ambito del "Piano Sud" per la parte priva ancora di copertura finanziaria all'interno del "Programma di Azione e Coesione 2014 – 2020. PROGRAMMA COMPLEMENTARE REGIONE CAMPANIA – Delibera 11/2016 approvato dal CIPE in data 01/05/2016 e pubblicato sulla GU Ord. n. 186 del 10/08/2016.

L'importo di **€/mln 65** è presente nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n° 54 dell'1 dicembre 2016, in G.U. n° 88 del 14 aprile 2017.

Con la Delibera CIPE n° 54/2016, gli importi ad oggi complessivamente stanziati sono i seguenti:

A. Finanziamento Ministero Infrastr.Trasporti:

a) Delib. CIPE 27 del 23 marzo 2012	euro x mln	70,00
-------------------------------------	------------	--------------

B. Regione Campania:

a) Delib. G. Reg. Camp. 1029 del 22.06.2007	euro x mln	2,50
b) Del. Dir. Area Coord. LL.PP. Camp.148 24.07.2009	euro x mln	2,50
c) Delib. CIPE 62 del 3 agosto 2011 (Fondi FSC)	euro x mln	220,00
d) Delib. CIPE 54 DEL 1 dicembre 2016 (Fondi FSC)	euro x mln	<u>65,00</u>

Totale finanziamenti Regione deliberati	euro x mln	290,00
---	------------	---------------

C. Totale finanziamenti MIT + Regione deliberati	euro x mln	360,00
---	-------------------	---------------

Tenendo conto degli stanziamenti/finanziamenti deliberati, residuano quindi da stanziare **€ 70 milioni**, tutti a carico del MIT in base all'accordo Stato – Regione dell' 1 agosto 2008.

In considerazione dell'ulteriore stanziamento di cui alla Delibera CIPE n° 54/2016, nel mese di luglio 2018, su richiesta della Regione Campania, i Lotti e gli stralci costruttivi realizzabili all'attualità sono stati sostanzialmente rimodulati come segue:

A. Realizzazione dell'intero 1° Lotto (tratta Consorzio INFR.AV.) da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (costo dell'intervento euro 279.944.193,31), attingendo dai seguenti stanziamenti:

a. Delibera CIPE n° 27/2012 (Fondi MIT)	euro	70.000.000,00
b. Delibera CIPE n° 62/2011 (Fondi FSC)	euro	209.944.193,31
per complessivi	euro	279.944.193,31

B. Realizzazione del 2° Lotto, tratta Consorzio INFRASUD da progr. 0 + 450 a progr. 3 + 052 (costo dell'intervento euro 65.000.000,00) attingendo dal seguente stanziamento:

a. Delibera CIPE n° 54/2016 (Fondi FSC)	euro	65.000.000,00
---	-------------	----------------------

Il rimanente stanziamento di euro 10.055.806,69, portato dalla Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011, così come l'importo complessivo di euro 5 milioni portato dalle due Delibere regionali del 2007 e 2009, è da destinare nella tratta residua del 2° Lotto.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei lotti, così come ridefinito nel mese di luglio 2018, in analogia con il quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07.2010.

Nel quadro di spesa non sono riportati euro 15.055.806,68 (residuo Delibera CIPE 62/2011 e Delib. Reg. 2007 e 2009), in quanto, come detto, la relativa tratta realizzabile è ancora da definire.

LAVORI IN CONCESSIONE	Tratto INFRASUD Progr. 0+450 a 3+052	Tratto INFR.AV Progr. 6+500 a 19+980
Importo netto lavori	53.688.356,34	227.217.490,70
Oneri Speciali di sicurezza	2.469.664,39	10.092.570,89
Oneri di concessione (6,00%)	3.221.301,38	13.633.049,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Espropriazioni	1.200.000,00	8.434.133,28
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie	509.650,00	1.302.400,00
Imprevisti		11.272.380,65
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)		11.236.233,88
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006		666.962,36
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	344.944.193,31	

4. Descrizione delle tratte da finanziare per il completamento dell'intervento

Tenuto conto dei finanziamenti e stanziamenti di cui al punto precedente, per il completamento dell'opera occorre un ulteriore stanziamento di **euro 70 milioni**, che consentirà, **unitamente all'importo di euro 15.055.806,68** indicato nel precedente paragrafo, il completamento del tratto, di competenza del Consorzio INFRASUD, **da progressiva 3+052 a progr. 6 + 500**, del valore complessivo di **euro 85.055.806,68**, e, quindi, di tutta la SSV Lioni – Grottaminarda.

Il quadro di spesa relativo al tratto residuo di euro 85.055.806,68 viene qui riportato:

LAVORI IN CONCESSIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO	Tratto INFRASUD Progr. 3+052 a progr. 6+500
Importo netto lavori	70.589.708,16
Oneri Speciali di sicurezza	3.245.020,35
Oneri di concessione (6,00%)	4.235.382,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di esproprio)	706.042,08
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in economia, consulenze e varie	166.500,00
Imprevisti	3.124.544,46
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	2.823.588,33
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006	165.020,82
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	85.055.806,68

IMPORTO TRATTE DA RISORSE STANZIATE360.000.000,00
IMPORTO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO.....	70.000.000,00
TOTALE.....	.430.000.000,00

5. 1° Lotto, 1° Stralcio in esecuzione (*) (Finanziamento MIT Delib. CIPE 27/2012)

La disponibilità della somma di **euro 70 milioni** di cui al deliberazione CIPE n° 27 del 23/3/2012 ha portato, nell'ambito del primo lotto funzionale (Infrav) Grottaminarda – Frigento – San Teodoro, alla individuazione di un 1° Stralcio della **sub – tratta San Teodoro (Villamaina) – Frigento (da progr. 7+125 a progr. 11+937)** ed all'avvio, con la consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, delle relative attività.

La tratta, come indicato nella **Scheda n° 1**, ha una lunghezza complessiva pari a circa 5 km.

Prevede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro - Villamaina e lo svincolo di Frigento. Inoltre è prevista la rifunionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.428.

Le opere d'arte maggior previste sono costituite da n° 4 viadotti, per uno sviluppo di circa ml. 881 e n° 6 gallerie artificiali, per uno sviluppo di circa ml. 657.

Sono inoltre previste opere minori varie (sottopassi, tombini, opere di sostegno e di rinaturalizzazione, ecc.).

La tratta consente un agevole collegamento tra i centri di Villamaina e Frigento, alternativo agli attuali collegamenti stradali costituiti dalla S.S.303 e S.S.428.

Inoltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.S.428.

Il quadro di spesa del lotto funzionale è il seguente:

Importo netto lavori	€	56.850.862,91
Oneri speciali di sicurezza	€.	2.578.104,00
Oneri di concessione 6%	€.	3.411.051,77
Totale lavori	€.	62.840.018,68
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€.	2.108.098,00
Oneri per eliminazione interferenze	€.	350.646,00
Imprevisti	€.	2.290.325,32
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€.	2.274.035,00
Prezzo chiuso ex art.133 D.Lgs 163/2006	€.	136.877,00
Importo totale	€.	70.000.000,00

(*) Nella Delibera CIPE n. 27/2012, in quanto successiva alla Del CIPE n. 62/2011, la tratta viene indicata come "2° Stralcio".

5.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, si è dato corso:

- alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
- alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, ecc.);
- alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;
- ai movimenti di terra, diffusamente su tutto il lotto, ed alle bonifiche dei piani di posa.

Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si è dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco.

Nel mese di marzo 2015 si è poi dato inizio ad una seconda galleria artificiale (Galleria San Pancrazio), e, nei mesi successivi, ad ulteriori n° 2 gallerie artificiali (Galleria San Marco e Galleria Casino Covone). Al 02/02/2016, con le autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefite, si è dato inizio anche ai lavori di realizzazione delle ultime 2 gallerie artificiali. Alla fine del mese di Marzo 2016 si è dato inizio anche alla realizzazione del primo Viadotto (Mefite) e, successivamente anche del secondo Viadotto (S. Pancrazio) e del terzo (S. Martino). Nel mese di Marzo del 2017 si è ottenuta l'autorizzazione sismica anche del 4° ed ultimo Viadotto presente nel lotto in questione, il "Rampone", attualmente in corso di esecuzione.

Alla data del 30 settembre 2018 tutte le Gallerie Artificiali sono ultimate, mentre le opere relative ai Viadotti sono in avanzata fase di realizzazione; sono altresì in corso opere minori, quali le trincee drenanti e i rilevati; le restanti opere sono in iter, c/o i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica.

Alla data del 30 settembre 2018, sono stati redatti:

- n° 8 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi diritto) per un importo progressivo di circa euro 1.240.000,00;
- n° 24 stati di avanzamento per lavori a tutto il 30.06.2018, per un importo di circa euro 42.500.000,00.

Alla data del 30 settembre 2018 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura essenzialmente tecnica stanno determinando ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi. In particolare è stata predisposta bozza di transazione nel luglio 2017 e sottoposta al parere dell'ADS di Napoli in corso di acquisizione.

E' stato emesso decreto di proroga al 28 dicembre 2019 della dichiarazione di pubblica utilità.

In data 17.12.12 il MIT ha versato sulla c.s. intestata al Commissario l'anticipazione di € 15.000.000,00, in data 25.7.16 un acconto di € 9.548.000,00 e in data 5.7.2017 un ulteriore acconto di € 20.000.000,00.

Ulteriore acconto (4° acconto) per € 22 milioni è stato richiesto in data 9.4.18, a fronte del quale sono stati assegnati in data 17.05.2018 € 20.531.858,00. Il restante importo di euro 1.468.142,00 è in corso di reinscrizione di somme perenti da parte del MIT.

6. Lavori del 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 47/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 145/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 12/2015, che ha disposto l'impegno di **euro 60 milioni** per l'anno 2015, si è definito il 2° Stralcio (1° Costruttivo) e si sono avviate, con la consegna dei lavori del 16 novembre 2015, le relative attività propedeutiche.

Lo stralcio costruttivo, ricompreso all'interno della Scheda n° 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km.

Prevede, in quanto individuata come lotto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcune opere d'arte maggiori o parti di esse, che nel dettaglio sono:

- Galleria Naturale S. Filippo e relativo Cunicolo di Servizio;
- Viadotto San Silvestro;
- Viadotto Schivito Macchie;
- Galleria Artificiale Macchie;
- Galleria Artificiale Pratola;
- Galleria Artificiale SS 90.

Il quadro di spesa del lotto costruttivo in esame, approvato con decreto commissariale n° 1419 del 14 settembre 2015, è il seguente:

Importo netto lavori	€	48.117.134,17
Oneri speciali di sicurezza	€	3.004.148,76
Oneri di concessione 6%	€	2.887.028,05
Totale lavori	€	54.008.310,98
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€	1.805.086,36
Oneri per eliminazione interferenze	€	317.054,00
Imprevisti	€	1.829.863,30
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€	1.924.685,37
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006	€	115.000,00

Importo totale € 60.000.000,00

6.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna per l'avvio delle attività espropriative del 17 settembre 2015, si è dato corso alle attività tese alla acquisizione dei suoli, espletando tutte le procedure previste ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/01 mediante la pubblicazione sia su quotidiani che all'Albo Pretorio dei comuni interessati; sono state, inoltre, espletate e concluse le attività previste dall'art. 17 del D.P.R. 327/01 mediante notifica ai singoli soggetti interessati con raccomandata A/R e pubblicazione all'Albo Pretorio dei comuni interessati per i soggetti sconosciuti o non reperibili.

Con l'emissione del decreto commissariale n° 1494 del 13 gennaio 2016 l'Autorità espropriante ha emesso il Decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio.

Si è dato corso quindi:

- alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
- alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli aventi diritto, ecc.);
- alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;
- all'accantieramento.

Alla data del 30 settembre 2018 sono in fase di completamento, in territorio di Grottaminarda, le gallerie artificiali "Macchie" e "Pratola", ivi compreso, per quest'ultima, il tratto sottostante la strada provinciale n° 36; è in corso di esecuzione, sempre in territorio di Grottaminarda, il viadotto "Schivito Macchie"; sono state completate la paratie di pali agli imbocchi Sud (Lato Frigento) e Nord (Lato Gesualdo) della galleria naturale "San Filippo" per consentire lo scavo di ingresso all'opera da realizzare in sotterraneo e le operazioni di scavo tra le paratie per arrivare a quota galleria; si è dato corso allo scavo della galleria naturale lato Nord (lato Grottaminarda), eseguito per circa 30 metri; sono attualmente in corso ulteriori verifiche di carattere geologico – tecnico sulla natura dei terreni attraversati; è in corso di esecuzione il viadotto "San Silvestro" in territorio del Comune di Gesualdo.

Alla data del 30 settembre 2018 sono stati redatti:

- n° 5 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2018 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi diritto) per un importo progressivo di circa euro 635.000,00;
- n° 10 stati di avanzamento per lavori a tutto il 30 giugno 2018, per un importo di circa euro 22.400.000,00.

Alla data del 30 settembre 2018 l'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 90 unità, mentre a regime è previsto un impiego su detto 1° Lotto – 2° Stralcio di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura tecnica determinano ritardi nell'esecuzione dei lavori. A questi potrebbero aggiungersene altri derivanti da una situazione di amministrazione straordinaria del Socio Consorzio Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi ed in particolare è anche in fase di acquisizione parere dell'ADS di Napoli, di cui si è già detto, su schema di atto transattivo.

In data 16 novembre 2016 la Regione Campania ha versato un acconto sulla contabilità speciale commissariale 3250 per euro 6.000.000,00, e in data 20 dicembre 2017 un ulteriore acconto di euro 11.337.080,00.

In data 01/08/2018, la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta l'ulteriore acconto di € 12.662.920,00.

7. Lavori del 1° Lotto 3° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la rimodulazione dei flussi finanziari di cui alla Delibera CIPE n° 62/2011, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17 milioni circa già previsti per l'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00, comprensivi dei 60 mln già contrattualizzati.

E' stato quindi definito un progetto stralcio denominato 1° lotto 3° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n° 2, dell'importo di euro 94.220.990,00.

E' stato inoltre definito, per i rimanenti euro 7.125.000,00 disponibili, l'ulteriore stralcio di cui al successivo paragrafo, denominato 2° lotto 1° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n° 4, che consente di dare avvio anche al tratto di competenza del Consorzio INFRASUD, ma rispetto al quale la Regione Campania, nel mese di luglio 2018, ha fornito indicazione di attingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell'1 dicembre 2016 (e non più da quelli della Delibera CIPE 62/2011).

Il progetto del 1° Lotto 3° Stralcio è stato approvato con decreto commissariale n° 1619 del 7 febbraio 2017 ed oggetto di contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFR.AV.) in data 27 luglio 2017; in data 28 febbraio 2018 è stato emesso il decreto di occupazione di urgenza; nei mesi di aprile e maggio 2018 si è dato corso alle immissioni in possesso sulle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Alla data del 30 settembre 2018 tutte le aree sono state acquisite e si è dato avvio alle lavorazioni di bonifica dagli ordigni residuati bellici.

Nel frattempo, già a partire dal mese di febbraio 2018 è stato dato corso ad alcune lavorazioni immediatamente eseguibili (scavo della galleria artificiale "Macchie", le cui strutture erano state realizzate nell'ambito del 2° Stralcio).

Sempre alla data del 30 settembre 2018 sono stati redatti n° 3 SAL per lavori a tutto il 30 giugno 2018, per l'importo di euro 700.000,00 mila circa.

Il 1° Lotto 3° Stralcio prevede in sintesi:

- la realizzazione di ulteriori 700 metri circa della Galleria Naturale S. Filippo;
- il completamento di tutte le lavorazioni previste tra la progr. 14 + 115 (Sbocco galleria San Filippo) e la progr. 19 + 980 (Svincolo di Grottaminarda), a completamento delle opere e lavorazioni previste con il 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo.

Questo tratto, che rende completa ed usufruibile l'arteria tra gli svincoli di Gesualdo e Grottaminarda, prevede la realizzazione delle seguenti principali opere d'arte:

- Viadotto Pescariello;
- Viadotto Caputo Celesa;
- Viadotto Penta;
- Galleria Artificiale Gesualdo;
- Galleria Artificiale Valli;
- Galleria Artificiale Sant'Andrea;
- Galleria Artificiale Pioppi.

Il quadro di spesa del 1° Lotto 3° Stralcio, approvato con decreto commissariale n° 1619 del 7 febbraio 2017, è il seguente:

Importo netto lavori	€	75.997.515,06
Oneri speciali di sicurezza	€.	3.075.667,63
Oneri di concessione 6%	€.	4.559.850,90
Totale lavori	€.	83.633.033,59
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€.	3.916.892,37
Oneri per eliminazione interferenze	€.	634.700,00
Imprevisti	€.	2.846.463,44

Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€.	3.039.900,60
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006	€.	150.000,00
Importo totale	€.	94.220.990,00

In data 04/07/2018, con D.G.R. n° 47, la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta l'anticipazione di euro 9.422.099,00 giusta DD 145/2015.

8. Lavori del 2° Lotto 1° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

Il 2° Lotto 1° Stralcio è stato definito, come detto nel precedente paragrafo, nell'ambito delle somme della Del. CIPE 62/2011 messe a disposizione dalla regione Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016, e consente di dare avvio anche al 2° Lotto di competenza del Consorzio INFRASUD.

Il relativo progetto è stato approvato con decreto commissariale n° 1685 del 25 luglio 2017 ed è stato oggetto di contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFRASUD) in data 27 luglio 2017.

Alla data del 30 settembre 2018 è stato emesso il decreto di occupazione di urgenza e si è proceduto alla acquisizione dei suoli; sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Regione Campania nel mese di luglio 2018 di attingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell'1 dicembre 2016 (e non più da quelli della Delibera CIPE 62/2011), il prosieguo delle attività e dei lavori resta vincolato alla messa a disposizione dei fondi da parte della Regione stessa.

Il 2° Lotto 1° Stralcio è individuato nella tratta compresa tra le progr. 0 + 450 e 0 + 664, e prevede in sintesi:

- la realizzazione delle rampe dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi da e per Lioni, con innesto sulla SP 78, denominate "A", "B" e "C";
- la realizzazione dell'asse stradale da progr. 0 + 450,00 a progr. 0 + 664,00;
- la realizzazione della Spalla "A" del viadotto d'asse denominato "Fredane 1";
- la realizzazione delle trincee drenanti, opere di sistemazione idraulica, opere a verde e finiture in corrispondenza delle rampe "A", "B" e "C" dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi;
- la realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio delle Rampe "A", "B" e "C" dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi.

Il quadro di spesa del 2° Lotto 1° Stralcio, approvato con decreto commissariale n° 1685 del 25 luglio 2017, è il seguente:

Importo netto lavori	€	5.558.890,04
Oneri speciali di sicurezza	€.	333.460,29
Oneri di concessione 6%	€.	333.533,40
Totale lavori	€.	6.225.883,73
Somme a disposizione dell'amministrazione:		
Espropriazioni	€.	342.619,05
Oneri per eliminazione interferenze	€.	240.500,00
imprevisti	€.	171.641,62
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.)	€.	222.355,60
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006	€.	12.000,00
Importo totale	€.	7.215.000,00

E' tuttora in corso, da parte della Regione Campania, il versamento al Commissario ad Acta dell'anticipazione di euro 721.500,00.

9. Attivazione importo residuo Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011

Con la messa a disposizione da parte della Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016, dell'importo di euro 161.435.990,00 (con i quali sono stati definiti il 1° Lotto 2° Stralcio, il 1° Lotto 3° Stralcio ed il 2° Lotto 1° Stralcio), **residua** dalla Delibera CIPE 62/2011 l'importo di **euro 58.564.010,00**.

La medesima Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 ha previsto la messa a disposizione di tale importo nelle annualità 2019 – 2020.

Sulla scorta delle indicazioni della Regione Campania del luglio 2018 più volte richiamate, con questo importo:

- sarà completato tutto il 1° Lotto (fabbisogno euro 55.723.203,32);
- il rimanente importo di euro 2.840.806,68, unitamente all'importo di euro 7.215.000,00 di cui al paragrafo precedente ed all'importo di euro 5.000.000,00 di cui alle due Delibere regionali del 2007 e 2009, per complessivi euro 15.055.806,68, sarà impiegato sul 2° Lotto.

Anche per il completamento del 1° Lotto (individuato come 1° Lotto 4° Stralcio) viene allegata una scheda di sintesi (**Scheda n° 3**)

10. Ulteriori stanziamenti CIPE

La messa a disposizione dell'ulteriore stanziamento di **euro 65.000.000,00** previsto nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n° 54 dell'1 dicembre 2016, in G.U. n° 88 del 14 aprile 2017, renderà possibile, secondo le indicazioni della Regione Campania del luglio 2018, la realizzazione della tratta di competenza del Consorzio INFRASUD dal km. 0+450 al km 3+052 circa (2° Lotto 1° Stralcio e 2° Stralcio), come da scheda di sintesi allegata (**Scheda n° 4**).

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20 febbraio 2018 ha preso atto dello stanziamento disposto ed ha attivato le procedure per rendere i fondi disponibili.

Il Commissario ha sottoscritto Convezione a tre (Regione / Commissario / MIT) in data 20.3.2018 con prot. 30539 che regola i rispettivi impegni.

11. Stanziamenti da reperire per il completamento dell'opera

Come già riportato nei precedenti paragrafi, per il completamento dell'opera residuano da stanziare **€ 70 milioni**, tutti a carico del MIT in base all'accordo Stato – Regione dell' 1 agosto 2008, con i quali sarà possibile completare il tratto **da progressiva 3 + 052 a progr. 6 + 500** per l'importo di **euro 85 milioni** circa (2° lotto 3° Stralcio) e, quindi, l'intera SSV Lioni - Grottaminarda.

Anche per il completamento di questo 2° Lotto 3° Stralcio viene allegata una scheda di sintesi (**Scheda n° 5**).

12. Composizione societaria dei Consorzi concessionari

La realizzazione dell'infrastruttura è affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed attuale composizione societaria:

- il tratto da **progr. 0 + 00 (inizio lotto) a progr. 6 + 500** al **Consorzio INFRA.SUD**, composto dalle seguenti Società:
 - CONIC 2 S.r.l.
 - S.A.F. 2 S.r.l.

- il tratto da **progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto)** al **Consorzio INFR.AV.**, composto dalle seguenti Società:
 - Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A.S. (attualmente in regime di Amministrazione Straordinaria)
 - ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.
 - Marino Costruzioni S.r.l.
 - S.A.F. 3 S.r.l.

STRADA A S.V. LIONI - GROTTAMINARDA per il collegamento dell'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'Autostrada A16 NA - BA (Svincolo di Grottamarda)

Il 1° stralcio funzionale del 1° lotto di lunghezza complessiva 4,8km, prevede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro (Vilamaina) e lo svincolo di Frigento. Inoltre è prevista la rifunzionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.248.

Le opere d'arte maggiori presenti lungo tale tratto sono:

VIADOTTI	L _{tot} [m]
Viadotto San Pancrazio	66
Viadotto San Martino	320
Viadotto Mefite	99
Viadotto Rampone (fino a pila 6)	198


Le opere d'arte minori presenti lungo tale tratto sono:

SOTTOVIA	Prog. [km]	Dimensioni [m]
Sottovia	10+500,000	7,5x8
Sottovia	10+618,000	9,5x7,0

GALLERIE ARTIFICIALI	L _{tot} [m]
Galleria San Pancrazio	194
Galleria Casino Covone	127
Galleria Vallicocco	95
Galleria Mefite 1	46
Galleria Mefite 2	11,6
Galleria San Marco	183

TOMBINI SCATOLARI	Prog. [km]	Dimensioni [m]
Tombino scatolare	9+104,957	2x2

Tale stralcio consente un agevole collegamento tra i centri di Vilamaina e Frigento, alternativo gli attuali collegamenti stradali costituiti dalla S.S.303 e S.S.428. Inoltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.S.428. La realizzazione del lotto funzionale San Teodoro-Viadotto Rampone, insieme agli altri due lotti funzionali Viadotto Rampone-Grottamarda e Sant'Angelo-S.P.217, completa l'asse stradale per circa due terzi del suo sviluppo, rendendo praticamente completo il collegamento Lioni-Grottamarda e quindi raggiungendo sostanzialmente l'obiettivo finale del collegamento dell'itinerario tra le autostrade A3 (Contursi) e A16 (Grottamarda).

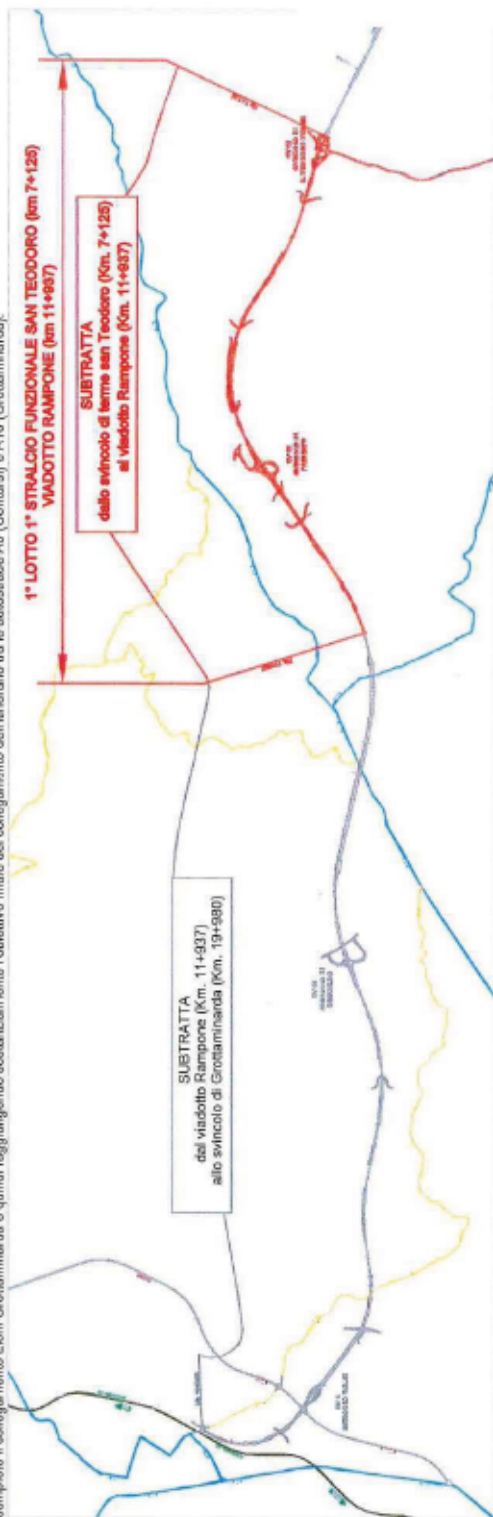

L'importo complessivo dei lavori del lotto è pari a 70 milioni di Euro, articolato come segue:

LAVORI IN CONCESSIONE	da km 7+125 a km 11+937
Importo netto lavori	€ 56.850.863
Oneri Speciali di sicurezza	€ 2.578.104
Oneri di concessione (6,00%)	€ 3.411.052
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Espropriazioni	€ 2.108.098
Oneri per eliminazione interferenze	€ 350.646
Imprevisti	€ 2.290.325
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	€ 2.274.035
Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006	€ 136.877
IMPORTO COMPLESSIVO DELLO STRALCIO	€ 70.000.000
FONDI FINANZIAMENTO	Delibera CIPE n° 27 del 23.03.2012
	€ 70.000.000

SCHEDA N. 1

1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE

1° STRALCIO FUNZIONALE DALLO SVINCOLO SAN TEODORO (KM 7+125) AL VIADOTTO RAMPONE (KM 11+937)

STRADA A.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA per il collegamento dell'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'Autostrada A16 NA - BA (Svincolo di Grottaminnarda)

Il 2° e 3° stralcio del 1° lotto di lunghezza complessiva 7,5 km circa, prevedono la realizzazione dello svincolo di Gesualdo, lo svincolo per la variante alla S.S.90 e lo svincolo di Grottaminnarda.

Le opere d'arte maggiori presenti lungo tale tratto sono:

VIADOTTI	L _{tot} [m]
Viadotto Rampone	198
Viadotto S.Silvestro (svincolo Gesualdo)	297
Viadotto Pescaricello	231
Viadotto Caputo Celesia	165
Viadotto Penta	198
Viadotto Schivato Macchie	383


GALLERIE ARTIFICIALI	L _{tot} [m]
Galleria Gesualdo	175
Galleria Valli	40
Galleria Sant'Andrea	135
Galleria Macchie	110
Galleria Pratoia	80
Galleria S.S.90	116
Galleria Pioppi	87

SOTTOVIA	
Prog. [km]	Dimensioni [m]
Sottovia 18+069,750	9,5x5,8
Sottovia 19+223,150	9,5x5,5

TOMBINI SCATOLARI	
Prog. [km]	Dimensioni [m]
Tombino scatolare 18+842,565	3x3
Tombino scatolare 18+149,943	3x3
Tombino scatolare 19+209,562	3x3
Tombino scatolare 19+322,787	3x3

GALLERIE NATURALI	L _{tot} [m]
Galleria San Filippo (parte) per ml. 1210	1750

Tali stralci, insieme al lotto Terme San Teodoro-Viadotto Rampone ed ai completamenti di cui alla Scheda n° 3, consentono un agevole collegamento, alternativo alla S.S.303, in tutto il tratto che parte dallo svincolo di Terme San Teodoro ed attraversa i comuni di Figligio e Gesualdo fino ad arrivare a Grottaminnarda. Inoltre consente, attraverso la strada comunale napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio della nuova arteria con la S.S.428.

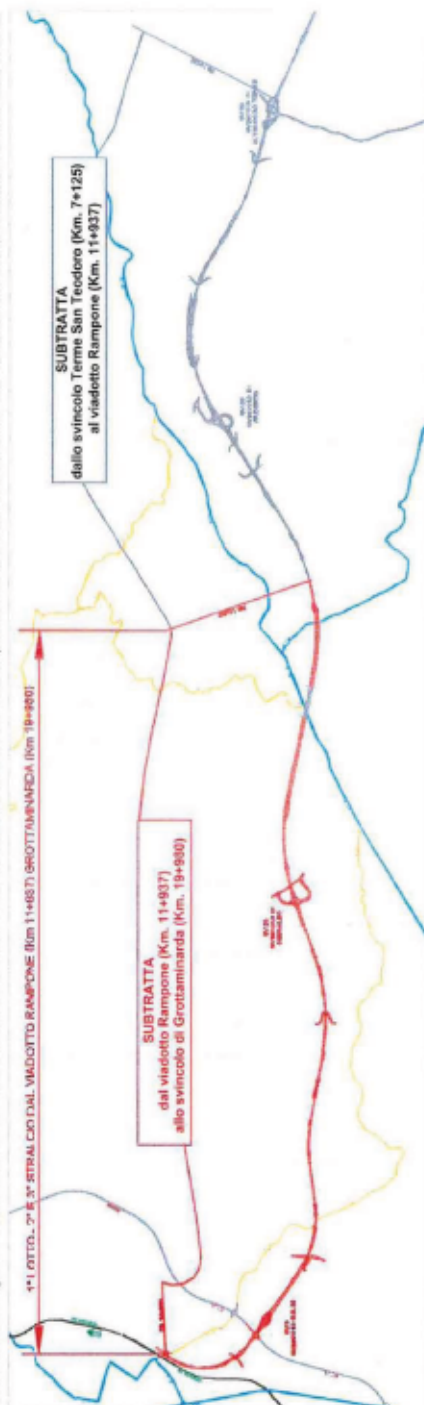

L'importo complessivo del 1° Lotto 2° e 3° stralcio è pari a 154 milioni di Euro circa, articolato come segue:

LAVORI IN CONCESSIONE			
	2° STRALCIO	3° STRALCIO	Sommario 2° e 3° STRALCIO
Imposto netto lavori	€ 48.117.134,17	€ 75.997.515,06	€ 124.114.649,06
Oneri Specifici di sicurezza	€ 3.004.148,76	€ 3.075.667,63	€ 6.079.816,63
Oneri di concessione (6,00%)	€ 2.887.028,05	€ 4.559.850,90	€ 7.446.878,90
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Espropriazioni	€ 1.805.086,36	€ 3.916.892,37	€ 5.721.978,73
Oneri per eliminazione interferenze	€ 317.054,00	€ 634.700,00	€ 951.754
Ingegnieri	€ 1.829.863,30	€ 2.846.463,44	€ 4.676.326,44
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	€ 1.824.885,37	€ 3.039.900,60	€ 4.864.786,00
Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006	€ 115.000,00	€ 150.000,00	€ 265.000,00
	€ 80.000.000,00	€ 94.220.990,00	€ 154.220.990,00
FONDI FINANZIAMENTO			
Delibera CIPE n° 62 del 03.08.2011 (Stanziamento euro 220 milioni)			€ 154.220.990,00

SCHEDA N. 2
1° LOTTO - 2° e 3° STRALCIO

TRATTA DAL VIADOTTO RAMPONE (KM 11+937) ALLO SVINCOLO DI GROTTAMINARDA (KM 19+980)

STRADA A S.V. LIONI - GROTAMINARDA per il collegamento dell'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'Autostrada A16 NA - BA (Svincolo di Grotaminarda)


Il completamento del 1° lotto (in concessione al consorzio INFR.LAV) e denominato 1° Lotto 4° Stralcio prevede la realizzazione di un tratto stradale di circa 1,15 km, a partire dalla fine del lotto INFR.A.SUD fino ad arrivare alla Prog. 7+125 (inizio del 1° Lotto 1° Stralcio) ed il completamento (circa mt 540) della galleria naturale "San Filippo".

Le opere d'arte maggiori presenti lungo tale tratto sono:

Viadotto dei Bagni	L _{tot} [m]
Completamento galleria "San Filippo"	425 540

Le opere d'arte minori presenti lungo tale tratto sono:

Tombini scatolari	Prog. [km]	Dimensioni [m]
	6+589,610	3x3

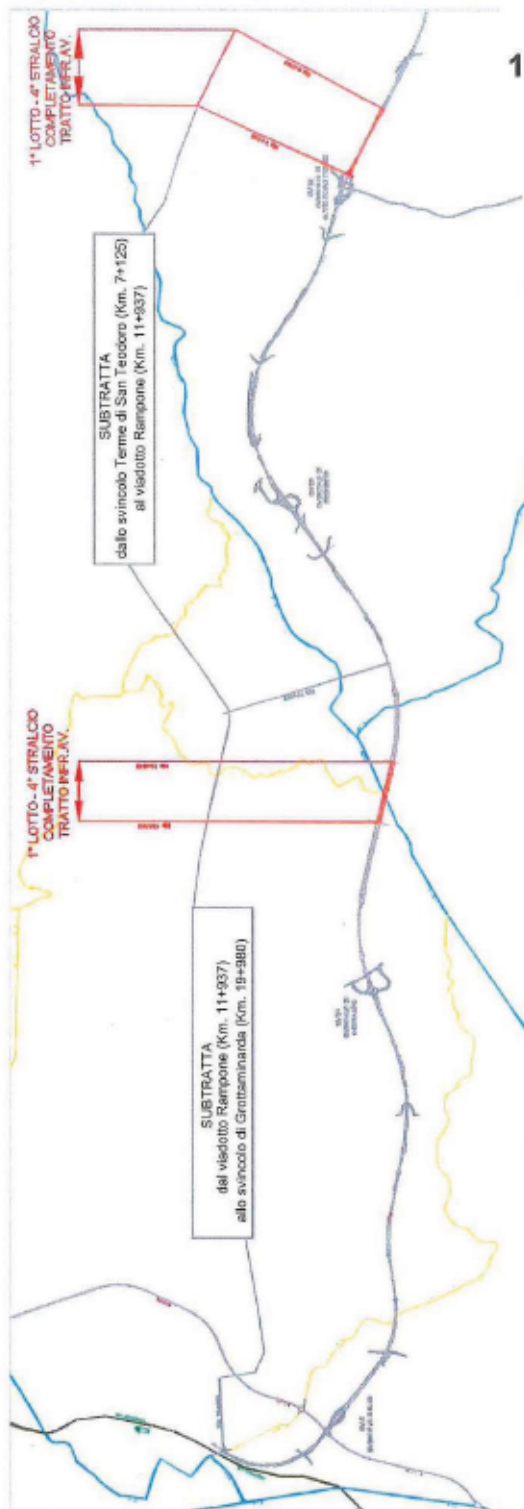

SCHEDA N. 3
1° LOTTO - 4° STRALCIO

L'importo complessivo dei lavori di completamento del lotto INFR.LAV (1° Lotto 4° Stralcio) è pari a circa 55,7 milioni di euro, articolato come segue:

LAVORI IN CONCESSIONE		Sommario tratto progr. 6-500 - 7+125 e completam. galleria	
Importo netto lavori	COMPLETAMENTO GALLERIA "SAN FILIPPO"	TRATTO PROG. 6-500 - 7+125	
Oneri Speciali di sicurezza	€ 30.519.844,10	€ 15.732.134,46	€ 46.251.976,56
Oneri di concessione (6,00%)	€ 917.896,12	€ 516.754,38	€ 1.434.650,50
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.831.190,65	€ 943.928,07	€ 2.775.118,72
Espropriezioni	€ 0	€ 604.056,55	€ 604.056,55
Oneri per eliminazione interferenze	€ 0	€ 0	€ 0
Inprevisibili	€ 1.182.762,95	€ 1.488.324,06	€ 2.671.087,01
Spese generali (D.L. R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)	€ 1.220.783,28	€ 629.286,38	€ 1.850.079,66
Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006	€ 106.522,89	€ 29.710,41	€ 136.233,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELLO STRALCIO	€ 35.779.010,00	19.944.193,32	€ 55.723.203,32
FONDI FINANZIAMENTO			€ 55.723.203,32
	Delibera CIPE n° 62 del 03.08.2011 (Stanziamiento euro 220 mln)		

STRADA A S.V. LIONI - GROTAMINARDA per il collegamento dell'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'Autostrada A16 NA - BA (Svincolo di Grottaminda)

Il 1° e 2° Stralzo del 2° Lotto (Consorzio INFRASUD), della lunghezza complessiva di 2,6 km circa, prevedono la realizzazione dello svincolo per Sant'Angelo dei Lombardi (1° Stralzo da inizio 2° lotto e fino alla progr. km. 0 + 664 circa), e l'esecuzione del tratto stradale fino al km 3 + 052 circa (2° Stralzo da progr. 0+664 a progr. 3+052).

- Le opere d'arte maggiori, presenti lungo tale tratto sono:
- Viadotto Reno B Svincolo Sant'Angelo di lunghezza 100 m
 - Viadotto Fredane 1 di lunghezza 390 m
 - Viadotto Erbaia di lunghezza 198 m
 - Galleria artificiale Erbaia 1 di lunghezza 71 m
 - Galleria artificiale Erbaia 2 di lunghezza 36 m
 - Viadotto Fredane 2 di lunghezza 353 m
 - Galleria artificiale Costa Rubito di lunghezza 176 m
 - Viadotto Fredane 3 di lunghezza 300 m

- Le opere d'arte minori, presenti lungo tale tratto sono:
- Viadotto Reno A Svincolo Sant'Angelo, scollatore in c.a. 11x7,25 m
 - Sottovia scollatore in c.a. 9,50x6 m 0+517
 - Tombino scollatore in c.a. 2x2 m al km 0+945
 - Tombino scollatore in c.a. 3x2 m al km 1+366
 - Tombino scollatore in c.a. 4x3 m al km 1+916



L'importo complessivo dei lavori è pari a 65 milioni di Euro articolato come segue:

LAVORI IN CONCESSIONE		2° LOTTO 1° STRALZO	2° LOTTO 2° STRALZO	Sommario 1° LOTTO 1° e 2° STRALZO
Importo netto lavori		€ 5.558.890,04	€ 48.129.466,30	€ 53.688.356,34
Oneri Speciali di sicurezza		€ 333.460,29	€ 2.136.204,10	€ 2.469.664,39
Oneri di concessione (6,00%)		€ 333.533,40	€ 2.867.767,98	€ 3.221.301,38
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Espropriazioni		€ 342.619,05	€ 857.380,95	€ 1.200.000,00
Oneri per eliminazione interferenze		€ 240.500,00	€ 269.150,00	€ 509.650,00
Imprevisti		€ 171.641,62	€ 1.462.999,96	€ 1.634.641,58
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)		€ 222.355,60	€ 1.925.178,65	€ 2.147.534,25
Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006		€ 12.000,00	€ 116.852,06	€ 128.852,06
IMPORTO COMPLESSIVO DELLO STRALZO		€ 7.215.000,00	57.785.000,00	€ 55.723.203,32
FONDI FINANZIAMENTO	Delibera CIPE n° 54 del 01.12.2016			€ 65.000.000,00

SCHEDA N. 4
2° LOTTO - 1° E 2° STRALZO

STRADA A S.V. LIONI - GROTAMINARDA per il collegamento dell'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l'Autostrada A16 NA – BA (Svincolo di Grotaminarda)


Il completamento del 2° Lotto, in concessione al Consorzio INFRA.SUD e denominato 2° Lotto 3° Stralcio, prevede la realizzazione di un tratto stradale di circa 3,4 km dalla fine del 2° Stralcio a partire dalla progr. 3+052 fino ad arrivare alla Prog. 6+500. Le opere d'arte maggiori presenti lungo tale tratto sono:

VIADOTTI	L _{tot} [m]
Viadotto DEL PARCO	480
GALLERIE NATURALI	L _{tot} [m]
Galleria Perrella	775
Galleria Piano di Nola 1	740

GALLERIE ARTIFICIALI	L _{tot} [m]
Galleria Piano di Nola 2	136

TOMBINI SCATOLARI	Prog. [km]	Dimensioni [m]
Tombino scatolare	4+083,697	3x3


Le opere d'arte minori presenti lungo tale tratto sono:

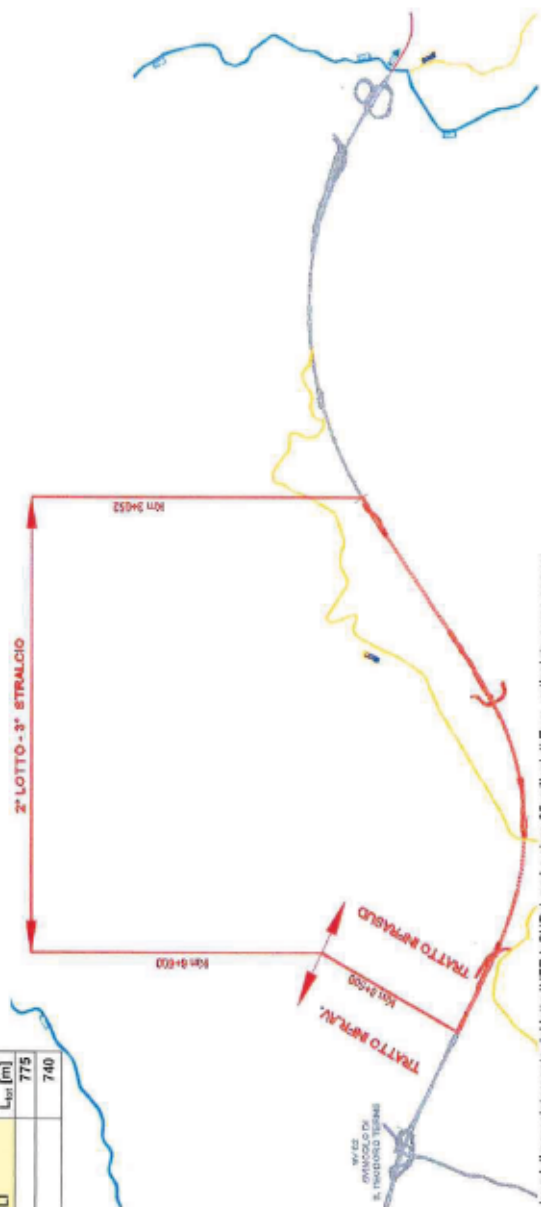


L'importo complessivo dei lavori di completamento del lotto INFRA.SUD è pari a circa 85 milioni di Euro, articolato come segue:

SCHEDA N. 5
2° LOTTO – 3° STRALCIO

LAVORI IN CONCESSIONE		2° LOTTO 3° STRALCIO (COMPLETAMENTO)
Importo netto lavori		€ 70.585.704,18
Oneri Speciali di sicurezza		€ 3.245.020,35
Oneri di concessione (5,00%)		€ 4.235.382,49
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Espropriazioni		€ 706.042,08
Oneri per eliminazione interferenze		€ 186.500,00
Imprevisti		€ 3.124.544,46
Spese generali (D.L. n. 30/2001, R.S.E., Collaudatori, Spese varie Amministrazione)		€ 2.023.500,33
Prezzo chiuso ex art. 133 D.Lgs 163/2006		€ 185.020,82
		€ 85.055.806,69
		€ 10.055.806,69
FONDI FINANZIAMENTO		
	Delibera CIPE n° 62 del 03.08.2011 (Stanziamiento complessivo euro 220 mln - Residuo da 1° LOTTO)	€ 2.500.000,00
	Decreto dirigenziale della Regione Campania n°239 del 21.06.2007	€ 2.500.000,00
	Decreto dirigenziale Area Generale di coordinamento L.I. PP. Regione Campania n°148 del 24.07.2009	€ 2.500.000,00
	FONDI MIT ACCORDO STATO REGIONE 01.08.2008: ANCORA DA STANZIARE	€ 70.000.000,00

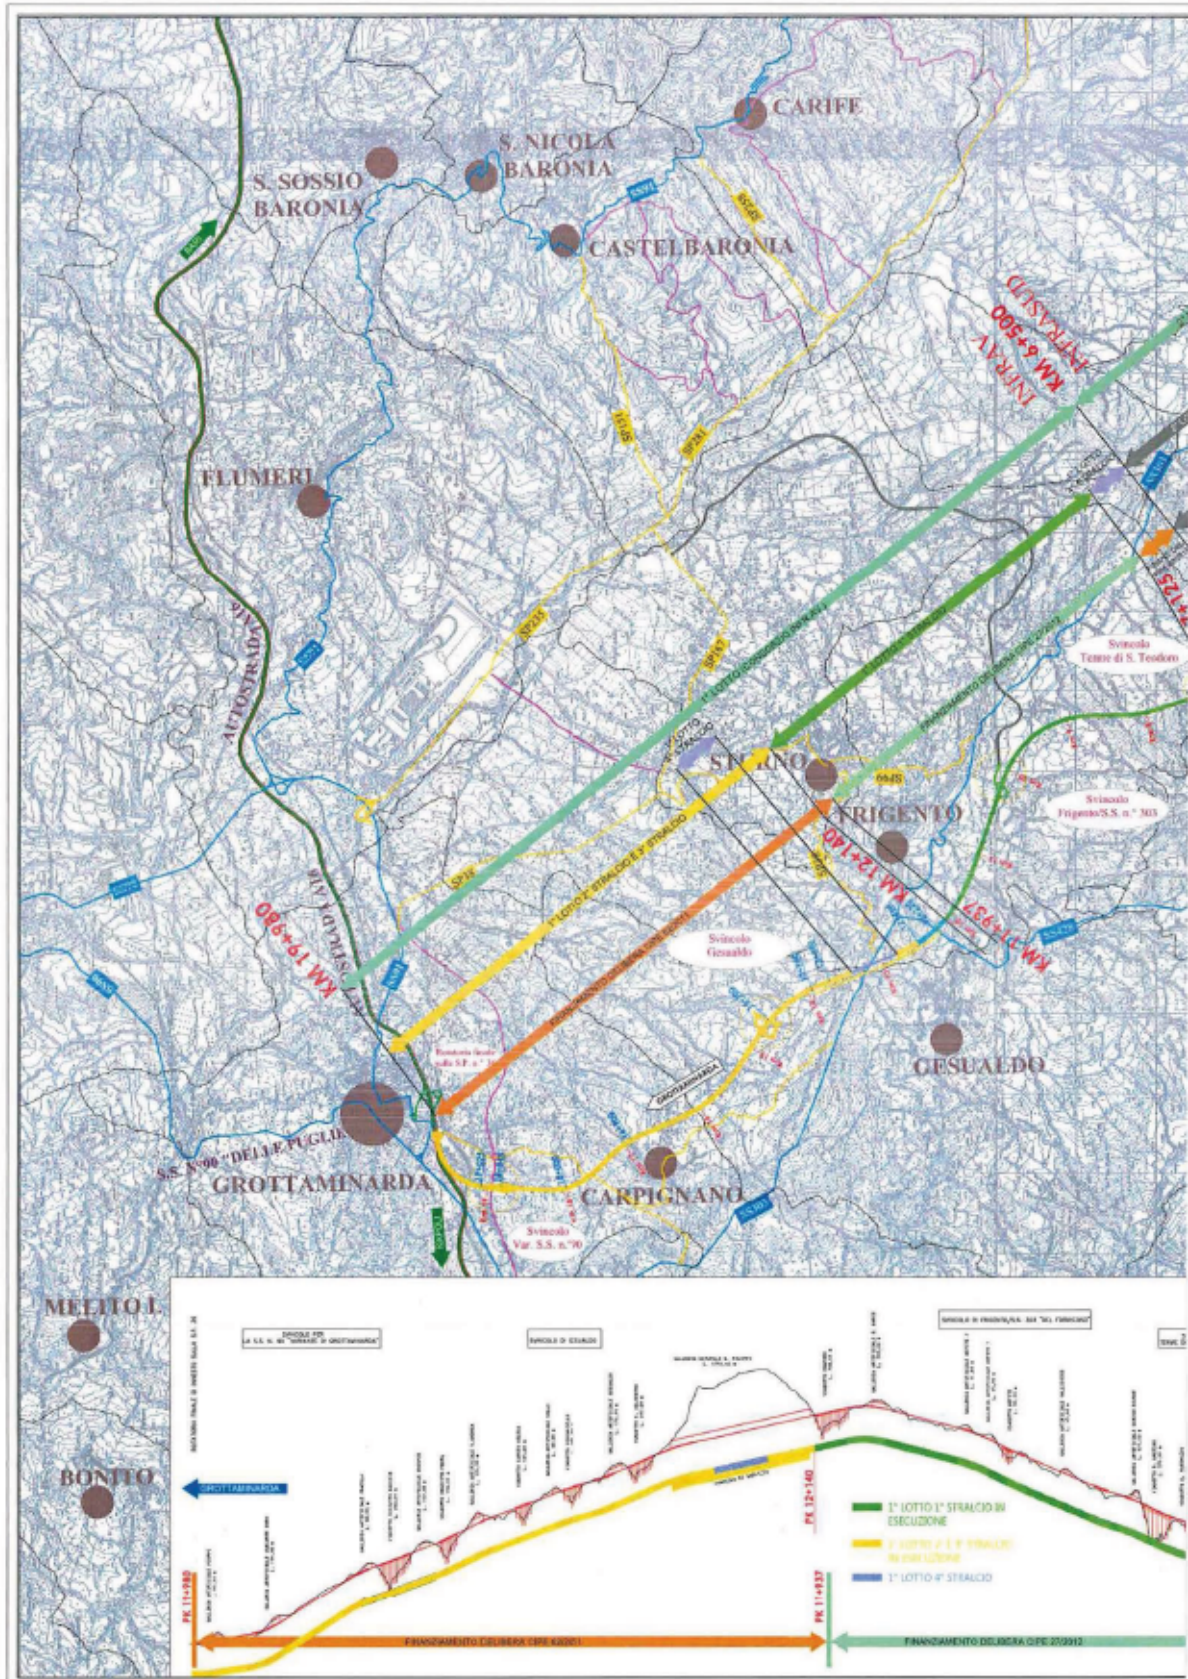

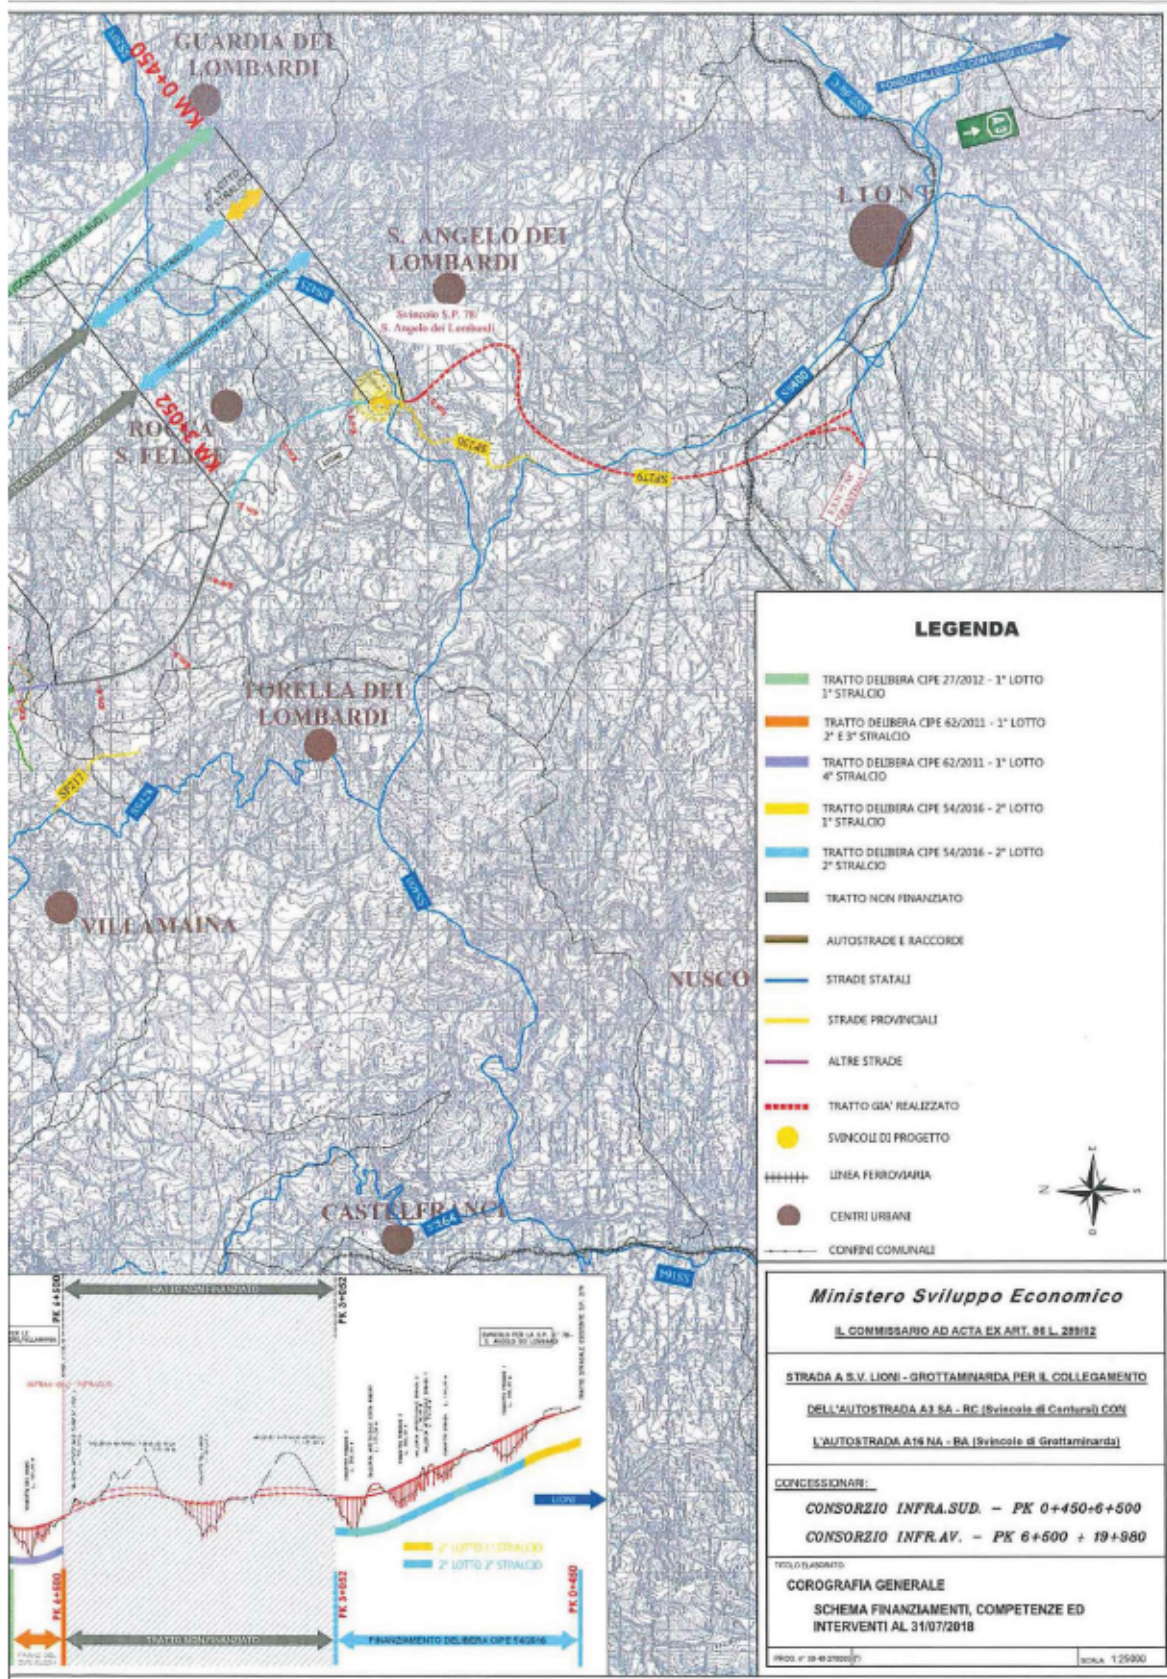

2a.1)

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 LEGGE 289/02	
Viabilità Lioni - Grottaminarda	
VERSAMENTI SULLA C.S. 3250 SUDDIVISI PER SOGGETTO FINANZIATORE, LOTTO E STRALCIO	

MIT	1° lotto 1° stralcio	1 ^a anticipazione	17/12/12	15.000.000,00
		2 ^a acconto	25/07/16	9.548.000,00
		3 ^a acconto	05/07/17	20.000.000,00
		4 ^a acconto	21/06/18	20.531.858,00
		TOTALE		

Regione Campania	1° lotto 2° stralcio	1 ^a anticipazione	16/11/16	6.000.000,00
		2 ^a acconto	20/12/17	11.337.080,00
		3 ^a acconto	14/08/18	12.662.920,00
		Totale		

Regione Campania	1° lotto 3° stralcio	1 ^a anticipazione	11/07/18	9.422.099,00
		Totale		

TOTALE GENERALE	104.501.957,00
------------------------	-----------------------

VERSAMENTI PER PROGETTAZIONE

Regione Campania	27/07/07	250.000,00	1)
	20/10/08	1.000.000,00	1)
	15/12/09	2.500.000,00	
	17/12/09	530.000,00	1)
	01/12/11	620.000,00	1)

1) Per totali M€ 2,400 su 2.500 assegnati. Residuano pertanto € 100.000,00 da accreditare.

2a.2)

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 L. 289/02 - CONVENZIONI E CONTRATTI CON CONSORZI CONCESSIONARI DEI LAVORI

SSV. LIONI - GROTAMINARDA

N.° Ord.	TIPO ATTO	DATA STIPULA	Concessionario	DESCRIZIONE	PARTE D'OPERA
1	Convenzione Base	14/09/1982	INFR.AV.		
2	Convenzione Base	14/09/1982	INFRASUD		
3	Atto Aggiuntivo Quadro	28/07/10	INFR.AV.	Individuazione ed esecuzione dei lavori	1° lotto dalla progr. 6+500 alla progr. 19+980
4	Atto Aggiuntivo Quadro	28/07/10	INFRASUD	Individuazione ed esecuzione dei lavori	2° lotto dalla progr. 0+450 alla progr. 6+500
5	Contratto	23/01/13	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 1° stralcio funzionale dalla progr. 7+125 alla progr. 11+937
6	Atto integrativo	14/02/2013	INFR.AV.	tracciabilità dei flussi finanziari	1° lotto 1° stralcio funzionale
7	Atto integrativo	16/07/2015	INFR.AV.	Obblighi disciplina Protocollo Legalità	1° lotto 1° stralcio funzionale
8	Contratto	16/09/2015	INFR.AV.	Affidamento lavori	1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo dalla progr. 12+140 alla progr. 19+980
9	Contratto	27/07/2017	INFR.AV.	Affidamento lavori	"
10	Contratto	27/07/2017	INFRASUD	Affidamento lavori	2° lotto 1° stralcio dalla progr. 0+450 alla progr. 6+500

CONSORZIO INFR.AV.[CONCESSIONE del 14/09/1982](#)[ACCORDO QUADRO del 28/07/2010](#)**CONTRATTI STRALCIO**[CONTRATTO 1° STRALCIO - 1° Lotto FUNZIONALE del 23/01/2013](#)[CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 1](#)[CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 2](#)

Consegna lavori	del	31/01/2013	
Tempo contrattuale	gg	1460	
Data Ultimazione		30/01/2017	
Nuova data ultimazione (Decreto Com.le N° 1618)		11/08/2017	
Nuova data ultimazione (Atto Transazione)		31/12/2018	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	68%	SAL n° 24 al 30/06/18

[CONTRATTO 2° STRALCIO - 1° Lotto COSTRUTTIVO del 16/09/2015](#)

Consegna lavori espropri	del	17/09/2015	
Consegna lavori	del	16/11/2015	
Tempo contrattuale	gg	1096	
Data Ultimazione		16/11/2018	
Nuova data ultimazione (Atto Transazione)		30/06/2019	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	41%	SAL n° 10 al 30/06/18

[CONTRATTO 3° STRALCIO -](#)

Consegna lavori	del	25/09/2017	
Tempo contrattuale	gg	1215	
Data Ultimazione		23/01/2021	
STATO AVANZAMENTO LAVORI	in corso	0,84%	SAL n° 3 al 30/06/18

2a.3)

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 L. 289/02 - CONVENZIONI E CONCESSIONI IN CORSO

SSV. LIONI - GROTAMINARDA

N.° Ord.	TIPO ATTO	DATA STIPULA	ENTE	DESCRIZIONE	CONTRATTO	PARTE D'OPERA
1	Convenzione	17/09/2009	Provveditorato OO.PP. Napoli	Funzioni di Stazione Appaltante		1° e 2° lotto
2	Convenzione	24/03/2010	ing. Giancarlo d'Agostino	Direzione Lavori		1° e 2° lotto
3	Convenzione	10/09/14	Comune Villamaina	Viabilità interferita	1° Lotto funzionale	Strade Comunali
4	Convenzione	05/02/15	Comune Frigento	Viabilità interferita	"	Strade Comunali
5	Protocollo Legalità	05/03/2015	Prefettura Avellino	Prvenzione tentativi di infiltrazione criminalità organizzata		1° e 2° lotto
6	D.D.145 - Accordo Programma Quadro	21/05/2015	Regione Campania - D.G. Mobilità	Gestione M€ 220 (Del. CIPE 62/11)	1° lotto	
7	Convenzione		MIT - Regione Campania	Gestione M€ 65 Del. CIPE 54/16	2° lotto	
8	Convenzione	03/08/2018	Regione Campania	"	"	
9	Convenzione		MIT	Gestione M€ 70	1° lotto	
10	Convenzione		MIT			
11	Servitù	02/09/16	e-Distribuzione	Risoluzione interferenze	"	Viadotti Melfite - San Pancrazio - San Marco
12	Concessione					Torrente San Pancrazio
13	Concessione	15/02/2017	Genio Civile Avellino	Attraversamento aree demaniali	"	Vallone Carpiello
14	Concessione					Vallone San Martino
15	Servitù	26/07/18	e-Distribuzione	Risoluzione interferenze	1° Lotto funzionale 1° e 2° stralcio	Napoletana - Sv. Gesualdo - GA Valli - GA S. Andrea
16	Concessione	03/08/18	Genio Civile Ariano I.	Attraversamento aree demaniali	2° stralcio costruttivo	Vallone Penta
17	Convenzione	in corso	ANAS	Viabilità interferita	"	Galleria SS90
18	Servitù	"	SNAM	Risoluzione interferenze	"	Svincolo Gesualdo
19	Convenzione	"	ASPI	Viabilità interferita	3° stralcio	Rotatoria Km. 19+954
20	Convenzione	"	Comune Grottaminda	Viabilità interferita	2° e 3° stralcio	Strade Comunali
21	Convenzione	"	Comune Gesualdo	Viabilità interferita	"	Strade Comunali

2a.4)

CONSORZIO INFR.AV.

SSV. LIONI - GROTTAMINARDA - 1° Lotto FUNZIONALE -

DATI DI CONTRATTO

CONTRATTO DEL 23/01/2013	
Lavori	56.850.863,00
Oneri sicurezza	2.578.104,00
Oneri concessione	3.411.052,00
Totale	62.840.019,00
Somme a disposizione	
Espropriazioni	2.108.098,00
Interferenze	350.646,00
Altro	4.701.237,00
Totale	7.159.981,00
Totale Progetto	70.000.000,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E., RIMBORSO INTERFERENZE, COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE PER MISSIONI AL 10/9/2018

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n° 24	30/06/2018	42.476.382	42.041.075	40.372.539
SAE n° 8	31/03/2017	1.234.939	1.234.939	1.234.939
Interferenze	31/08/2017	127.783	127.783	127.783
Compet. Profess.	09/07/2018	308.242	308.242	308.242
Spese per Missioni	29/08/2018	84.331	84.331	84.331
Totale		44.231.677,74	43.796.370,60	42.127.834,43

CONSORZIO INFR.AV.**SSV.LIONI - GROTAMINARDA - 1° Lotto 2° Stralcio 1° COSTRUTTIVO -**

DATI DI CONTRATTO	
CONTRATTO DEL 16/09/2015	
Lavori	48.117.134,17
Oneri sicurezza	3.004.148,76
Oneri concessione	2.887.028,05
Totale	54.008.310,98
Somme a disposizione	
Espropriazioni	1.805.086,36
Interferenze	317.054,00
Altro	3.869.548,66
Totale	5.991.689,02
Totale Progetto	60.000.000,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E., RIMBORSO INTERFERENZE, COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE PER MISSIONI AL 10/9/2018

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n° 9	30/04/2018	19.932.151	19.730.992	17.120.800
SAE n° 5	31/03/2018	662.058	662.058	662.058
Interferenze	31/08/2017	168.722	168.722	168.722
Compet. Profess.	09/07/2018	132.885	132.885	132.885
Spese per Missioni	29/08/2018	9.143	9.143	9.143
Totale		20.904.968,56	20.703.798,93	18.093.607,07

CONSORZIO INFR.AV.

SSV. LIONI - GROTAMINARDA - 1° Lotto 3° Stralcio -

DATI DI CONTRATTO	
CONTRATTO DEL 27/07/2017	
Lavori	75.997.515,06
Oneri sicurezza	3.075.667,63
Oneri concessione	4.559.850,90
Totale	83.633.033,59
Somme a disposizione	
Espropriazioni	3.916.892,37
Interferenze	634.700,00
Altro	6.036.364,04
Totale	10.587.956,41
Totale Progetto	94.220.990,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E., RIMBORSO INTERFERENZE, COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE PER MISSIONI AL 10/9/2018

DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n° 2	28/08/2018	179.046	177.203	177.203
SAE n° -		0	0	0
Interferenze		0	0	0
Compet. Profess.		0	0	0
Spese per Missioni	29/08/2018	45	45	45
Totale		€ 179.090,29	€ 177.247,27	€ 177.247,60

CONSORZIO INFRA.SUD**SSV. LIONI - GROTAMINARDA - II° Lotto I° STRALCIO****DATI DI CONTRATTO**

CONTRATTO DEL 27/07/2017	
Lavori	5.558.890,04
Oneri sicurezza	333.460,29
Oneri concessione	333.533,40
Totale	6.225.883,73
Somme a disposizione	
Espropriazioni	342.619,05
Interferenze	240.500,00
Altro	405.997,22
Totale	989.116,27
Totale Progetto	7.215.000,00

PROGRESSIVO S.A.L., S.A.E. e RIMBORSO INTERFERENZE AL 30/09/2018


DESCRIZIONE	DATA	IMPORTO PROGRESSIVO SAL	IMPORTO PROGRESSIVO CERTIFICATO	IMPORTO LIQUIDATO
SAL n°	Non emessi	0	0	0
SAE n°	Non emessi	0	0	0
Interferenze ...		0	0	0
Totale		0,00	0,00	0,00

ID	Nome attività	Inizio	Fine
1	1° LOTTO - 1° STRALCIO	mer 02/05/18	lun 31/12/18
2	LOTTO FUNZIONALE DA 807 7+325 A KM 12+140	mer 02/05/18	lun 31/12/18
3	WBS 1 - DA KM 7+325 A KM 7+715	lun 11/06/18	lun 31/12/18
4	VIABILITA' SECONDARIA - STRADA NAPOLETANA	lun 16/07/18	lun 31/12/18
7	SVINCOLO SAN TEODORO	ven 21/08/18	lun 31/12/18
17	TERRE RINFORZATE	mar 26/06/18	lun 06/08/18
20	MOVIMENTI TERRA	lun 11/06/18	ven 21/12/18
31	IMPIANTO ILLUMINAZIONE SV. S. TEODORO	mar 02/10/18	gio 15/11/18
35	VIADOTTO SAN PANCRAZIO	lun 27/08/18	mar 08/11/18
43	ASFALTI/BAARRIERE DI SICUREZZA	mer 01/09/18	mer 14/11/18
52	REGIMAZIONE IDRAULICA	mar 28/06/18	lun 30/09/18
56	WBS 2 - DA KM 7+715 A KM 9+050	mer 02/05/18	lun 31/12/18
57	VIABILITA' SECONDARIA - STRADA 310	mer 21/11/18	lun 31/12/18
59	VIADOTTO SAN MARTINO	gio 26/07/18	gio 15/10/18
66	VARIANTE GALLERIA CASINO COVONE	mer 18/07/18	mar 04/09/18
69	TERRE RINFORZATE	mer 02/09/18	ven 09/11/18
72	GALLERIA CASINO COVONE	lun 12/11/18	gio 13/12/18
74	TRINCEE DRENANTI	ven 03/08/18	gio 30/08/18
77	MOVIMENTI TERRA	mer 02/05/18	lun 31/12/18
88	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	mar 02/10/18	mar 13/11/18
91	ASFALTI/BAARRIERE DI SICUREZZA	mar 28/06/18	ven 11/12/18
97	REGIMAZIONE IDRAULICA	mar 28/06/18	ven 10/09/18
100	WBS 3 - DA KM 9+050 A KM 10+000	lun 11/06/18	ven 21/12/18
101	VIABILITA' SECONDARIA - FRINGENTO 3	lun 11/06/18	ven 21/12/18
107	VIADOTTO MEFFE	mer 01/08/18	gio 13/12/18
111	GALLERIA MEFFE 1	lun 24/09/18	ven 19/10/18
115	MURI DI CONTRORIPA	ven 13/07/18	gio 20/09/18
121	TRINCEE DRENANTI	mar 28/06/18	gio 02/08/18
124	MOVIMENTI TERRA	mar 28/06/18	lun 12/11/18
131	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	mer 14/11/18	lun 26/11/18
134	ASFALTI/BAARRIERE DI SICUREZZA	lun 01/10/18	lun 30/12/18
139	REGIMAZIONE IDRAULICA	lun 20/08/18	lun 15/10/18
143	WBS 4 - DA KM 10+000 A KM 12+140	ven 04/05/18	lun 31/12/18
144	MURI DI CONTRORIPA	gio 05/09/18	gio 27/09/18
147	SVINCOLO DI FRINGENTO	mer 04/07/18	ven 16/11/18
147	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	mer 02/10/18	lun 30/11/18
149	TRINCEE DRENANTI	mar 28/06/18	mer 11/07/18
153	MOVIMENTI TERRA	mar 28/06/18	lun 31/12/18
177	ASFALTI/BAARRIERE DI SICUREZZA	sab 15/09/18	lun 31/12/18
182	REGIMAZIONE IDRAULICA	mer 07/08/18	gio 11/10/18
185	SOTTOVIA	sab 01/10/18	lun 15/10/18
188	VIABILITA' SECONDARIA	mer 01/09/18	dom 30/09/18
190	MURI DI SOTTOSCANPA	lun 21/05/18	gio 12/07/18
192	PARATIE DI PALI	ven 01/06/18	ven 19/10/18
194	TERRE RINFORZATE	dom 02/09/18	lun 31/12/18
198	GALLERIA S. MARCO	lun 27/08/18	lun 31/12/18
198	VIADOTTO RAMPONE	ven 04/06/18	dom 30/09/18
200	SEGNALETICA STRADALE - 4.0	mar 16/10/18	lun 31/12/18
203	OPERE IN VERDE	mar 16/10/18	lun 31/12/18


STRADA A.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO DELL'AUTOSTRADA A3 SA-RC CON L'AUTOSTRADA A18 NA - BA
CRONOPROGRAMMA LAVORI 1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE
 DELIBERA CPE N° 27 DEL 23 MARZO 2012



225

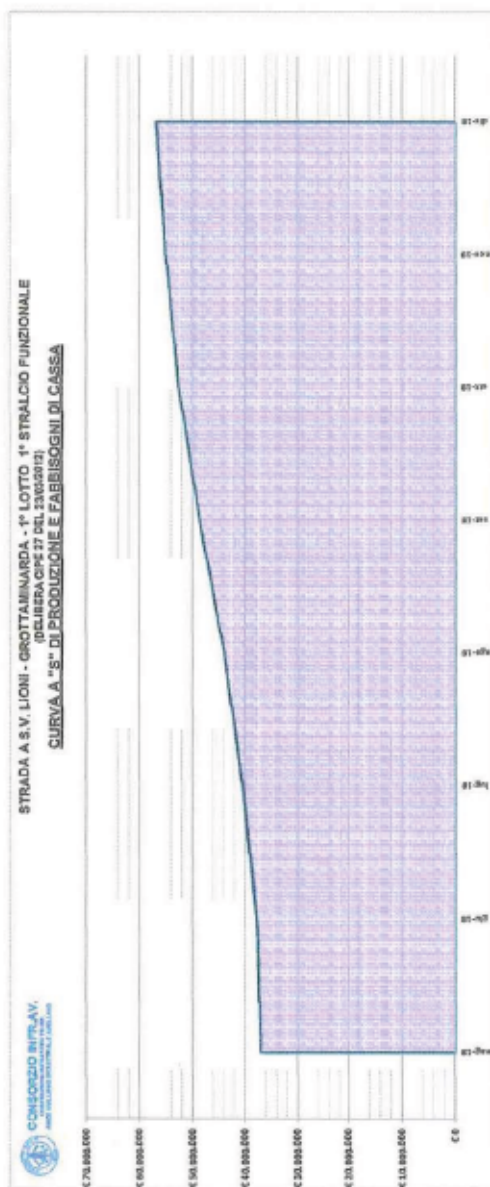


	CONGRUO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE ANNUALE	TOTALE QUINQUENNALE
1	IMPORTI LAVORI	€ 35.352.202,50	€ 888.203,00	€ 13.278.807,42	€ 8.119.071,05	€ 15.371.293,00	€ 55.053.893,97
2	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA	€ 1.874.450,00	€ 76.373,87	€ 495.147,21	€ 312.086,87	€ 194.711,24	€ 2.855.154,00
3	ONERI DI CONCESSIONI (N° DI T)	€ 2.274.774,15	€ 82.084,13	€ 605.171,88	€ 488.883,03	€ 1.186.874,80	€ 3.471.251,77
0A	TOTALE LAVORI + SICUREZZA - ONERI DI CONCESSIONE	€ 46.701.426,65	€ 966.661,00	€ 13.379.126,51	€ 9.322.791,15	€ 16.752.879,04	€ 62.460.296,51
4	DEPREZZAZIONI	€ 1.241.142,25	€ 27.784,02	€ 474.164,22	€ 364.689,20	€ 486.581,24	€ 2.195.360,93
5	ONERI PER LA MANUTENZIONE INTERFERENZE	€ 127.881,13	€ 9.156,65	€ 122.942,76	€ 9.217,49	€ 122.202,87	€ 251.600,00
6	IMPREVISTI	€ -	€ 10.883,37	€ 1.203.835,40	€ 307.208,58	€ 2.195.305,30	€ 3.393.232,65
7	SPESE GENERALI (IVA)	€ -	€ 85.933,22	€ 1.244.713,75	€ 352.541,29	€ 2.574.228,26	€ 3.294.352,00
8	FISCO (CIRCOLARI, ORD. L. 05/10/2009)	€ -	€ 5.071,89	€ 74.022,87	€ 86.893,44	€ 166.871,20	€ 198.871,20
0B	TOTALE ONERI A CARICHIAMENTO DELL'IMPRESTAZIONE	€ 1.368.824,38	€ 242.648,03	€ 3.109.940,80	€ 2.363.542,93	€ 2.911.152,80	€ 7.198.881,77
	FABBISOGNO DI CASSA TRIMESTRALE	€ 47.116.397,21	€ 1.211.965,00	€ 14.228.807,53	€ 11.386.699,38	€ 27.446.063,94	€ 93.027.002,00
	FABBISOGNO DI CASSA PER ANNO	€ 42.129.357,83	€ 27.940.602,64			€ 70.000.000,00	

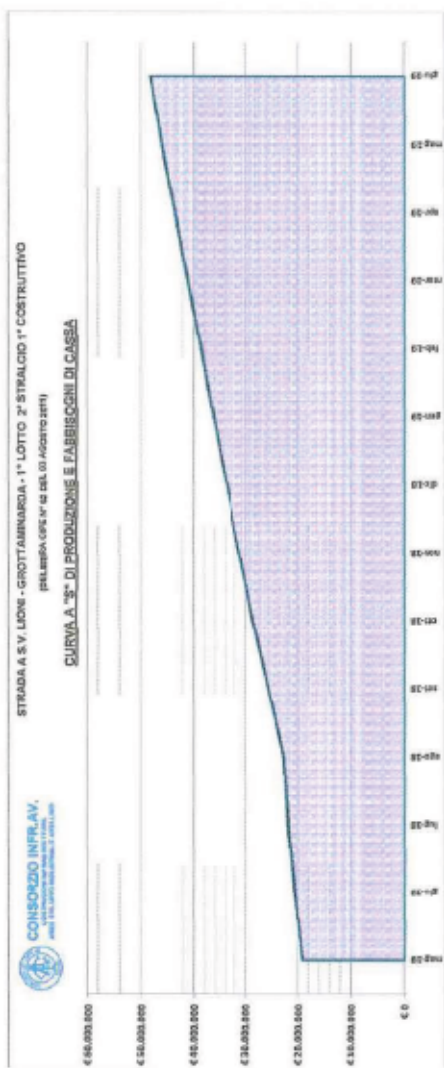

	CONTRATTO AD APPLICAZIONE	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	TOTALE AFRIE	TOTALE GENERALE
1	IMPORTO LAVORI	17.797.274,97 €	2.973.142,38 €	4.664.898,04 €	8.224.797,30 €	7.419.210,28 €	6.861.198,97 €	32.226.125,89 €	48.117.026,48 €
2	ONERI SPECIALI DI SICUREZZA	1.188.762,47 €	151.892,35 €	302.492,43 €	513.893,71 €	492.195,14 €	434.826,44 €	1.895.462,39 €	3.024.148,79 €
3	ONERI DI CONCESSIONE (5% D. 1)	1.022.476,24 €	174.932,37 €	295.172,30 €	492.498,07 €	449.892,87 €	417.892,69 €	1.871.892,31 €	2.897.028,32 €
14	TOTALE LAVORI + SICUREZZA + ONERI DI CONCESSIONE	19.908.513,68 €	3.299.467,03 €	5.262.562,77 €	9.211.188,14 €	8.359.298,29 €	7.693.918,10 €	34.973.480,59 €	54.038.203,69 €
4	RIFFORNIZIONE	558.462,71 €	103.042,84 €	101.892,51 €	208.792,77 €	279.694,77 €	261.339,24 €	1.124.762,13 €	1.824.143,84 €
5	DIRITTO PER IL RINNOVO INTERFERENZE	180.251,39 €	14.592,28 €	23.752,69 €	40.293,83 €	36.242,83 €	34.126,63 €	149.726,11 €	217.064,00 €
6	SUPPLEMENTI	- €	175.022,38 €	291.295,13 €	496.799,27 €	497.025,51 €	418.292,83 €	1.869.805,33 €	1.029.662,09 €
7	SPESE GENERALI (4%)	- €	154.698,26 €	307.026,18 €	521.497,62 €	479.294,87 €	441.242,11 €	1.861.893,37 €	1.204.693,37 €
8	PREZZO CHIUSO ESART. 131 D. L. 10.03.00	- €	11.022,85 €	18.242,89 €	21.153,29 €	28.165,12 €	28.270,88 €	115.025,30 €	115.025,30 €
10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMBITAZIONE	203.964,20 €	696.428,25 €	823.119,29 €	1.307.377,18 €	1.266.347,39 €	1.182.751,48 €	5.197.982,31 €	5.061.262,51 €
	FABBRICAZIONE DI CASSA TRIMESTRALE	- €	3.769.877,97 €	4.299.716,42 €	15.629.429,27 €	9.598.892,79 €	8.998.874,48 €	29.234.864,47 €	46.029.662,08 €
	FABBRICAZIONE DI CASSA PER ANNO	- €	€ 20.629.716,25	€ 18.983.378,21	€ 16.234.084,47	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00

CONSORZIO INFRAV. SOSTABILIMENTI PUBBLICI AREA VASTOPO-PARATIE-TERRA ARMIATA		STRADA A S.V. LIONI - GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO DELL'AUTOSTRADA A3 SA-RC CON L'AUTOSTRADA A16 NA - BA	
CRONOPROGRAMMA LAVORI 1° LOTTO 3° STRALCIO (Delibera CIPE n° 62 del 03 agosto 2011)		CRONOPROGRAMMA LAVORI 1° LOTTO 3° STRALCIO (Delibera CIPE n° 62 del 03 agosto 2011)	
ID	Nome attività	Inizio programmato	Fine programmata
1	MOVIMENTO MATERIE, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI	mar 28/08/16	ago 21/01/21
2	WBS 6 - GALLERIA SAN RUPO	ago 21/01/21	ago 21/01/21
3	COSTRUZIONE	ven 28/08/16	ago 21/01/21
4	WBS 6 - Da Km 14+118 A Km 15+450	ven 11/10/20	ven 11/10/20
5	BONIFICA ORIGINI BELLI	ven 25/07/16	ven 25/07/16
6	MOVIMENTO MATERIE, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI	ven 04/09/16	ven 04/09/16
7	VIADOTTO PESCARIELLO (V108)	mar 10/09/19	mar 10/09/19
13	GALLERIA ARTIFICIALE VALLI (G048)	mar 03/04/19	mar 03/04/19
19	GALLERIA ARTIFICIALE GEBALDO	ago 31/10/19	ago 31/10/19
25	OPERE D'ARTE INFORI (MURI-PARATIE-TERRA ARMIATA)	ven 08/11/20	ven 08/11/20
26	IMPIANTI ELETTRICI	ven 11/11/20	ven 11/11/20
27	OPERE DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE IDRAULICA	mar 15/04/20	mar 15/04/20
28	SOVRASTRUTTURA STRADALE + ADEGUAMENTO VARIUTA'	ven 13/11/20	ven 13/11/20
29	BARRIERE DI SICUREZZA	ven 19/10/20	ven 19/10/20
30	SEGNALETICA STRADALE	ven 20/10/20	ven 20/10/20
31	OPERE IN VERDE	ven 17/10/20	ven 17/10/20
32	WBS 7 - Da Km 16+460 A Km 17+169	mar 09/09/18	mar 09/09/18
33	BONIFICA ORIGINI BELLI	ago 07/05/16	ago 07/05/16
34	MOVIMENTO MATERIE, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI	ago 14/03/16	ago 14/03/16
35	VIADOTTO CARUTO CELESA (V150)	ven 18/07/16	ven 18/07/16
41	GALLERIA ARTIFICIALE SANT'ANDREA (G049)	ven 03/07/16	ven 03/07/16
47	VIADOTTO PENIA (V109)	ven 13/01/16	ven 13/01/16
50	G.A. VACCHE (G010)	mar 03/02/16	mar 03/02/16
55	IMPIANTI ELETTRICI	ago 22/08/19	ago 22/08/19
56	OPERE D'ARTE INFORI (MURI-PARATIE-TERRA ARMIATA)	mar 25/06/20	mar 25/06/20
57	BARRIERE DI SICUREZZA	ven 25/06/20	ven 25/06/20
58	OPERE DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE IDRAULICA	ago 20/01/20	ago 20/01/20
59	OPERE IN VERDE	ven 08/06/20	ven 08/06/20
60	SOVRASTRUTTURA STRADALE + ADEGUAMENTO VARIUTA'	ven 17/01/20	ven 17/01/20
61	SEGNALETICA STRADALE	ven 23/05/20	ven 23/05/20
62	WBS 8 - Da Km 17+150 A Km 19+460	ago 14/03/16	ago 14/03/16
63	MOVIMENTO MATERIE, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI	ago 03/02/20	ago 03/02/20
64	IMPIANTI ELETTRICI	ago 14/03/16	ago 14/03/16
65	OPERE DI SOSTEGNO (MURI - PARATIE - TERRA ARMIATA)	ago 01/07/19	ago 01/07/19
66	BARRIERE DI SICUREZZA	ven 06/07/20	ven 06/07/20
67	OPERE DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE IDRAULICA	ago 20/09/19	ago 20/09/19
68	OPERE IN VERDE	ven 20/05/20	ven 20/05/20
69	SOVRASTRUTTURA STRADALE + ADEGUAMENTO VARIUTA'	ago 17/02/20	ago 17/02/20
70	SEGNALETICA STRADALE	ago 22/06/20	ago 22/06/20
71	WBS 9 - Da Km 18+000 A Km 19+460	ago 29/05/16	ago 29/05/16
72	BONIFICA ORIGINI BELLI	ago 21/06/19	ago 21/06/19
73	MOVIMENTO MATERIE, BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI	ago 15/06/20	ago 15/06/20
74	GALLERIA ARTIFICIALE POPPI	ago 01/02/19	ago 01/02/19
80	SOTTOVIA - VIA CHIETRO	ago 28/05/16	ago 28/05/16
81	SOTTOVIA - Km 19+223	ago 15/06/20	ago 15/06/20
82	IMPIANTI ELETTRICI	ago 03/02/20	ago 03/02/20
83	OPERE DI SOSTEGNO (MURI - PARATIE - TERRA ARMIATA)	ago 07/11/16	ago 07/11/16
84	BARRIERE DI SICUREZZA	ago 17/06/20	ago 17/06/20
85	OPERE DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE IDRAULICA	ago 19/03/19	ago 19/03/19
86	SOVRASTRUTTURA STRADALE + ADEGUAMENTO VARIUTA'	ago 16/03/20	ago 16/03/20
87	SEGNALETICA STRADALE	ago 28/05/20	ago 28/05/20
88	GALLERIA VARIANTE S520 3° STRALCIO	ago 23/04/19	ago 23/04/19
89	OPERE IN VERDE	ago 17/06/20	ago 17/06/20

 CONSORZIO INFRAV. <small>CONTRATTI INFRASTRUTTURE TURISTICO-AMBIENTALI MULTISCALE INTEGRATE</small>		SSV LIONI - GROTTAMINARDA INFRAV - 1° LOTTO 4° STRALCIO DELIBERA CIPE N° 62 DEL 03/08/2011 CRONOPROGRAMMA	
ID	Linea/Item attività	CURATA CON NATURALE CONSECUTIVI	
1	1 Lotto Infrav - 4° Stralcio	1643 g	
2	2 COLPLETAMENTO WBS 1- stato tra le prog. 6-6/08 e 7-1/05 (risolto dai tagli e opere complementari e di finitura)	1187 g	
3	3 OPERE PROFESSIONISTICHE	273 g	
4	4 Esercizi	273 g	
5	4 Antidiveg. BOB - carterizzazione	91 g	
6	3 VIADOTTO "PBI BAGNI"	751 g	
7	4 realizzazione opera	751 g	
8	3 OPERE COMPLEMENTARI, RACCORDO SVINCOLO SAN TEODORO, TRINCEE DRENANTI, SOVRASTRUTTURE E FINITURE	648 g	
9	4 OPERE COMPLEMENTARI... SOVRASTRUTTURE E FINITURE	548 g	
10	2 COLPLETAMENTO WBS 5- completamento galleria naturale "San Filippo", impianti tecnologici, opere di completamento e di finitura	1504 g	
11	3 Movimenti terra	92 g	
12	3 completamento galleria San Filippo e bypass	609 g	
13	3 impianti tecnologici	822 g	
14	3 altre lavorazioni di completamento, ripristino strada, opere a verde, impiantistica, arredi urbani e finiture	947 g	

STRADA A S.V. LIONI - GROTTAMINARDA - 2° LOTTO 1° STRALCIO + 2° STRALCIO DA PROGR. 0+450 A PROGR. 3+052

(DELIBERA CIPE N° 54 DEL 01 DICEMBRE 2016)

- IPOTESI DI INIZIO 2° STRALCIO GENNAIO 2019 -



ID	Linea/Strada	QUANTITÀ (GIORNI)	PREZZO UNITARIO (€/GIORNO)	TOTALE (€)
1	1° STRALCIO - 2° STRALCIO	1147 g	0 g	0 g
2	CONSEGNA LAVORI	973 g	1616	1574088
3	OPERE PROPRIETARIE	425 g	425	180625
4	Interventi (strade)	425 g	425	180625
5	Esport	240 g	120	28800
6	Indagini preloggettuali	120 g	120	14400
7	Impianto cantieri	120 g	120	14400
8	Bonifica Orloggi basti	90 g	90	10800
9	Divisione Strada provinciale 279	90 g	90	10800
10	POZZI E TRINCEE DRENANTI	34 g	34	4080
11	VIADOTTO FREGANE 1	42 g	42	5040
12	VIADOTTO FREGANE 2	449 g	449	53880
13	ASSE PRINCIPALE - MOVIMENTI TERRA	309 g	309	37080
14	Opere d'arte minori	279 g	279	33480
15	OPERE E SOSTITUZIONI DRENAGHE	58 g	58	7000
16	BOVIASTRUTTURA STRADALE E FIRTURE	90 g	90	10800
17	Opere A VERDE	73 g	73	8760
18	2° STRALCIO	1271 g	0 g	0 g
19	CONSEGNA LAVORI	0 g	0	0
20	ALLIESTRIMENTO CAMPO BASE E CAMPI SATELLIT - TRACCIAMENTI ED ESPROPRI	1271 g	1271	1614081
21	Trasporti	1271 g	1271	1614081
22	esport (prelievo di iniezione in passato)	160 g	160	19200
23	esport (distrinzione)	53 g	53	6360
24	bonifica orloggi basti	120 g	120	14400
25	sviluppo (strade)	280 g	280	33600
26	Costruzione di opere d'arte	272 g	272	32640
27	Campi base (compilazione)	65 g	65	7800
28	Allestimento campo satellite 1	44 g	44	5280
29	Ponti (strade)	330 g	330	39600
30	Trasporti	330 g	330	39600
31	VIADOTTO FREGANE 1	739 g	739	88680
32	VIADOTTO FREGANE 2	652 g	652	78240
33	GALLERIE ARTIFICIALI FREGANA 1	461 g	461	55320
34	GALLERIE ARTIFICIALI FREGANA 2	203 g	203	24360
35	VIADOTTO FREGANE 3	641 g	641	76920
36	GALLERIA ARTIFICIALE COSTA RUBINO	583 g	583	70000
37	VIADOTTO FREGANE 3	647 g	647	77640
38	ASSE PRINCIPALE - MOVIMENTI TERRA	700 g	700	84000
39	OPERE D'ARTE MINORI	722 g	722	86640
40	OPERE A VERDE	179 g	179	21480
41	OPERE E SOSTITUZIONI DRENAGHE	202 g	202	24240
42	BOVIASTRUTTURA STRADALE E FIRTURE	876 g	876	105120

22.6)

N.	OPERA	ENTE	N. AUTORIZZAZIONE	DATA AUTORIZZAZIONE
1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE				
1	GALLERIA ARTIFICIALE VALLICOCCE OPERE DI MARCOCCO, SCATOLARI, BRALUCCO PK 9+125	Genio civile Avellino	73639	25/11/2014
2	GALLERIA ARTIFICIALE S. MARCO	Genio civile Avellino	73847	16/03/2015
3	GALLERIA ARTIFICIALE S. PANCRAZIO	Genio civile Avellino	73049	16/03/2015
4	GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE	Genio civile Avellino	74155	01/07/2015
5	ATTRAVERSAMENTO S. MARCO, SOSTEGNO A PK 10+309	Genio civile Avellino	74094	18/11/2015
6	GALLERIA ARTIFICIALE MERITE 2	Genio civile Avellino	74805	02/02/2016
7	GALLERIA ARTIFICIALE MERITE 1	Genio civile Avellino	74805	02/02/2016
8	MADOTTO MERITE, MURO SOSTEGNO PK 9+636, TRINCEE DRENANTI	Genio civile Avellino	74805	30/03/2016
9	PARATA DI SOSTEGNO PK 8+195 + 8+209	Genio civile Avellino	75164	23/07/2016
10	MADOTTO SAN PANCRAZIO, PARATA AL PIEDE RILEVATO PK 7+514 + 7+550, TRINCEA DRENANTE	Genio civile Avellino	75168	22/07/2016
11	PK 4+201 + 8+983 (MURI DI CONTROPIA, PARATA AL PIEDE, MURI SU PALLI, TRINCEE DRENANTI) (AREA 4)	Unione Terre dell'Uffita	AS.2016.544.2	19/07/2016
12	MADOTTO SAN MARTINO, MURO SU PALLI A PK 7+098, TRINCEE DRENANTI	Genio civile Avellino	75231	19/08/2016
13	MADOTTO RAMPONE, TRINCEE DRENANTI	Genio civile Avellino	75592	09/03/2017
14	MURI DI CONTROPIA E OPERE A SOSTEGNO RILEVATO DELLO SVINCOLO DI SAN TEODORO (AREA 1)	Genio civile Avellino	75765	30/05/2017
15	MADOTTO SAN PANCRAZIO (VARIANTE TRAVE)	Genio civile Avellino	75165/Var	08/06/2017
16	MADOTTO MERITE (VARIANTE TRAVE)	Genio civile Avellino	74900/Var	30/06/2017
17	OPERE A SOSTEGNO RILEVATO PK 9+099 + 9+460, ATTRAVERSAMENTO BRALUCCO PK 9+440, TRINCEE DRENANTI (AREA 6)	Genio civile Avellino	75688	28/07/2017
18	MADOTTO RAMPONE (VARIANTE IMPALCATO)	Genio civile Avellino	75502/Var	14/09/2017
19	OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 7+225 + 7+334 E PK 7+370 + 7+388	Unione Terre dell'Uffita	AS.2017.683.1	20/09/2017
20	OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 9+475 + 9+600 E MURI IN C.A. 9+491+9+581	Unione Terre dell'Uffita	AS.2017.682.1	05/10/2017
21	OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 8+209 + 8+375 E PK 8+750 + 8+993	Unione Terre dell'Uffita	AS.2017.707.2	10/10/2017
22	MURI DI CONTROPIA PK 9+983 + 10+314, MURI DI SOTTOSCARPA E PARATE INVESTITI SVINCOLO DI FUGENTO, TRINCEE DRENANTI (AREA 9)	Genio civile Avellino	76166	13/11/2017
23	MADOTTO SAN MARTINO (VARIANTE IMPALCATO)	Genio civile Avellino	75231/Var	20/11/2017
24	MURI TERRA RINFORZATA PK 11+475, MURI CONTROPIA PK 10+902 + 11+520, MURO SOTTOSCARPA PK 10+925, TRINCEE DRENANTI PK 11+050	Genio civile Avellino	70548	24/04/2018
27	GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE (VARIANTE PARATA IMBOCCO)	Genio civile Avellino	75164/Var	26/06/2018
29	OPERE D'ARTE MINORI - SVINCOLO SAN TEODORO - RAMPA A	Genio civile Avellino	76999	26/06/2018
28	GALLERIA ARTIFICIALE SAN MARCO (VARIANTE)	Genio civile Avellino	73847/Var	27/06/2018
25	MURI DI CONTROPIA PK 9+856 + 9+871 (AREA 8)	Unione Terre dell'Uffita	AS.2018.760.3	05/07/2018
26	MURI DI CONTROPIA IN SX E DX DA PROG. 9+058 + 9+085 (AREA 1)	Unione Terre dell'Uffita	AS.2018.764.1	17/07/2018
1° LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO				
1	GALLERIA ARTIFICIALE MACCHIE	Unione Terre dell'Uffita	AS.2017.610.1	14/03/2017
2	GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO SUD	Genio civile Avellino	75634	21/03/2017
3	GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO NORD	Genio civile Avellino	75615	21/03/2017
4	GALLERIA ARTIFICIALE PRATOIA	Unione Terre dell'Uffita	AS.2017.611.1	11/04/2017
5	MADOTTO SAN SILVESTRO, TRINCEE DRENANTI	Genio civile Avellino	75771	06/05/2017
6	GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO	Genio civile Avellino	75786	14/06/2017
7	MADOTTO SCHMITO MACCHIE	Genio civile Ariano I	GC.AL.2017.003912	24/08/2017
8	MURI DI CONTROPIA PK 17+665 + 17+687 E MURI DI CONTROPIA, PK 17+797 + 17+809	Unione Terre dell'Uffita	AS.2017.711.2	19/10/2017
9	GALLERIA ARTIFICIALE SS-90	Unione Terre dell'Uffita	AS.2018.769.1	20/04/2018
1° LOTTO 3° STRALCIO				
1	GALLERIA ARTIFICIALE WALLI	Genio civile Avellino	76529	13/04/2018
2	MADOTTO PENTA	Genio civile Ariano I	GC.AL.2018.002316	28/05/2018
3	MURI DI CONTROPIA DA PK 17+987,50 + 17+987,50	Unione Terre dell'Uffita	AS.2018.760.3	05/07/2018
4	MADOTTO CAPUTO COLESA	Genio civile Avellino	76745	04/07/2018



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Ades L. 289/02 art. 86

2a.7) I SUBAPPALTI E LE FORNITURE

Vengono allegate alla presente Relazione la prima ed ultima pagina dell'elenco dei contratti di subappalto e di forniture, data la copiosa mole dello stesso, consultabile nella sua interezza presso lo scrivente Ufficio.

23.4

07/06/2019

€ 5.150.000,00 del Provvedimento del 20.12.2018; C.C.A.A.: Opere Straordinarie S.A. n. 15.000.000,00 n. 10.200.000,00 €
 € 4.841.100,00 del Provvedimento del 20.12.2018; C.C.A.A.: Opere Straordinarie S.A. n. 15.000.000,00 n. 10.200.000,00 €
 € 2.676.904,00
 € 3.094.100,00

SUB-APPALTI
 Importo dei lavori affidati per il lotto intero (invalore)
 Importo dei lavori affidati per il lotto intero (invalore)
 Importo dei lavori affidati per il lotto intero (invalore)
 Importo dei lavori affidati per il lotto intero (invalore)

CONTA	TIPO	REVISIONE	NOTA CONCORSIONARIA	DATA AVVIO	IMPRESA SUB-APPALTRICE	LAVORI	IMPORTO CONTRATTO	IN COLLAZIONE PER LA SICUREZZA	PER LA SICUREZZA	NOTE S.L.	AUTORE S.U.P.	CODICE AMMINISTRATIVO (Art. 2307/18)	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE (Art. 2307/18)	AUTORIZZAZIONE COMMISSARIALE (Art. 2307/18)	NOTE
ME-A1	1° STRALCIO	S.A.F. S.r.l.	10-gio-12	10-gio-12	"A.B.C. GENERAL ENGINEERING S.R.L."	Installazione impianti elettrici	€ 230.000,00	€ 222.000,00	€ 6.700,00	mod. n. 17/04 di non contestata					
ME-A1	1° STRALCIO	INTERAGIONE	03-ago-12	03-ago-12			€ 300.417,16	€ 279.500,00	€ 89.917,16	mod. n. 15/07 di non contestata art. 18 del D.M. 12/07/08 PARERE POSITIVO	RUP n. 20044 del 24/10/13				
ME-A1		CHIMICHEM		16-ago-15											
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	03-ago-15	20-ago-15	S.A.L. FANALE S.1014-48	Manutenzione impianti	€ 5.437.504,00	€ 5.204.811,04	€ 232.692,96	mod. n. 15/07 di non contestata art. 18 del D.M. 12/07/08 PARERE POSITIVO	RUP art. n. 10 del 20/03/14				Nota n. 791 esplicita rinvio di agenda
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	03-ago-15	20-ago-15	"CARTELLANO COSTRUZIONI S.P.A."	CESSAZIONE MANO D'OPERA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	03-ago-15	20-ago-15	"CARTELLANO COSTRUZIONI S.P.A."	ATTI AGGIUNTIVI Movimento di materiale - Innova (gravi)	€ 875.200,00	€ 832.542,42	€ 42.657,58	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	14-ago-18	14-ago-18	"CARTELLANO COSTRUZIONI S.P.A."	ATTI AGGIUNTIVI Rivestimenti di fessure con materiali minerali e sospensionati con sospensionati con	€ 350.000,00	€ 220.581,24	€ 129.418,76	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	20-ago-18	27-ago-18	"CARTELLANO COSTRUZIONI S.P.A."	elettronica impianti n. 180 del 14/02/18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	2° STRALCIO	I.C.I.	15-ago-17	31-ago-17	"CARTELLANO COSTRUZIONI S.P.A."	SCARICAZIONE PALLI Ø1000 mm	€ 20.000,00	€ 24.410,00	€ 4.410,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	2° STRALCIO	CONDITTE	03-ago-17	04-ago-17	"CARTELLANO COSTRUZIONI S.P.A."	TRASPORTO E SCARICO A MONTAGNA MATERIALE DI SCARICO DELLA TRAI E DELLO SCARICO GALLERIA SOTTOGALLERIA SOTTOGALLERIA	€ 551.000,00	€ 580.888,11	€ 31.000,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° LOTTO 3° STRALCIO	I.C.I.	19-00/07-20/07/17	19-00/07-20/07/17	"CARTELLANO COSTRUZIONI S.P.A."	Scavo e sistemazione scavo	€ 2.625.107,00	€ 2.617.830,00	€ 7.277,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	11-ago-15	11-ago-15	"MARCHESI GROUP SRL"	Integrazione in ambito S.p.A. di di grande diametro	€ 1.140.000,00	€ 1.078.512,00	€ 61.488,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	22-12-15 n. 207	22-12-15	IDEM	Integrazione per sala controllo	€ 407.770,00	€ 447.284,82	€ 39.514,82	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	22-05-17 n. 275	22-05-17 n. 275	IDEM	Integrazione via scavo per Montepulciano di grande diametro	€ 112.000,00	€ 107.000,00	€ 5.000,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	1° STRALCIO	SA.F.3 S.r.l.	27-04-18 n. 065	27-04-18 n. 065	IDEM	Integrazione in ambito S.p.A. di di grande diametro	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 0,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					
ME-A1	2° STRALCIO	MARINO COSTRUZIONI	26-05-10 n. 039	26-05-10 n. 039	"MARCHESI GROUP FONDATORI S.P.A."	Pali grande diametro ad alte alture	€ 120.000,00	€ 112.800,00	€ 7.200,00	mod. n. 15/07/08 PARERE POSITIVO					

07/25/2018

CONG.	TRATTO	COMUNE	NOTA CONCESSIONARIA	DATA ABBON. NOTA AL D.L.	IMPRESA SUB-APPALTATRICE	LAVORI	IMPORTO CONTRATTO	ETICH PER LAVORI	PER SICUREZZA	NOTE D.L.	AUTORIZ. R.U.P.	COORDINAM. CARLO VITALE (n. 15/07/14)	AUTORIZZAZIONE MIISTERO SIFIS E TRASP. PRIVAT. INTER. (n. 80/14/2014/MIISTERO)	AUTORIZZAZIONE MIISTERO SIFIS E TRASP. PRIVAT. INTER. (n. 80/14/2014/MIISTERO)	NOTE
18/Av	1° STRALCIO FUNZIONALE	S.A.F. S.p.A.	27.04.18 n. 814	27/04/2018	"POLIMAR S.p.A."	Servizio di gestione e manutenzione servizi di pubblica utilità	€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
18/Av	1° STRALCIO FUNZIONALE	S.A.F. S.p.A.	27.04.18 n. 815	27/04/2018	"OFFICINE DE LUCA"	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 287,41	€ 0,00	€ 0,00	NN					
18/Av	1° LOTTO 3° STRALCIO	MARINO	14.05.18 n. 928	14/05/2018	"DOTT. GIOVANNI VITELLO"	Servizi professionali di consulenza e assistenza	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
18/Av	1° LOTTO 3° STRALCIO	I.C.I. S.p.A.	21.05.18 n. 1047	21/05/2018	"C.F.B. Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia"	Servizi di formazione	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
18/Av	2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO	CONGOITTE	14.05.18 n. 1222	18/06/2018	ATI "INGEG. S.r.l./GEMO S.r.l."	Servizi di progettazione e direzione lavori	€ 133.705,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					
18/Av	1° LOTTO 3° STRALCIO	I.C.I. S.p.A.	18.07.18 n. 1445	18/07/2018	"PROTOR CHEC S.p.A."	Manutenzione straordinaria per il sistema di irrigazione	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00	NN					

22.8)

SSV LIONE-GROTTAMPARDA (DA Progr. 6.500 A Progr. 19.960)
 REPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018)
 RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO

Segn.	Acq.	Tipologia	Prospettiva riferimento	Caratteristiche progetto/interferenza	MSB opera in progetto	Stato Gestione	Note	Avanzato e risultato %	Costi risultanti previsti nel P.E.	Costi in corso d'opera	Costi (RIMBORSATI)	Costi in corso di pagamento	ESITO	
24	F	Elettricità	7267,00	Linea MT su pali	Galleria San Pancrazio - Grottole San Teodoro (Vitanzana)	ENEL distribuzione	Lunga la dir. con Ripalimone - S. Pancrazio (da via verso la rotonda), in corrispondenza della sottostazione, perpendicolare a via della rotonda lungo la via. S. Rocco Poggio (da via) fino all'arrivo dello strada che si collega alla Terna di S. Teodoro (Cimitero Comunale).	Occorre	€ 27.000,00				RIMBORSATA PER € 0,00	
25	F	Elettricità	7275,00	Linea BT su pali	Galleria San Pancrazio - Grottole San Teodoro (Vitanzana)	ENEL distribuzione	Lunga la dir. con S. Pancrazio Ripalimone (da via verso la rotonda), in corrispondenza della sottostazione.	Occorre	€ 27.000,00					
31	F	Elettricità	6460,00	2 linee DT/MT su pali	Tironea e mobilità locale strada in allargamento all'asse principale (strada pol. art. Valicocco - via della Motta)	ENEL distribuzione	Strada tutta asfaltata.	Occorre	€ 28.000,00	€ 80.813,30	8800,62			
32	F	Elettricità	8547,00	Linea MT su pali	Tironea e mobilità locale strada in allargamento all'asse principale (strada pol. art. Valicocco - via della Motta)	ENEL distribuzione	In zona agricola limitata alla strada comunale Motta, in prossimità del vecchio Motta.	Occorre	€ 27.000,00					
33	F	Elettricità	6032,00	2 linee MT su pali	Rivista asse principale via vecchia Motta	ENEL distribuzione	In zona agricola in prossimità dell'asse del vecchio Motta.	Occorre	€ 27.000,00					
34	F	Elettricità	5175,00	Linea MT su pali	Vecchio Motta	ENEL distribuzione	Linea di M.T. tra plot 2 e spazio B del vecchio Motta.	Occorre	€ 27.000,00					
45	F	Elettricità	1126,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale San Marco	ENEL distribuzione	Linea BT lungo la strada comunale San Marco	Occorre	€ 9.000,00					
26	F	SENSE comunali	724,00	Rinnovazione strada comunale	Galleria San Pancrazio - Grottole San Teodoro (Vitanzana)	Comune di Vitanzana	Lunga la dir. con Ripalimone - S. Pancrazio, in corrispondenza ad a via della rotonda.	Occorre	€ 28.000,00	€ 37.551,50				ATTESA FATTURA ENTE
27	F	Idrica	7348,00	condotta idrica in polietilene Ø 75	Galleria S. Pancrazio - Grottole San Teodoro (Vitanzana)	Alto Calore Servizi	Lunga la dir. con Ripalimone - S. Pancrazio, in corrispondenza ad a via della rotonda.	Occorre	€ 25.000,00					
28	F	Telecomunicazioni	8941,00	Linea su pali	Tironea arte galleria Valicocco	Telecom	lungo strada comunale Valicocco	Occorre	€ 20.000,00	€ 1.177,04				RIMBORSATA 90% PER € 17.803,26
31	F	Telecomunicazioni	6276,00	Linea su pali	Rivista in via pol. art. Valicocco - vecchio Motta	Telecom	Linea sulla mobilità locale strada, in allargamento al tratto in strada.	Occorre	€ 12.480,00	€ 10.995,56	3769,25			
35	F	Telecomunicazioni	6064,00	Linea su pali	Galleria artificiale Motta	Telecom	Linea lungo la strada comunale Motta	Occorre	€ 900,00	€ 10.181,85				
36	F	Telecomunicazioni	2027,00	Stessa linea data oggi SEN	Rampa di collegamento con la Valle Ubia	Telecom	La quale si ricollega alla rotonda (via. Rip).	Occorre	€ 4.000,00					
42	F	Telecomunicazioni	1045,00	Linea su pali	Rivista	Telecom	Strada comunale La Motta	Occorre	€ 11.000,00	€ 10.990,84				
29	F	Idrica	6913,00	condotta idrica in polietilene Ø 50	Tironea	Alto Calore Servizi	Lunga la dir. con Valicocco	Occorre	€ 28.580,00			17482,50	CHIESO RIMBORSO PER € 17.692,18	
30	F	SENSE comunali	6987,00	Fognatura Comunale (ov. Ø 315)	Galleria artificiale Motta	Comune di Pignone	Fognatura lungo strada comunale Motta	Occorre	€ 19.000,00				2298,50	CHIESO RIMBORSO PER € 27.238,50
37	F	Idrica	6905,00	condotta idrica in polietilene Ø 50	Galleria artificiale Motta	Alto Calore Servizi	dir. con M.M. in prossimità delle falciate per Pignone	Occorre	€ 27.500,00					
44	F	Idrica	1153,00	condotta idrica in acciaio Ø 60,00	Galleria artificiale San Marco	Alto Calore Servizi	Lunga la strada comunale San Marco	Occorre	€ 9.500,00	€ 137.705,62			ATTESA FATTURA ENTE	
43	F	SENSE comunali	11380,00	Fognatura Comunale (ov. Ø 315)	Galleria San Marco	Comune di Pignone	Lunga la strada comunale San Marco	Occorre	€ 9.500,00					
39	F	SENSE comunali	1029,00	Rinnovazione strada	Rivista	Comune di Pignone	Linea di pubblica illuminazione lungo la strada comunale La Motta.	Occorre	€ 28.000,00					
40	F	SENSE comunali	1042,00	Fognatura Comunale (ov. Ø 315)	Rivista	Comune di Pignone	Strada comunale La Motta	Occorre	€ 19.000,00					
41	F	Idrica	1000,00	condotta idrica in polietilene Ø 38	Rivista	Alto Calore Servizi	Lunga la dir. con La Motta	Occorre	€ 28.100,00					
45	F	Telecomunicazioni	11387,00	Linea su pali	Galleria San Marco	Telecom	Linea sulla strada comunale San Marco	Occorre	€ 980,00	€ 1.074,85	981,26		RIMBORSATA 90% PER € 981,26	
47	F	Idrica	11526,00	condotta idrica in acciaio Ø 325,00	Rivista	Alto Calore Servizi	L'acquedotto attraverso la zona agricola	Occorre	€ 5.000,00	€ 16.047,13		16047,13	CHIESO RIMBORSO PER € 16.047,13	
48	F	Elettricità	12360,00	Linea BT su pali	Galleria naturale Pomo di San Filippo (Bianco) via Lione - S. Filippo	ENEL distribuzione	Linea su tralicci in zona agricola	Occorre	€ 27.000,00	€ 49.553,43	4954,43		RIMBORSATA PER € 43.554,43	
49	F	Elettricità	12310,00	Linea BT su pali	Galleria naturale Pomo di San Filippo	ENEL distribuzione	In corrispondenza della strada comunale San Paolo Lappada	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre	
50	F	Telecomunicazioni	12327,00	Linea su pali	Galleria Pomo di San Filippo	Telecom	In corrispondenza della strada comunale San Paolo Lappada	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre	
51	F	Elettricità	12320,00	Linea BT su pali	Galleria Pomo di San Filippo	ENEL distribuzione	Linea su strada comunale Pignone	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre	
52	F	Telecomunicazioni	12328,00	Linea BT su pali	Galleria San Paolo - Grottole San Teodoro (Vitanzana)	Telecom	Strada comunale Pignone	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre	
53	F	SENSE comunali	12910,00	Rinnovazione strada di via San F.	Galleria Pomo di San Filippo	Comune di Pignone	strada comunale San Filippo	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre	

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXIX N. 2

GGV LIONI-GROTTAMARRA (DA Progr. 6.500 A Progr. 19.999)
RIPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.08.2018)
RAFFRONTO CON SUPPORTI PRESTITI NEL PROGETTO ESECUTIVO

Legge	Indice	Tipo	Programma finanziato	Caratteristiche specifiche interferente	RES opere in progetto	Ente Gestore	Note	Previsione di espletamento	Costi (esclusione premiati per I.P.E.)	Costi (in senso lato) (premiati)	Costi RIMBORSATI	Costi (in senso lato) (premiati)	STATO
14	1	Telecomunicazioni	13800,00	Linea su pali	Galleria Piano di San Filippo	Telecom	Linea in zona agricola in prossimità della SS300	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
25	11	Elettricità	13025,00	Linea DT su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	Linea in zona agricola in prossimità della SS300	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
26	11	Servizi comunali	13800,00	Rinnalzamento strada comunale	Galleria naturale Piano di San Filippo	Comune di Fignano	Via Piano S. Filippo	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non Occorre
27	11	Elettricità	13115,00	Linea BT su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	Via Piano S. Filippo	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
28	11	Elettricità	13138,00	Linea DT su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	ENEL distribuzione	zona agricola nei pressi di Via Piano S. Filippo	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
29	11	Telecomunicazioni	13250,00	Linea su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	Telecom	Via Piano S. Filippo in zona di accesso residenziale	Non Occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
30	11	Telecomunicazioni	13778,00	Linea su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	Telecom	Strada comunale Fontana Tascata	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
41	11	Telecomunicazioni	13768,00	Linea su pali	Galleria naturale Piano di San Filippo	Telecom	strada comunale Fontana Tascata	Non occorre	€ 0,00	€ 0,00			Non occorre
42	1	Idrica	14900,00	condotta idrica in acciaio Ø12"	Rivoli	Alto Calore Servizi	In prossimità del studio San Giovanni	Occorre	€ 0,00	€ 0,00			PROGETTA
43	1	Telecomunicazioni	14900,00	Linea su pali	Viadotto San Silvestro	Telecom	Linea diretta di accesso al ospedale	Occorre	€ 11.000,00	€ 0,00			RISOLTA DA TELECOM
44	1	Idrica	14930,00	condotta idrica in acciaio Ø12"	Viadotto San Silvestro	Alto Calore Servizi	Si trova sull'area dove deve essere costruita la pista	Occorre	€ 0,00	€ 0,00			PROGETTA
45	1	Elettricità	14240,00	Linea MT su pali	Viadotto San Silvestro	ENEL distribuzione	Linea MT in zona agricola	Occorre	€ 9.900,00	€ 9.700,00	800,00		RIMBORSATA PER € 8.900,00
45a	1	Idrica	14340,00	condotta idrica in acciaio Ø150 mm	Viadotto San Silvestro	Alto Calore Servizi	La condotta è ubicata in zona agricola	Occorre	€ 38.900,00	€ 41.550,00	4650,00		RIMBORSATA PER € 44.550,00
46	11	Telecomunicazioni	15800,00	Linea su pali	Galleria artificiale Gesualdo	Telecom	Strada comunale San Silvestro	Occorre	€ 5.900,00	€ 17.950,34		13725,00	CHESTO RIMBORSO 80% PER € 13.725,00
47	11	Servizi comunali	14930,00	Rinnalzamento strada comunale San Silvestro	Galleria artificiale Gesualdo	Comune di Gesualdo	Lunga strada comunale San Silvestro	Occorre	€ 15.900,00	€ 0,00			ATTESA CHIARIMENTI CON ENEL
47 bis	11	Idrica	14930,00	condotta idrica in acciaio Ø105 mm	Galleria artf. G. Silvestro - princ. Gesualdo	Alto Calore Servizi	Lunga la str. com. G. Silvestro	Occorre	€ 0,00	€ 0,00			ATTESA CHIARIMENTI CON ENEL
48	11	Elettricità	14720,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale Gesualdo - princ. Gesualdo	ENEL distribuzione	Linea di B.T. in zona agricola	Occorre	€ 27.800,00	€ 17.622,71		1932,29	CHESTO RIMBORSO PER € 17.622,71
48	11	Servizi comunali	14800,00	Pignolare Comunale (per G. S30)	Silvicolo di Gesualdo	Comune di Gesualdo	Lunga strada campestre. Le quote di riferimento attese dalla mappa D del catasto di Gesualdo.	Occorre	€ 5.000,00	€ 0,00			ATTESA PREVENTIVO ENEL
49	11	Manutenzioni	14800,00	condotta idrica in acciaio Ø115, Ø120, Ø130	Silvicolo di Gesualdo	SRPA	Complesso idrico locale	Occorre	€ 470.000,00	€ 482.000,00			ATTESA FATTURA ENEL
51	11	Telecomunicazioni	15400,00	Telecom	Galleria Artificiale Vals	Telecom	Strada comunale Picoarvato	Occorre	€ 0,00	€ 4.500,00		3000,00	CHESTO RIMBORSO 80% PER € 3.600,00
72	11	Idrica	15600,00	condotta idrica in acciaio Ø 50 mm	Galleria artf. Vals	Alto Calore Servizi	Lunga strada comunale Picoarvato	Occorre	€ 0,000,00	€ 0,00			ATTESA CHIARIMENTI ISOLATO CALORE
73	11	Elettricità	15420,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale Vals	ENEL	In zona agricola, in prossimità della str. com. Picoarvato	Occorre	€ 27.800,00	€ 11.637,47		11637,47	CHESTO RIMBORSO PER € 11.637,47
74	11	Elettricità	16040,00	Linea BT su pali	Galleria artificiale Carifreda	ENEL distribuzione	Strada comunale confonde Carifreda	Occorre	€ 0,000,00	€ 15.000,00		10000,00	CHESTO RIMBORSO PER € 15.000,00
75	11	Telecomunicazioni	16250,00	Linea pali	Galleria Artificiale Carifreda	Telecom	Strada comunale confonde Carifreda	Occorre	€ 0,000,00	€ 5.234,43		4231,50	CHESTO RIMBORSO 80% PER € 4.231,50
76	11	Idrica	16250,00	condotta idrica in acciaio Ø 50 mm	Galleria Artificiale SanPietro	Alto Calore Servizi	Lunga strada comunale confonde Carifreda	Occorre	€ 0,000,00	€ 0,00			ATTESA CHIARIMENTI ISOLATO CALORE
76 bis	11	Idrica	15800,00	condotta idrica in acciaio Ø70	Galleria Artificiale Macchie	Alto Calore Servizi	Lunga strada comunale Macchie	Occorre	€ 0,00	€ 0,00			ATTESA CHIARIMENTI ISOLATO CALORE
77	1	Telecomunicazioni	16500,00	Linea su pali	Galleria Le Macchie	Telecom	Strada comunale Le Macchie	Occorre	€ 0,000,00	€ 2.400,00	2000,20		RIMBORSATA 80% PER € 1.920,20
78	11	Servizi comunali	16700,00	Rinnalzamento strada comunale	Galleria Artificiale Le Macchie	Comune di Grottole	Strada comunale Le Macchie	Occorre	€ 15.000,00	€ 4.522,49			ATTESA CHIARIMENTI E DETERMINA COMUNE
79	1	ESPOSIZIONE	17000,00	Linea BT su pali	Galleria Artificiale Le Macchie	ENEL distribuzione	In zona agricola	Occorre	€ 0,000,00	€ 12.849,28	12001,20		RIMBORSATA PER € 12.849,28
80	1	Elettricità	18900,00	Linea MT su pali	Trincee	ENEL distribuzione	In zona agricola, prima della gal. artf. Prato	Occorre	€ 27.000,00				RIMBORSATA PER € 23.820,00
81	1	Elettricità	17940,00	Linea MT su pali	Galleria Prato che sovrappone la SP 36	ENEL distribuzione	Lunga la SP 36 che sovrappone la gal. artf. Prato	Occorre	€ 18.000,00	€ 30.600,00	3000,00		
83	1	Elettricità	17350,00	Linea MT su pali	Galleria artificiale Prato	ENEL distribuzione	Strada provinciale sp 36	Occorre	€ 0,000,00				
84	1	Elettricità	18400,00	Linea MT su pali	Trincee dopo la gal artf Prato	ENEL distribuzione	zona agricola	Occorre	€ 18.000,00				
87	1	Telecomunicazioni	17750,00	Linea informata	Galleria Artificiale Prato	Telecom	Strada Sp 36	Occorre	€ 24.000,00	€ 10.416,13	10388,87		RIMBORSATA 80% PER € 10.734,90
85	1	Elettricità	18000,00	Linea MT su pali	strada con delimitazione stradale	Accoppiati da ENEL	Lunga la strada comunale Cenerle	Occorre	€ 18.000,00	€ 31.621,47		31601,47	CHESTO RIMBORSO

SSV LIGN-GROTTAMARCA (DA Progr. 6.500 A Progr. 19.950)
 REPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018)
 RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO

sigla lotta	tipo	Procedura finanziaria	Caratteristiche oggetto interferenza	MSB opera in progetto	Protezione	Note	Previsione e realizzazione	Costi individuati previsti nel P.L.	Costi in corso d'opera	Costi RIMBORSATI	Costi in corso di RIMBORSO	STATO	
07	1	1	1	1995,00	Linea MT su pali	Linea	costruzione	Lungo la strada intercomunale in prossimità del bosco progr. 16.058	Occorre				PER € 11.031,47
11	1	1	1	10222,00	Linea MT su pali di 23.000 V	Ristrutturazione con ripulitura della Cabina Ad Tensione 22.30	MSB, Distribuzione	in zona agraria	Occorre	€ 18.000,00	€ 23.117,36	3310,36	CHESTO PASORDO PER € 22.117,12
07 bis	1	1	1	10222,00	condotta aerea in acciaio di 50 mm	Risale	Alto Cabine Servizi	Lungo strada comunale Poggi-Arcopardo	Occorre	€ 0,00	€ 0,00		ATTESA DEFINIZIONE COM ENTE
08	1	1	1	18179,00	Linea MT su pali	Risale	ENEL Distribuzione	In zona agricola. La quota terreno si riferisce al punto sito in corrispondenza del palo del risale.	Occorre	€ 9.000,00	€ 0,00		ATTESA CHIAMATA ENTE
09	1	1	1	10951,00	Ristrutturazione strada comunale	Comune di Grottole	Comune di Grottole	Strada provinciale 36	Occorre	€ 15.000,00	€ 0,00		ATTESA DEFINIZIONE COM ENTE
09	1	1	1	18951,00	Linea aerea	Comune di Grottole	Telecom	Strada Sp 36	Occorre	€ 24.000,00			ATTESA AUTORIZZAZIONE RUP
09 bis	1	1	1	18951,00	Linea aerea	Comune di Grottole	Telecom	Strada Sp 36	Occorre	€ 0,00	€ 21.227,47		
10	1	1	1	14004,00	condotta aerea in acciaio di 50 mm	Comune di Grottole	Alto Cabine Servizi	Strada Sp 36	Occorre	€ 9.000,00	€ 0,00		ATTESA PREDEFINIZIONE ENTE
11 bis	1	1	1	18951,00	condotta aerea in acciaio di 50 mm	Ristrutturazione dell'intersezione	Alto Cabine Servizi	Strada Sp 36	Occorre	€ 0,00	€ 0,00		ATTESA PREDEFINIZIONE ENTE
								€ 1.302.400,00	€ 1.115.300,07	€ 206.004,42	€ 197.314,79		

LEGENDA	
	Autorizzate 1° Lotto Funzionale
	Autorizzate 1° Lotto Costruttivo
	Autorizzate 3° Stralcio
	Previste 1° Lotto Funzionale
	Previste 1° Lotto Costruttivo
	Previste 3° Stralcio



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 36

2a.9) LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA'

Particolare cura è stata posta nella informativa al pubblico e nella ottimizzazione dei rapporti con Enti locali ed Amministrazioni in genere.

Periodicamente, ma almeno tre volte l'anno, viene pubblicata a carico del Concessionario una Brochure recante ogni informazione utile sullo stato dei lavori e della programmazione concernente la Viabilità Lioni – Grottaminarda riportando gli aggiornamenti più significativi sulla base redatta a cura di questo Ufficio.

Oltre ad ogni informazione economico-finanziaria vengono forniti elementi tecnici, grafici a colori, prospetti e considerazioni anche specifiche e non solo genericamente divulgative.

Copia aggiornata della stessa viene allegata alla presente Relazione.

Il sottoscritto personalmente interviene inoltre ad ogni incontro o convegno ove sia invitato per fornire direttamente elementi e notizie conoscitive.

Purtroppo capita che speculazioni e strumentalizzazioni giornalistiche deformino a volte i fatti, reali e dimostrati, così come dichiarazioni e posizioni politiche hanno stravolto la verità dimostrabile invece per tabulas.

Esigenze diverse portano poi evidentemente a pubblicare affermazioni del sottoscritto in modo distorto, riportando osservazioni sotto forme di critiche o di allarmi.

Interesse di questo Ufficio, estraneo ad ogni collocazione diversa da quella istituzionale delegata, è stato ed è l'interesse pubblico, al di là di ogni replica.

Tant'è che nessun rilievo è stato mai mosso dalle competenti Autorità e nessun contenzioso sostanziale è stato mosso al Commissario o ai suoi collaboratori diretti, di alta qualità professionale nei rispettivi ruoli.

Al fine comunque di garantire la massima trasparenza e le più valide garanzie per l'Amministrazione, è stato sottoscritto un "Protocollo di Legalità" nel marzo 2015 con la Prefettura di Avellino, e per tutti i contraenti lavori e/o incarichi professionali è obbligatoria la sottoscrizione di un "Patto di Integrità" recante specifici impegni nella materia.

Le presenze in cantiere di mezzi ed uomini vengono regolarmente registrate con i relativi itinerari e tempestivamente sono prodotti i POS.

Ovviamente sono installati tutti i cartelli sui lavori in posizioni idonee e sono demandati ai RUP dei singoli lavori i monitoraggi previsti, così come sono indette tutte le Conferenze dei Servizi ove previste.



I cittadini possono adire l'Ufficio Commissariale e contattare il sottoscritto direttamente in ogni momento.

Le riunioni importanti presso l'Ufficio vengono sempre verbalizzate.

I Decreti di specifica valenza vengono pubblicati sulla GURI (decreti definitivi di esproprio; consegne definitive; esiti gare ecc.).

La tracciabilità dei pagamenti viene dichiarata dagli aventi causa a tutti i soggetti interessati alla gestione dei lavori.

L'Ufficio opera inoltre prima di ogni pagamento le previste verifiche ex Equitalia e la verifica della vigenza di tutti i DURC.

Opera inoltre a campione i controlli sulle quietanze ex art. 118 D.Lgs. 163/06.

Controlli vengono effettuati anche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Le transazioni per questioni espropriative vengono sottoscritte alla presenza di chiunque abbia interesse ad assistere.

Delle Relazioni al MiSE, al MIT, all'ANAC, al Parlamento, alle Commissioni Parlamentari, alla Corte dei Conti si è detto. Nel complesso coprono un numero di almeno 10 all'anno, con grave dispendio di energie per l'Ufficio date la loro consistenza e vastità.

Ogni anno viene inoltre richiesta tramite i RUP ed i Provveditorati la documentazione antimafia per appaltatori e concessionari.

Tale disposizione commissariale garantisce quindi la permanenza dei requisiti.

All'attualità risultano due soli accessi agli atti avanzati rispettivamente da dipendente del Provveditorato di Napoli (non perseguito nei fatti dal richiedente nonostante i solleciti), e dal Direttore dei Lavori della Viabilità Lioni - Grottaminarda proprio per la chiamata in causa da parte di altri dipendenti del medesimo Provveditorato.

Sul discutibile comportamento di detti funzionari il sottoscritto ha già detto in passato.

Alla richiesta del sottoscritto di firmare le presenze in cantiere da parte di Direttori Operativi e di Ispettori di Cantiere permane al momento un rifiuto da parte del medesimo Provveditorato.

Tutto quanto sopra è ampiamente documentabile.

A tal proposito si segnala che la corrispondenza in arrivo viene protocollata ancor prima che sia sottoposta alla visione del sottoscritto in modo che mai nulla possa sfuggire all'archiviazione.

Ogni unità di corrispondenza è riportata in registri in ordine cronologico con tutti i riferimenti essenziali e conservata in cartaceo.

I numerosi contenitori relativi sono suddivisi in posta in entrata e posta in uscita, ciascuno contenente circa 500 unità. In sede di trasferimento tali documentazioni rigorosamente ordinate dovranno essere oggetto di specifica verbalizzazione.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/08 art. 86

2a.10) I CONTENZIOSI (Viabilità Lioni – Grottaminarda)

Ben diversa è la situazione dei contenziosi nell'ambito dei lavori della Lioni – Grottaminarda rispetto alla situazione esistente per i lavori ex art. 32 L. 219/81 di cui allo specifico paragrafo.

Con riferimento ai lavori in argomento occorre poi distinguere tra i contenziosi in materia espropriativa o promossi comunque da terzi e quelli concernenti la realizzazione delle opere.

Per i primi è necessario sottolineare che esiste una clausola contrattuale generale di manleva, ma nei contratti con questo Ufficio è previsto anche che tutti gli oneri legali per contenziosi nel campo espropriativo restano a carico del Concessionario, cui è delegata l'attività ablativa, ivi comprese le spese peritali.

Trattasi di un onere assai significativo ove si consideri la varietà delle situazioni e le migliaia di particelle interessate.

Per quanto concerne i lavori, esistono all'attualità pesanti riserve iscritte dal Concessionario Infr.Av. per circa 30ME riferentisi essenzialmente alla presunta disorganizzazione operativa del personale del Provveditorato di assistenza alla D.L. ed a ritardi amministrativi dello stesso Provveditorato.

Occorre in proposito confermare che, almeno inizialmente, sono state evidenti effettive lacune ed assunzioni di posizioni, a giudizio del sottoscritto, anomale (si prenda ad esempio l'iniziativa di contenzioso al TAR contro il Concessionario, addebito allo Stato non soddisfatto grazie all'intervento Commissariale, ovviamente contrario all'iniziativa).

A fronte di tali riserve il sottoscritto ha proposto transazione capace di annullare completamente le pretese economiche (forse, pur se in minima parte, non pretestuose) del Concessionario a fronte del riconoscimento di una proroga (a giudizio di chi scrive del tutto legittima) e di una modalità di contabilizzazione sempre a giudizio di chi scrive del tutto coerente con i contratti.

Si è tuttora in attesa del parere definitivo dell'ADS di Napoli.

Per inciso la stessa ADS ha demandato all'AGS parere circa la valenza della convenzione con il D.L. risalente al marzo 2010.

Sempre nell'ambito dei lavori in oggetto è stato quindi mosso un contenzioso – nei confronti del Provveditore e del sottoscritto – da parte dei funzionari del Provveditorato assegnati al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tutta la documentazione è agli atti ed appare al sottoscritto davvero sorprendente non solo la motivazione che ha mosso i ricorrenti, ma anche la sostanza del ricorso, esauritosi peraltro nel suo corso.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

2a.11) LE TRANSAZIONI

Nell'ambito della Viabilità Lioni – Grottaminarda in argomento non sussistono contenziosi nei confronti del Commissario, ma solo riserve (identiche) da parte del Consorzio INFR.AV. sul 1° e sul 2° stralcio del 1° lotto di competenza, ed arbitrati per questioni espropriative.

In relazione a tali arbitrati occorre ribadire che le particolari ed originali condizioni contrattuali stabilite dal Commissario ed accettate, pongono a carico del Concessionario delegato agli espropri la cura e l'onere delle spese amministrative, legali ed arbitrali, e pertanto non rivestono alcun interesse – sotto tale profilo – per l'Amministrazione.

Piuttosto va rilevato che le valutazioni indennitarie, approvate dal sottoscritto, sono risultate confermate nella effettiva sostanza ed entità dagli esiti arbitrali e corrispondono, grazie alle procedure seguite, mediamente ad oltre la metà di quanto riconosciuto e pagato dall'ANAS al mq. nella stessa zona (variante di Grottaminarda).

Per quanto concerne invece le riserve iscritte dal Consorzio Infr.Av. le stesse concernono essenzialmente una lamentata inefficienza della SUA (Provveditorato OO.PP. avvalso) sia in termini amministrativi (autorizzazioni al subappalto, interpretazione di norme ecc.) che tecnici (ritardi nella contabilità ecc.), l'assenza del collaudatore statico¹⁾ per vari mesi, le conseguenze della vacatio gestionale verificatasi nell'anno 2014 per la cessazione dell'Ufficio Commissariale, poi revocata per legge ecc.

Tali riserve, in parte non del tutto infondate a giudizio di chi scrive, hanno raggiunto l'importo di circa 30 milioni di Euro.

Problematiche anche diverse hanno poi rallentato i lavori per ragioni da ritenere almeno in parte obiettive, capaci di ritenere possibile una proroga.

Combinando le due questioni, il sottoscritto ha quindi proposto una transazione al Concessionario che, a fronte di una proroga (su basi condivise) e ad una contabilizzazione dei l

¹⁾ In proposito si segnala che il sottoscritto aveva rigettato le dimissioni dell'originario collaudatore e preso atto delle stesse solo ad intervenuta nomina dell'attuale.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

2a.12) I PRINCIPALI PARERI CONSULTIVI **v. anche tab. allegata sub. 2b.8)**

Purtroppo come già ripetutamente segnalato e lamentato, dall'anno 2013 è stata tolta all'Ufficio Commissariale ogni possibilità di fruire di una consulenza giuridica diretta, consulenza che negli anni precedenti e ad un costo assolutamente contenuto, aveva dato prodotti di alta qualità.

La riduzione miope se non cieca della dotazione per funzionamento (v. L. 289/02, c.3, Finanziaria 2003) da 300.000 €/anno a 100.000 €/anno ha impedito all'Ufficio, che è del tutto autonomo nella gestione anche dei consumi e degli acquisti, di avvalersi di una preziosa, diretta e tempestiva collaborazione (documentata da decine di atti e pareri).

Tale riduzione ha peraltro impedito la regolare manutenzione delle attrezzature acquistate con danni conseguenti.

A ciò si aggiungano due considerazioni:

- Il sottoscritto aveva già limitato le spese da 300mila €/anno a 200.000 (realizzando economie per oltre 100mila €/anno) e restituendo in totale a bilancio MiSE oltre un milione di Euro.
- Le risorse per 100.000 €/anno inoltre devono essere recuperate su apodittiche economie che lo stesso Commissario deve operare sulle somme destinate dalla L. 289/02 ai lavori, anziché su fondi Ministeriali.

Tali situazioni rendono particolarmente arduo e complesso il compito del Commissario che pertanto per le questioni di media importanza opera direttamente alla loro soluzione sulla base delle conoscenze, dell'esperienza, dello studio, ma per quelle di valenza più importante deve ricorrere alle Avvocature, all'ANAC o altri.

I riscontri, ove intervengano, comportano tempi in genere assai lunghi (vari mesi) difficilmente compatibili con le esigenze Commissariali.

Le difficoltà che ne derivano, anche solo in termini di certezze, sono fin troppo evidenti.

All'attualità si è in attesa di due importanti pareri consultivi da parte dell'AGS (questione D.L. sul secondo lotto di viabilità) e dell'ADS di Napoli (bozza transazione Infr.Av. di cui al relativo paragrafo).

Si è inoltre in attesa di parere della Ragioneria dello Stato su osservazioni dell'UCB, a giudizio del sottoscritto qualificabili come accanimento burocratico.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/09 art. 86

2a.13) INCENTIVO

Lunga e travagliata è stata la vicenda dell'incentivo ex artt. 92 e 93 D.Lgs. 163/06 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24.6.14 convertito in L. 11.8.14 n. 114.

Interpretazioni anche autorevoli sono risultate come noto contraddittorie ed ovunque si sia voluto rispettare un criterio di definitiva chiarezza, la liquidazione ed il pagamento dell'incentivo sono rimasti bloccati.

Anche il sottoscritto ha inteso conformarsi alla massima chiarezza, evitando comunque l'ipotesi di ogni possibilità di conguaglio a recupero da parte dell'Amministrazione.

Ma in tale fase non è rimasto inerte, avendo invece chiesto pareri sia all'ANAC che all'ADS di Napoli (due richieste).

Tali pareri (pure essi non del tutto esaustivi), regolarmente comunicati al Provveditorato OO.PP. sede di Napoli, non risultavano sufficienti a calmare le disordinate reazioni dei funzionari di tale sede addetti ad attività di supporto direzionale dei lavori, che giungevano a chiedere le dimissioni più improbabili e, a giudizio di chi scrive, più irresponsabili.

A tutto ciò aggiungasi la Circolare MIT (cd "Chiovelli") n.prot.8544 del 18.2.16 che addirittura (condividendo un parere dell'ADS di Bari) prevedeva il pagamento dell'incentivo ad approvazione del collaudo, confondendo una obbligazione di mezzi con una di risultato.

Soltanto con la circolare MIT n. 36196 del 10.7.18 sembra che principi di concretezza e legittimità siano stati reintrodotti, confermando peraltro quelli essenziali sempre esposti dal sottoscritto, ed a seguito di tale circolare si sta ora procedendo.

Vedasi l'analogo paragrafo nel seguito con riferimento ai lavori ex art. 32 L. 219/81.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

2a.14) LE RELAZIONI SULL'ATTIVITA'

L'Ufficio Commissariale, a partire dal mese di giugno 2003, ha prodotto le seguenti relazioni e rendiconti:

Al MiSE (inizialmente GAB poi DGIAl)	Alla Corte dei Conti	Al Parlamento, Commissioni, MIT, ANAC
112 relazioni con cadenza bimestrale	14 relazioni annuali, a partire dall'esercizio 2014 a tutto il 2017	2 semestrali e 1 di fine anno, per un totale dal 2016 di 8 compresa la presente

Su richiesta della Regione Basilicata sono state prodotte nel corso degli anni Relazioni di aggiornamento sui lavori.

All'atto delle richieste alla Regione Campania e al MIT di acconti ed anticipazioni, sono state regolarmente prodotte Relazioni di aggiornamento, brochure, tabelle relative a spese per SAL e SAE ecc.

Commissario ad Acta - Legge 27.1											
Progetti ex art. 32 L. 219/B1 (trasferimenti da c. 1 e c.2 art. 86 L. 289/02 e											
Suddivisione in lotti	Progetti Alinari B	Progetti Alinari A	num. progetto	PROV	DESCRIZIONE	CONCESSORIO	Dotazione finanziaria				
							Coste totali progetti revocati ex c.2 art. 86	Importi di affidabilità in lire	Importo versato sulla c/c 3250	Errogazioni	
1		1	39 60	6001	F2	Infrastrutture N.I. Balzano e Arcadedotto	Consorzio per il Nucleo di Balzano			190.769,06	0,00
2		2	39 60	6002	P2	N.I. Saragone	MALTAURO			5.437,51	0,00
3		3	39 48	6003	SA	Infrastrutture N.I. Baccino	Consorzio Infrastrutture Baccino S. Gregorio Magno		15.238.426,48	5.039.976,62 87.150,56 10.112.340,30	1.342.387,66
4		4	39 40	6003/2	SA	Approvigionamento Idrico A.I. Baccino - Pozzi Baccino	Consorzio Infrastrutture Baccino S. Gregorio Magno			2.023.199,06	2.311.376,22
5		5	39 48	6004	AV	Infrastrutture N.I. Calabritto	COMSUD			5.478,92	
6		6	39 48	6005	AV	Infrastrutture N.I. CALAGORIO	INCOMER			0,00	
7	1		39 40	6006	AV	Infrastrutture N.I. Calli	ICLA Costruzioni Gestioni SpA in Liquidazione			3.710.587,83	1.649.911,02
8		7	39 40	6007	SA	N.I. Costantini	COMPA			192.973,31	87.465,01
9		8	39 40	6008	AV	Infrastr. Nucleo Conca della Campagna	GLIT			3.648,53	
10		9	39 60	6009	P2	N.I. ISCA PANTANELLE	PIZZAROTTI			0,00	
11		10	39 40	6010	AV	Inf. N.I. Lioni - Nave - S. Angelo	INFRASUD			38.008,86	
12		11	39 48	6011	AV	Infrastr. N.I. Mirra de Santis	GLIT			99.952,44	
13	2		39 40	6012	AV	Infrastrutture N.I. di Nerico	ICLA Costruzioni Gestioni SpA in Liquidazione			1.138.356,19	67.465,12
14		12	39 40	6013	SA	Infrastrutture N.I. di Oleveto Citra	COMSUD			0,00	
15		13	39 48	6014	SA	Infrastr. N.I. PALOMONTE brevetta di collegamento	COMPA			0,00	
16		14	39 48	6015	AV	Infrastrutture N.I. di Perrario	INFRASUD			17.132,50	
17		15	39 48	6016	AV	Infrastrutture N.I. S. MARCO sul CAIORE	INCOMER			0,00	
18		16	39 60	6017	P2	Inf. N.I. S. Nicola di Mell + F.2.	PIZZAROTTI			44.894,07	
19		17	39 60	6018	P2	Infrastrutture N.I. di Tilo	MELANERO - VIOGGIANO			0,00	
20		18	39 60	6019	P2	Infrastrutture N.I. Valle Vialba	PIZZAROTTI			20.141,82	
21		19	39 60	6020	P2	Infrastrutture N.I. di Vigliano	MELANERO - VIOGGIANO			0,00	
22		20	39 48	6021	AV	Infrastr. Nucleo Monte de Salento	GLIT			32.078,41	

2.2002 n. 289 art. 86 e D. M. 21.12.2005

d a seguito del D.M. 21.12.2005) + nuova opera "Viabilità Lioni - Grottaminarda"

Chiusura concessione	Chiusura progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concluso - Aperto	Attività residue (in Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto				
					Descrizione consegna	Sito destinataria	Tipologia consegna	Per esecutori	Altra natura			
X 542	05/01/2009	X 580	07/10/2009	198.709,06	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 158 del 27/99			
X 5449	03/11/2015	X 1457	20/11/2015	5.437,31	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 158 del 27/99 + 902/95			
X 5525	15/05/2016	X 1543	09/06/2016	784.695,52	C	1		gradi di accesso al sentinale Ibrico	Comune di Buccino	Consegna provvisoria con verbale in data 10/03/1997		1
								Infrastrutture A.I.	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 158 del 27/99		
								Campo PNCI	Regione Campania	Consegna definitiva in data 12/07/98 con approvazione callato Irate-Approvato con Decreto Commissariale n.254 del 12/07/98		
								Condotta idraulica - Inveicolo. Condotta a gravità	Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n. 1287 del 25.4.2015 - GIURI n.178 del 31.7.2015		
X 1000	22/12/2011	X 1583	13/04/2012	91.656,65	C	1		Regione Campania	Consegna definitiva in data 08/01/99 con approvazione callato Irate-Approvato con Decreto Commissariale n.632 del 01/12/99			
X 547	30/06/2000	X 583	06/10/2000	5.475,92	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
X 1454	10/11/2015	X 1485	15/12/2015	0,68	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
	Revocato				A	1	in corso completamento esecutori	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99	31	2	
					A	1	Conteggio per esecutori (Ditta Di Mezza)	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 159 del 27/99			
X 633	19/01/2010	X 630	16/02/2010	3.648,53	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
X 324	20/12/2000	X	(revoca decreto)	0,68	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 27/99			
X 367	01/12/2006	X 479	10/10/2009	28.005,86	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
X 633	19/01/2010	X 630	16/02/2010	99.952,44	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
X	Revocato				A	1	in corso completamento esecutori	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99	2	1	
X 481	26/10/2000	X	D.M. 30 del 7.4.2003	0,68	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99			
X 577	10/08/2007	X	D.M. 26 del 26.2.2004	0,68	C	1		Infrastrutture N.L. di Polcevera	Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99		
								Diretta di collegamento A.L. Polcevera a valico Stigiano degli Abissi	Provincia di Salerno	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.3 del 18/06/93 - GIURI n.228 del 01/09/93		
								Selezione sul percorso autostradale di Scigliano-Potenza e impianto illuminazione	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.5 del 31/11/93 - GIURI n.288 del 09/11/93		
X 636	27/12/2010	X 640	10/02/2010	17.132,50	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
					A	1	in corso completamento esecutori	Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
								Strada di collegamento tra la SP 38 e la strada di accesso tra l'area FIP e l'A.L. di S. Maria sul Calore (loc. Piani)	Comune di S. Maria sul Calore (AV)	Consegna definitiva con verbale SPA/SP Approvato con Decreto Commissariale n. 383 del 08/05/98 - GIURI n.230 del 27/10/99		
X 817	07/02/2011	X 842	26/02/2011	44.894,07	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 156 del 27/99			
X 5482	10/12/2015	X 5486	19/05/2016		C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 158 del 27/99			
X 1320	20/12/2014	X 5332	20/04/2015	26.141,52	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 158 del 27/99 - Decreto Commissariale n. 588 del 16.10.2009 (Integraz.)			
	Concessione deceduta - D.D. 233 del 2.11.1990	X 5483	08/12/2015	0,68	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 158 del 27/99 - Decreto Commissariale n. 588 del 16.10.2009 (Integraz.)			
X 651	31/03/2010	X 657	20/04/2010	32.078,41	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			

Subdivisione in lotti	Progetti Allegato B	Progetti Allegato A	num. progetto	PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIARIO	Dotazione finanziaria					
							Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 36	Importi di suddivisione in lotti	Importo versato sulla c/c 3250	Erogazioni		
23		21	16 00	6051	PZ	Basilicata Baraglio	MALTAURO			655.073,96		
24		22	16 00	6052	SA	Costr. - Stazione FF.SS.	COMIRA			556.115,16		
25	3		29 00	6053	SA	viaggio Fondo Valle Sale I Loto	LUMENA			7.223.625,29		
26		23	16 00	6054	SA	Fondo Valle Sale II Loto	COMRID			1.696.751,82		
27	4		33 00	6055	AV	Fondo Valle Sale III Loto svincolo Maronele	INFR.AV.			6.507.310,89		
28		24	16 00	6056	PZ	Isc - Tin Bionca	PIZZAROTTI			598.272,70		
29		25	16 00	6057	PZ	Studio di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Chianca in Località Merico	ICLA Contratti Generali Spa in Liquidazione					
30	1		16 00	6057/1	PZ			5.386.734,00			4.824.783,49	
31	2		16 00	6057/2	PZ			22.557.348,45		35.778.697,59	20.036.869,82	
32	3		16 00	6057/3/1	PZ			21.484.499,77			19.604.311,68	
33	4		16 00	6057/3/2	PZ			7.415.648,67			63.230,62	
34	5		16 00	6057/2F	PZ			1.845.526,22			42.643,37	
							costo totale	60.788.671,29				
							importo sovvenibile da accantonare necessario per il completamento dei lavori		24.935.973,81			
35		26	16 00	6058	AV	Strada N.L. Usini Puzosa (Maco - S. Angelo)	INFRASUD			1.349.655,01		

Cl. numero concessione	Cl. data concessione	Cl. numero progetto	Cl. data progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Concorso - Aperta	Altre note (in Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto		
							Destinazione categoria	Ente destinataria	Tipologia consegna	Per appalti	Altra natura	
X 9901	22/12/2011	X 1070	04/07/2012	55.073,90	C	1		ANAS	Consegna definitiva con Decreto Comissariale n. 43 del 11/03/04 - GURI n. 77 del 14/04			
X 1157	20/03/2011	X 1172	10/06/2012	473.047,37	C	1		Provincia di Salerno	Consegna definitiva con Decreto Comissariale n. 1 del 18/03 - GURI n. 211 del 15/09			
					A	1						
X 440	20/04/2009	X	(unico decreto)	3.548.751,82	C	1		Spazio Fondo Valle Sele II Lotte	ANAS	Consegna definitiva con Decreto Comissariale n. 25 del 14.04 - G.U.R.I. n. 126 del 21/04		1
								Costruzione a valenza comunale	Comune di Calabria	Consegna definitiva 14/12/01		
					A	1	Costruzione non Comune di Caposelle (An)	Spazio Fondo Valle Sele II Lotte + trincee Montedonati	ANAS	Consegna definitiva con verbale del 24/01/06 approvato con Decreto Comissariale n. 157 del 03/02/04 - GURI n. 40 del 24/02/09		
								Viabilità concessa all'asse principale	Comune di Teora	Consegna definitiva con verbale del 28/01/00 approvato con Decreto Comissariale n. 158 del 07/02/00 - GURI n. 60 del 11/02/00		
								Viabilità concessa all'asse principale	Comune di Caposelle	Consegna definitiva con verbale del 28/01/00 approvato con Decreto Comissariale n. 159 del 07/02/00 - GURI n. 60 del 11/02/00		
								Viabilità concessa all'asse principale	Comune di Lioni	Consegna definitiva con verbale del 28/01/00 approvato con Decreto Comissariale n. 160 del 07/02/00 - GURI n. 60 del 11/02/00		3
								Viabilità concessa all'asse principale	Comune di Calabria	Consegna definitiva con verbale del 28/01/00 approvato con Decreto Comissariale n. 161 del 07/02/00 - GURI n. 60 del 11/02/00		
								Viabilità ampliamento della ex S.S. 165	Regione Campania	Consegna definitiva con verbale del 12/09/00 approvato con Decreto Comissariale n. 207 del 15/09/00 - GURI n. 243 del 10/10/00		
X 899	19/01/2011	X 838	25/02/2011	514.611,79	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Comissariale n. 13 del 21/03 - GURI n. 294 del 22/03/03			
		X 1047	25/03/2012	25.073,54	C	1						1
					A	1	attività varie amministrative	Traffico da prog. 0+00 a prog. 1+750	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudata - Decreto Comissariale n. 1276 del 10.7.14		40
								Traffico da prog. 1+750 a prog. 5+000	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con approvazione collaudata - Decreto Comissariale n. 1276 del 10.7.14		
								Statuto per Pescopagano	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collaudata - Decreto Comissariale n. 1276 del 10.7.14		
								Statuto per Pescopagano	Comune di Pescopagano	Consegna definitiva con approvazione collaudata - Decreto Comissariale n. 1276 del 10.7.14		
					A	1		Traffico da prog. 5+000 Strada Provinciale a prog. 5+450 Strada Rapone	Comune di Isole Lucane e Comune di Castelgrande	Consegna definitiva con approvazione collaudata - Decreto Comissariale n. 1784 del 4.12.17		399
					A	1		Ingresso di illuminazione in galleria artificiale alla prog. km. 0+100 circa	Comune di Isole Lucane e Comune di Castelgrande	Consegna definitiva con approvazione collaudata - Decreto Comissariale n. 1897 del 16.12.18		87
					A	1	Lavori in corso					
					A	1	Lavori in corso					
X 1599	28/02/2010	X 9007	03/09/2012	1.341.655,61	C	1		Strada S.L. Loris Piarini (Rocca - S. Angelo)	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con Decreto Comissariale n. 53 del 20/12/03 - GURI n. 57 del 23/1/04		
								Strada per S. Angelo del Lombardi	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 10/12/03 approvato con Decreto Comissariale n. 32 del 16/12/03 - GURI n. 6 del 8/1/04		
								Area in località "Selvatico" (part. le 27) - 4/10-4/20-5/50	Comune di S. Angelo del Lombardi	Consegna definitiva con verbale del 12/1/04 approvato con Decreto Comissariale n. 39 del 14/1/04 - GURI n. 15 del 23/1/04		

Suddivisione in lotti	Progetti Allegati B	Progetti Allegati A	num. progetto	PROV.	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria					
							Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 95	Importi di suddivisione in lotti	Importo versato sulla os 3250	Erogazioni		
36		27	39	60	6059	PZ	Melli - Area industriale	PIZZAROTTI			1.197.629,85	
37		28	39	60	6062	PZ	Vialella Mare Lucano - Baragiano Scala	IGLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	Versamento iniziale 5.269.928,00 + 8.793,79 residuo professionisti	5.267.167,09	5.279.721,79	4.462.152,32
38	0		39	60	6062/2	PZ			472.551,99			368.634,34
							continuato	5.740.858,99				
							importo rinvierito da economie necessarie per il completamento dei lavori			461.337,38		
39		28	39	40	6063	AV	Colli Otantina	IGLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	Versamento iniziale 2.571.728,59 + 52.557,65 professionisti	2.561.864,38	2.624.286,24	1.903.164,40
							continuato	2.561.864,38				
40		30	39	40	6064	AV	Colli Otantina (sviluppo)	IGLA Costruzioni Generali SpA in Liquidazione	versamento iniziale 702.471,33 + 50.000,00 residuo professionisti	1.336.634,76	752.471,33	956.715,11
							importo rinvierito da economie necessarie per il completamento dei lavori			564.183,39		
							sviluppato	1.336.634,76				
41		31	39	40	6066	AV	Stadi Otantina S. Mingo	BICOMR			267.449,90	
42		32	39	60	6067	PZ	Viale di Vitulva - Otantina	PIZZAROTTI			2.790.718,85	

Chiusura concessione	Chiusura progetto	Erezioni autorizzate di progetto	Stato del progetto: Chiuso - Aperto	Attività espletate in Lavori in Corso	Consegna opere			N. Transizioni sul progetto							
					Definizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per							
								esproprio	altra natura						
X 659	28/04/2010	X 477	13/07/2010	327.396,57	C	1	Spazio H.I. Mott - Abitato Mott - Superstrada Caserta/Potenza	Provincia di Potenza	Consegna definitiva n. 8511/12000						
							Centrale a valvole centrali	Comune di Mott	Consegna definitiva con Decreto Comunitario n. 49 del 20/10/04 - GURI n. 28 del 4/2/04						
Revocata	X 1048	23/03/2012	6.793,71	C	1	Viabilità secondaria Cavalcavia in lot. Ponte Diaccia	Comune di Maro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Comunitario n. 565 del 6/3/2011	72	1					
						Viabilità secondaria	Comune di Maro Lucano	Consegna definitiva con verbale in data 20.7.2009 approvato con Decreto Comunitario n. 504 del 4.8.2009 - GURI n. 281 del 31.8.2009							
						Opere completamento strada Bareglione-Marò Lucano e Opere impianto bustelli provvisoria di viabilità su SS 7 Appia	Provincia di Potenza e Comune di Maro Lucano	Consegna provvisoria con verbale in data 20.7.2009 approvata con Decreto Comunitario n. 562 del 4.8.2009							
						Rotatoria di ingresso al Km. 420+600 sulla SS. 7	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Comunitario n. 593 del 18.7.2011							
						Viabilità secondaria relative alla Rotatoria d'ingresso al Km. 420+600 sulla SS. 7	Comune di Maro Lucano	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Comunitario n. 593 del 18.7.2011							
			A	1	Attività civile amministrativa	Collegamento viario tra la strada Marò Lucano-Baraglione e la S.S. 940/Dir.	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreto Comunitario n. 516 del 21.1.2012							
Revocata	X 5412	27/07/2015		C	1	Stade Cello-Catania	Provincia di Anzio	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreti Comunitari n. 338 del 18.10.2011 e n. 1077 del 2.7.2012	79	1					
						Viabilità secondaria	Comune di Calvi	Consegna definitiva con verbale in data 25.8.2010 approvato con Decreto Comunitario n. 128 del 15.8.2010 - GURI n. 233 del 8.9.2010							
Revocata	X 1851	03/04/2012	24.433,45	C	1	Sincelo strada collegamento abitato di Calvi con la SS. 408 Catania - Asse principale	ANAS	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreti Comunitari n. 823 del 2.8.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1059 del 14.5.2012	9	1					
						Rampic di accesso opere relative allo svincolo	Provincia di Anzio	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreti Comunitari n. 823 del 2.8.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1059 del 14.5.2012							
						Viabilità secondaria	Comune di Calvi	Consegna definitiva con approvazione collettiva Decreti Comunitari n. 823 del 2.8.2011 - GURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 1059 del 14.5.2012							
						Viabilità della bretella di collegamento tra la sinicolo per Calvi e l'area industriale di Hecio	Consorzio ASI di Anzio	Consegna definitiva con Decreto Comunitario n. 1258 del 15.1.2014 - GURI n. 181 del 6.8.2014							
X 886	09/05/2011	X 324	11/02/2011	48.396,22	C	1	Strada Ottolina S. Mango	Provincia di Anzio	Consegna definitiva con Decreto Comunitario n. 49 del 15/7/04 - GURI n. 185 del 10/9/04		1				
							Sovrapasso prog. 2191 - 2552 S12 + sottopasso e viabilità secondaria	Comune di San Mango sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 9/2/05 approvato con Decreto Comunitario n. 30 del 15/2/05 - GURI n. 52 del 4/3/05						
							Sottopassi prog. 3830 + 8140	Comune di Castelvetere sul Calore	Consegna definitiva con verbale del 15/02/05 approvato con Decreto Comunitario n. 67 del 24/05 - GURI n. 105 del 09/6/05						
							Viabilità secondaria prog. 0.80 + 113,40	Comune di Chiusano San Demetrio	Consegna definitiva con verbale del 7/2/05 approvato con Decreto Comunitario n. 59 del 15/2/05 - GURI n. 51 del 3/3/05						
							Sovrapassi alla prog. 3830,31 e 512 + Boretta A.I. S. Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 14/02 approvato con Decreto Comunitario n. 58 del 1/4/05 - GURI n. 107 del 10/05/05						
											Strada di collegamento tra la S.P. 30 e r.l.1. di S. Mango sul Calore	Provincia di Avellino	Consegna definitiva con verbale del 16/10/08 approvato con Decreto Comunitario n. 600 del 3/11/09 - GURI n. 282 del 30/3/08		
X 888	24/5/2011	X 888	10/07/2011	713.368,99	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Comunitario n. 44 del 16/4/04 - GURI n. 101 del 30/4/04						

Sussidiarietà in base	Progetti Allegati B	Progetti Allegati A	NOME progetto			PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			
									Costo totale progetti revocati ex c.2 art. 16	Importi da suddividere in tutti	Importo versato sulla cc 3250	Erogazioni
43		23	39	40	6088	SA	F.V.S. - Oleveto Citra	CONFRA			480.247,22	
44		24	39	00	6089	PZ	Rapone - Chetivio - Maro Lenzano	ICLA Costruttori Generali SPA in Liquidazione			4.999.481,94	
45		25	39	66	6070	PZ	Rapone - Oleveto - Vilibate	PIZZAROTTI			58.550,12	
46		26	39	46	6071	AV	Circuito ferroviario S. Mango sul Calore	INCOMER			101.011,85	
47		27	39	46	6075	SA	F.V.S. Ospedale Oleveto Citra	CONFRA			1.132.341,72	
48		28	39	00	6076	PZ	Balvano Bacchetta Barigliano	MALTAURO			583.567,86	
49		28	39	00	6076/2	PZ	Balvano Bacchetta Barigliano II (99) (L. 286/95)	MALTAURO			25.914,78	
50		28	39	00	6077	PZ	Isoa - Pella	PIZZAROTTI			1.035.047,59	
51	5		39	00	6077/2	PZ	Isoa-Pella II lotto	PIZZAROTTI			5.951.922,02	
52		41	39	48	6080	SA	Siloio ferroviario N.I. di Baccinò	Consorzio Interregionale Bacchio S. Orsola Migre			636.401,58	
53		42	39	48	6091	AV	Acq. principale Alta Ispide	SIAM PROGETTI			1.916.417,53	
54		43	39	48	6094	SA	Acq. Area Industriale di Ecochro	CONSUD			466.468,56	
55		44	39	48	6095	AV	Acq. Isola II Valli/Merobianchi	SIAM PROGETTI			208.588,07	
56		45	39	48	6096	SA	Condotta Retia Palomonte - Bacchio	SIAM PROGETTI			0,00	
57		46	39	48	6097	SA	Condotta Retia Calabritto Barigliano	SIAM PROGETTI			0,00	
58		47	39	00	6101	SA	Impianto depurazione N.I. Balvano	Consorzio per il Bacchio di Balvano			2.042,61	
59		48	39	48	6102	AV	Impianto depurazione N.I. Calabritto	CONSUD			0,00	
60		49	39	48	6103	SA	Impianto depurazione N.I. Colliani	CONFRA			0,00	
61		50	39	48	6104	AV	Impianto depurazione N.I. Conza	GLIT.			6.833,39	
62		51	39	48	6105	AV	Impianto depurazione N.I. Lioni (FI)	SIAM PROGETTI			7.161,32	
63		52	39	48	6106	AV	Impianto depurazione N.I. Motta	GLIT.			8.664,28	
64		53	39	48	6107	SA	Impianto depurazione N.I. Palomonte	COMPA			0,00	
65		54	39	48	6108	AV	Impianto depurazione N.I. Parata	INFRASUD			12.130,35	
66		55	39	00	6109	PZ	Impianto depurazione N.I. Vieste	MELANDRO - VIESTANO			64.498,79	
67		56	39	99	6150		Opere di elettrificazione	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI			97.205,85	
68		57	39	99	6151		Elettrificazione interurbane	ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI			1.320.541,88	
69		58	39	00	6292	PZ	INFRASUD PIGNOLA	CONCORDIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA			0,00	

Classe concessione	Classe progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Caricchio - Aperti		Attività condotte (in Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni nel progetto		
						Decisione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per esproprio	Altra natura	
			A	1	Conteggio CONIFRA		Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.2 del 18/03 - GURI n.215 del 18/03			
	Revocato		A	1	In corso completamente esproprio		Provincia di Potenza	Consegna definitiva 1110188	53	1	
X 1333	28/01/2015	X 1349 28/02/2015	56.556,12	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva 111.10.99			
				A	1	In corso ultimamente esproprio		Consorzio ASI di Avellano	Consegna definitiva con DM 157 del 27/99		
				A	1	Conteggio CONIFRA - Saldo a debito del Concessionario non corrisposto		Comune di Oliveto Citra (SA)	Consegna definitiva # 270100		
X 652	29/03/2010	X 658 28/04/2010	583.947,88	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva # 241198			
X 1353	12/03/2015	X 1385 04/05/2015	25.916,78	C	1		Provincia di Potenza	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.49 del 24/04/04 - GURI n.148 del 24/04/04			
X 648	22/03/2010	X 654 12/04/2010	955.473,63	C	1	Contenzioso - Saldo lavori sospeso	Stada Iuca - Folla tratto Km.0+300 / Km.1+500	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 13/09/06 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 27/04/04 - GURI n. 238 del 01/05/04		
							Tratto Km.1+500 / Km.5+715	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 27/04/04 approvato con Decreto Commissariale n. 42 del 15/10/04 - GURI n.299 del 01/11/04		
							Tratto Km.5+715 / Km.6+166,50	Provincia Potenza	Consegna definitiva con verbale del 20/04/04 approvato con Decreto Commissariale n. 82 del 15/10/04 - GURI n.299 del 01/11/04		
							Contratto a vittoria consule	Comune S. Angelo Le Fratte (PT)	Consegna definitiva con verbale del 22/03/05 approvato con Decreto Commissariale n. 34 del 12/02/05 - GURI n.89 del 18/04/05		
				A	1	Saldo lavori sospeso per inadempimento contrattuale		Provincia di Salerno Comune di Caggiano	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.346 del 18/04/07 - GURI n.117 del 22/05/07		
X 1771	24/10/2012	X 1969 18/12/2012	634.675,37	C	1	Pagamento saldo lavori sospeso per inadempimento contrattuale		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99		
X 661	09/05/2010	X 1075 21/05/2012	1.058.817,53	C	1		Regione Basilicata Regione Puglia Regione Campania	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.41 del 28/02/04 - GURI n.54 del 5.3.04			
X 481	01/12/2008	X 580 14/09/2009	168.658,56	C	1		Consorzio Acquedotto Valle del Sole	Consegna definitiva # 281037			
X 655	28/04/2010	X 685 21/05/2009	288.588,07	C	1		Regione Campania Regione Puglia	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.342 del 28/02/04 - GURI n.54 del 5.3.04			
		Decreto Ministeriale n. 36 del 7.4.2003	0,00	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva # 241101		1	
		Decreto Ministeriale n. 40 del 7.4.2003	0,00	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva # 241101		1	
X 552	09/07/2000	X 581 07/08/2000	2.082,91	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 158 del 27/99			
X 541	15/06/2000	X 553 10/07/2000	0,00	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
	Delibera ex Agendum n. 2358 del 17.3.1993	Decreto Ministeriale n. 39 del 7.4.2003	0,00	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99			
				A	1	In corso verifica trasferimento titoli		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99		
X 609	08/01/2012	X 648 25/02/2011	7.191,32	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. n. 157 del 27/99 - Integrazione D.M. n. 157 a cura MSP spart. Catastrali.			
X 1117	14/11/2012	X 1120 31/12/2012	8.664,38	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
X 378	18/05/2007	Decreto Ministeriale n. 31 del 29.3.2003	0,00	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99			
X 631	08/01/2010	X 637 08/02/2010	12.136,25	C	1		Consorzio ASI di Avellino	Consegna definitiva con D.M. 157 del 27/99			
X	Confezionamento devoluto - D.M. 233 del 3.11.1995	X 1458 07/12/2015	64.866,79	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Consegna definitiva con D.M. 155 del 27/99			
X 360	01/12/2006	X 374 18/09/2007	37.266,95	C	1						
X 365	01/12/2006	X 375 18/09/2007	1.329.541,88	C	1						
X 678	13/07/2010	X (unico decreto)	0,00	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Opera gli trasferita all'attuale proffore (n. consuntivazione commissariale n.870 del 27/2/04)			

Bando/linea di finanziamento	Progetti Allegato B	Progetti Allegato A	num. progetto		PROV	DESCRIZIONE	CONCESSIONARIO	Dotazione finanziaria			
								Costo totale progetti revocati ex art. 35	Importi di sovvenzione in loco	Importo versato alla cc 3250	Erogazioni
70		58	39	48	6203	SA	Credito fondiario Battaglia			66.154,69	
71		60	39	48	6205	SA	Adeguamento depuratore di Battaglia			0,00	
72		61	39	48	6207	SA	Collet. Poggi sopra alla SELE/TUSC.			761,97	
73		62	38	48	6208	SA	Bypass Ponte Canale			12.453,05	
74		63	39	48	6209	PE	Lavori idrici Melli			0,00	
75	7	1° lotto	39	48	310001	AV	Via della Lioni - Grottanara 1° lotto 1° stralcio	Concessionario INFRAV.		Regione Campania	44.322.098,00
76			39	48	410001	AV	Via della Lioni - Grottanara 1° lotto 2° stralcio 1° contrappeso			Ministero Infrastrutture	65.079.858,00
77			39	48	510001	AV	Via della Lioni - Grottanara 1° lotto 3° stralcio				
78	8	2° lotto	39	48	320001	AV	Via della Lioni - Grottanara 2° lotto 1° stralcio	Concessionario INFRAVAD			
8	5	63					TOTALI	76.448.229,27	44.298.051,97	218.590.397,29	
Sommano:								avanzamento effettuato dal MAP sull'importo totale versato progetti revocati		76,03	
								Progetti effettuati dall'Ufficio Concessionario per totali		24.092,71	
TOTALE COMPLESSIVO										218.614.586,03	
								MISE		109.212.609,03	
								MIT e Regione		109.401.997,00	

Chiusura concessione	Chiusura progetto	Eventuali economie di progetto	Stato del progetto: Caucus - Agente	Attività residue (o Lavori in Corso)	Consegna opere			N. Transazioni sul progetto				
					Descrizione consegna	Ente destinatario	Tipologia consegna	Per esigenti	Altra natura			
X 361	09/05/2007	X	(unico decreto)	66.156,59	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n.20 del 05/02/00			
X 348	26/03/2007	X	(unico decreto)	0,00	C	1		Consorzio ASI di Salerno	Consegna definitiva con D.M. n.107 del 27/03/05		1	
X 341	26/03/2007	X	(unico decreto)	761,37	C	1		Consorzio Destra Sele	Consegna D. Comitato Gestione "Agente" n.898 del 19/12/02			
X 664	26/03/2009	X	(unico decreto)	52.453,85	C	1		Ente Arcangelo Pugliese	Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariabile n.868 del 26/03/04)			
X 617	07/02/2011	X	806 13/01/2010	0,00	C	1		Consorzio ASI di Potenza	Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariabile n.671 del 27/03/04)			
					A	1	Lavori in corso					
					A	1	Lavori in corso					
						1						
					A	1						
Totale Economie				12.857.735,87						701	18	
Percentuali di completamento delle attività					56							
					73,68	%						
					20							
					26,32	%						

2b.1)

PARAMETRO SCELTA			
SEZIONE	348		
CONTO	3250		
DATA_DA	17/03/2004		
DATA_A	04/09/2018		
PROVENIENZA FONDI	MISE		

DATA MOVIMENTO	CAUSALE	IMPORTO
17/03/2004	Versamento iniziale per lavori revocati ex comma 2 art. 86	44.298.128,00 *
13/03/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	7.698.577,67
14/07/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	10.084.365,75
11/12/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	8.148.834,59
27/12/2006	Versamento ex D.M. 21.12.2005	21.330.121,28
21/12/2007	Versamento ex D.M. 21.12.2005	25.073,54
24/12/2007	Versamento ex D.M. 21.12.2005	267.449,90
21/12/2009	Versamento ex D.M. 21.12.2005	10.112.340,30
04/05/2018	L. 219-91 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n. 39-40-6053	1.717.903,20
04/05/2018	L. 219-81 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n. 39-40-6053	5.505.722,09
TOTALE		109.188.516,31

* : suddivisione importo per progetti c.z	
prog. n. 39/60/6057	35.753.924,05
prog. n. 39/60/6062	5.269.928,00
prog. n. 39/40/6063	2.571.728,59
prog. n. 39/40/6064	702.471,33
arrotondamento operato dal MAP	44.298.051,97
	76,03
	44.298.128,00

COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02

Dettaglio trasferimenti risorse progetti trasferiti ex D.M. 21.12.2005 e D.M. 2.8.2017

regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	VERSAMENTI
39	60	6001	PZ	CONS. DI BALVANO	N.I. Balvano e Acquedotto	190.769,06 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60	6002	PZ	IMPRESA MALTAURO	N.I. Baragiano e Depuratore	5.437,31 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40	6003	SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	N.I. Buccino	15.239.426,48 (D.M. n. 10 del 2.3.2006 e D.M. n. 1101 del 7.12.2009)
39	40	6003	SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	Campo pozzi Buccino	2.023.199,06 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40	6004	AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	N.I. Calabritto	5.479,92 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40	6005	AV	Consorzio INCOMIR	N.I. Calaggio	0,00
39	40	6006	AV	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	N.I. Calitri	3.710.587,83 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40	6007	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	N.I. Contursi	192.973,31 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	40	6008	AV	CONSORZIO GI.IT	N.I. Morra de Sanctis/Conza	3.549,53 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60	6009	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. Isca Pantanelle	0,00
39	40	6010	AV	CONSORZIO IN.FRAV.	N.I. Lioni Nusco S. Angelo	38.009,86 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40	6011	AV	CONSORZIO GI.IT	N.I. Morra de Sanctis/Conza	99.952,44 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40	6012	AV	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	N.I. Nerico	1.138.355,19 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40	6013	GA	CONSORZIO CO.IN.SUD	N.I. Oliveto Citra	0,00
39	40	6014	SA	CONSORZIO CO.IN.PA.	N.I. Palomonte	0,00

Tagg.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	VERSAMENTI
39	40		6015	AV	CONSORZIO INFRASUD	N.I. Porrara	17.132,50 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40		6016	AV	CONSORZIO INCOMIR	N.I. S.Mango sul Calore	0,00
39	60		6017	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. S.Nicola di Melfi+F.Z.	44.894,07 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60		6018	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	N.I. Tito	237.143,11 (somma non trasferita)
39	60		6019	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. Valle Vitalba	20.141,82 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	60		6020	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	N.I. Viggiano	0,00
39	40		6021	AV	CONSORZIO GI.IT	N.I. Morra de Sanctis	32.078,41 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60		6051	PZ	IMPRESA MALTAURO	Basentana-Baragiano	655.073,96 (D.M. n. 10 del 2.3.2006)
39	40		6052	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Contursi-Stazione FF.SS.	559.115,16 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40		6053	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Fondo Valle Sele 1° lotto	7.223.625,29 (D.M. del 2.8.2017)
39	40		6054	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	Fondo Valle Sele 2° lotto	1.696.751,82 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40		6055	AV	CONSORZIO IN.FRAV.	Fondo Valle Sele 3° lotto	6.507.310,89 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	60		6056	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Isca-Tito/Brienza	598.272,70 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60		6057	PZ	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	Ofantina-Muro Lucano	25.073,54 (Versamento in data 21.12.2007)
39	40		6058	AV	Consortio INFRASUD	Bretella N.I. Lioni Porrara-S.Angelo	1.349.655,01 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60		6059	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada N.I. Melfi-Superstrada Candela/PZ	1.197.629,85 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60		6062	PZ	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	Strada Muro Lucano-Baragiano	8.793,79 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)

raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	VERSAMENTI
39	40		6063	AV	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	StradaCalitri-Ofantina	52.557,65 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40		6064	AV	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	StradaCalitri-Ofantina (Svincolo)	50.000,00 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40		6066	AV	CONSORZIO INCOMIR	Strada Ofantina-S. Mango	267.449,90 (Versamento in data 21.12.2007)
39	60		6067	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Valle di Vitalba-Ofantina	2.790.718,95 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	40		6068	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Oliveto Citra	480.247,21 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	60		6069	PZ	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	Strada Rapone-Ofantina-Muro Lucano	4.959.481,14 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	60		6070	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Rapone-Ofantina-Valle di Vitalba	56.550,12 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	40		6071	AV	CONSORZIO INCOMIR	Svincolo ferroviario S.Mango sul Calore	101.011,85 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	40		6075	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Ospedale di Oliveto Citra	1.132.241,72 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	60		6076	PZ	IMPRESA MALTAURO	Strada Balvano-Basentana-Baragiano-1°lotto	583.567,86 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	60		6076	PZ	IMPRESA MALTAURO	Strada Balvano-Basentana-Baragiano-2°lotto	25.914,78 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	60		6077	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 1° lotto	1.035.047,59 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60		6077	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 2° lotto	5.951.922,02 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40		6080	SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	Svincolo ferroviario N.I. Buccino	636.401,58 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40		6091	AV	SNAM PROGETTI	Acquedotto principale Alta Irpinia	1.916.417,53 (D.M. n. 10 del 2.3.2006)
39	40		6094	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	Acquedotto A.I. di Buccino	460.468,56 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40		6095	AV	SNAM PROGETTI	Acquedotto Irpinia Vallata/Monteone	208.588,07 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)

raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	VERSAMENTI
39	40		6096	SA	SNAM PROGETTI	Condotta reflui Palomonte-Buccino	0,00
39	40		6097	SA	SNAM PROGETTI	Condotta reflui Calabritto-Battipaglia	0,00
39	60		6101	PZ	CONS. DI BALVANO	Impianto depurazione N.I. Balvano	2.042,61 (D.M. n. 59 dell'8.11.2006)
39	40		6102	AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	Impianto depurazione N.I. Calabritto	0,00
39	40		6103	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Impianto depurazione N.I. Contursi	0,00
39	40		6104	AV	CONSORZIO GI.IT	Impianto depurazione N.I. Conza	6.832,39 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40		6105	AV	SNAM PROGETTI	Impianto depurazione N.I. Iioni	7.101,32 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40		6106	AV	CONSORZIO GI.IT	Impianto depurazione N.I. Morra	8.664,38 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	40		6107	SA	CONSORZIO CO.IN.PA.	Impianto depurazione N.I. Palomonte	0,00
39	40		6108	AV	Consorzio INFRASUD	Impianto depurazione N.I. Porrara	12.130,35 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	60		6109	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	Impianto depurazione N.I. Viggiano	64.466,79 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	99		6150		ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		97.260,85 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	99		6151		ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		1.320.541,88 (D.M. n. 23 del 21.4.2006)
39	60		6202	PZ	CONSORZIO A.S.I. POTENZA	Invaso Pignola	0,00
39	40		6203	SA	CONSORZIO A.S.I. SALERNO	Condotta forzata Battipaglia	66.154,59 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)

raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	VERSAMENTI
39	40		6205	SA	CONSORZIO A.S.I. SALERNO	Adeguamento depuratore di Battipaglia	0,00
39	40		6207	SA	CONSORZIO DESTRA SELE	Collett.reflui acque alte Sele/Tusciano	761,97 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	40		6208	SA	ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE	By-pass Ponte Canale	12.453,85 (D.M. n. 67 del 28.11.2006)
39	60		6209	PZ	CONSORZIO A.S.I. POTENZA	Lavori idrici Melfi	0,00
SOMMANO							64.890.388,31

2b.2)

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore					
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Admin.	Provvis.	Definit.				
60/0057/1	Viabilità Nerio-Muro Luaso	2.540,780,03	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)	5.306.734,09	4.824.783,49	In corso compl. proced. esprop.	Presunta	16.7.2009	Si	27.3.2011	8/29.11.2011	5.12.2012				
	Lavori principali														16.7.2014 *	
	Lavori di prima somma urgenza al viadotto Ficocchia	158.870,45	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)									Si	20.10.2011	28.11.2012	16.7.2014 *	
	Lavori di seconda somma urgenza al viadotto Ficocchia	98.513,78	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)										14.3.2010	28.11.2012	16.7.2014 *	
	Lavori di completamento 1° lotto	596.461,57	Basso Contrati Melfi (PZ)										16.7.2014	18/29.11.2011	16.7.2014 *	
	Lavori in economia per traslazione campagna viadotto Ficocchia	19.940,00	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)										28.5.2010	28.11.2012	16.7.2014 *	
	Lavori in economia ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	37.286,57	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)										7.4.2011	28.11.2012	16.7.2014 *	
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)										23.12.2011	28.11.2012	16.7.2014 *	
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità classa al traffico	17.631,73	C.A.I. s.r.l. Potenza				5.306.734,09	4.824.783,49								
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	La Cusalese s.r.l. Castellfrangi (AV)										22.12.2004	28.11.2012	16.7.2014 *	
	Lavori in economia supporto campagne di indagini su Viadotto Ficocchia	23.749,51	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)									Si	6.11.2008	28.11.2012	16.7.2014 *	
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)										15.2.2008	28.11.2012	16.7.2014 *	
Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza							5.4.2011	28.6.2011						
Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza							12.4.2011	28.6.2011						
Lavori ripristino impianto di illuminazione viadotto per Pescopagano	10.423,45	Basso Contrati Melfi (PZ)							08.08.2013	01.10.2013	8/29.11.2012	16.7.2014 *				
Lavori principali	15.391.561,83	ATI Aloni s.r.l.							23.12.2016	6.10.2017	5.12.2012	16.7.2014 *				

2b.2) I contratti di appalto_0_2 (settembre 2016)

N° Prog	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Am.m.ne)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore			
							Presunta	Effettiva	Statuto	Tec.-Amm.	Provv.	Definit.		
60/06072	Lavori di somma urgenza per frana in località Risicelle del Comune di Marco Luano	284.475,35	Napoli ATI Alcsi s.r.l. Napoli	22.557.349,45	20.036.868,87			18.3.2011			24.7.2014	31.7.2018		
	Lavori di 1° somma urgenza protezione scopo stradale e salvaguardia pubblica incolombati tratto Km. 23 circa	423.857,60	ATI Alcsi s.r.l. Napoli							10.8.2011	Si			
	Lavori di 2° somma urgenza protezione scopo stradale e salvaguardia pubblica incolombati tratto Km. 23 circa	400.109,34	ATI Alcsi s.r.l. Napoli							14.9.2011	Si			
	al Km. 27+400	150.844,90	ATI Alcsi s.r.l. Napoli									24.10.2011		
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	Pellegrino Verde Muro Lucano (PZ)							23.6.2008		3.8.2008		
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	Ecological Systems Muro Lucano (PZ)							10.7.2007		31.7.2007		
	Notio a cablo by-bridge per indagini		Ecologia & Servizi s.r.l.											
	Viadotto Farenja	1.000,00	Potenza							6.4.2011		28.6.2011		
	Segnaletica orizzontale e verticale	16.269,56	C.G.A. s.r.l.							20.12.2014		7.1.2015		
	svincolo di Rapone													
	Lavori di ripristino Viadotto Farenja	527.701,47	Tecnologie Stradali Roma							25.9.2017	Si			
	Lavori soldatare carpenteria di collegamento longhitane viadotto Farenja	38.688,22	Tecnologie Stradali Roma s.r.l.							7.12.2017		18.12.2017		
	Lavori di ripristino della continuità della pista esistente - tratto compreso tra progr. Km.11+000 e Km. 11+400	38.029,50	ATI Alcsi s.r.l. Napoli							28.7.2017		15.9.2017		
Svincolo Castelgrande - impianti nelle gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria	18.145.616,39	ATI Troiano s.n.s. Baragiano (PZ)					6.4.2017	Si	5.12.2017	Parziale 2)	24.7.2014	Parziale 3) 31.7.2018		
Lavori principali														

2b.2) i contratti di appalto_c. 2 (settembre 2018)

N° Prog.	Devisazione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (comprese somme a disposizione dell'Amn.ne)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
60/6057/3 1° stralcio	Lavori di risanamento della galleria Montemprivo	695.922,05	Pietro Falbo Luzzi (CS)	23.444.410,77	19.604.311,68	In corso stipula contratto- Consegna sotto riserva di legge	29.1.2019					
	Lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in loc. Raicelle di Muro Lucano	29.737,19	ATI Troiano s.a.s. Beregiano (PZ)					5.7.2017		10.7.2017	10.10.2017	
	Lavori urgenti di miglioramenti richiesti dall'ANAS	37.885,19	Troiano s.a.s. Beregiano (PZ)					8.9.2018		11.9.2018		
	Lavori urgenti di installazione segnaletica integrativa in corrispondenza dell'innesto con Muro Lucano richiesti dall'ANAS	4.414,24	C.G.A. s.r.l. Brienza (PZ)					Entro 31.10.2018				
60/6057/3 2° stralcio	Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00		7.415.648,67	53.230,62	URinista progett. esecutiva-In corso esame C.T.A.						
	Lavori di ripristino Viadotto Ficochia	1.548.934,78		1.985.528,22	42.643,37	In corso appalti completi						
60/6062	Viabilità Muro Lucano-Beregiano - Lavori principali	2.276.163,25	ATI Leopardi V. Bismillucolo (SA)			In corso compl. proced. esprop.	30.10.2007	SI	21.5.2008		20.7.2009 *	
	Viabilità secondaria Cervalechia Ponte Giacosa	689.580,26	Silvano s.r.l. Piemonte (PZ)				14.9.2010	SI	20.4.2011	28.1.2011	6.6.2011 *	
	Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale	89.712,33	Troiano s.a.s. Beregiano (PZ)				21.5.2009		1.7.2009		20.7.2009 *	
	Rotatoria Muro Lucano - Innesto SS. 7 Appia	128.178,76	Troiano s.a.s. Beregiano (PZ)	5.267.107,00	4.462.152,32		5.4.2011		1.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *	
	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano	5.978,66	Troiano s.a.s. Beregiano (PZ)				29.4.2011		6.7.2011	31.5.2011	18.7.2011 *	
	Innesto SS.7 Appia		Beregiano (PZ)									
	Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia	34.881,65	Silvano s.r.l. Piemonte (PZ)				29.9.2010		14.10.2010	28.1.2011	6.6.2011 *	
	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale	22.521,69	Silvano s.r.l. Piemonte (PZ)				8.2.2011			22.2.2011	28.1.2011	6.6.2011 *
	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	Bochiaccio N. Bella (PZ)	472.561,99	368.634,34		27.6.2011	SI	12.12.2011	24.8.2011	23.1.2012 *	
	Viabilità Galleri-S.S. 401 Ofantini Lavori principali	1.435.585,03	I.C.M. s.r.l. S.E. Giulio del	2b.2) i contratti di appalto_ c. 2 (settembre 2008) vedere			In corso compl.	14.3.2009	SI	4.8.2011	25.8.2010	25.8.2010

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto (compreso somma a disposizione dall'Amn. ne)	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore	
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit.
400663	Opere complementari	57.182,73	M.A. (SA)	2.661.894,38	1.993.164,40	appropriative		2.1.2010	23.6.2010	25.8.2010	2.7.2012*	18.10.2011*
			I.C.M. s.r.l.									
400664	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in galleria Gagliano	12.500,00	S.Egidio del M.A. (SA)	1.336.634,70	956.715,11			10.7.2010	10.8.2010	25.8.2010	18.10.2011*	
			I.C.M. s.r.l.									
400664	Svincolo sulla viabilità Calleri/Ostantina Lavori principali Opere complementari	595.420,26	Elli Viro	70.448.229,27	52.342.804,15	in corso compl. proc. esproprietat.			Si	25.8.2010	2.9.2011*	
			Ciardiello A. Avellino									
400664	Lavori ripristino viabilità svincolo Calleri/A. Nerico	106.100,39	Edilcostrade s.r.l. Quarto (NA)	70.448.229,27	52.342.804,15			1.9.2011	27.4.2012	25.8.2010	14.5.2012*	
TOTALI		85.973.441,36		70.448.229,27	52.342.804,15			27.4.2012	26.11.2012	-----	-----	15.1.2014*

* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario

1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svincolo Rapone (PZ)

2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)

3) Tratto compreso tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano) - all'ANAS. Lo svincolo di Castelgrande è stato consegnato al Comune di Castelgrande in data 30.7.2018.

2b.3)

COMMISSARIO AD ACTA - COMMA 2 ART. 86 L. 289/02**PROGETTI EX ART. 32 L. 219/81****CONVENZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI E AFFIDAMENTI IN CORSO CON UFFICIO COMMISSARIALE**

SOGGETTO	OGGETTO ATTO	TIPO ATTO	IMPORTO	PROGETTO N°	ADEMPIMENTI RESIDUI
Provveditorato OO.PP. Potenza	Funzioni Stazione Appaltante	Disciplinare del 5.3.2004		6057-6062	In corso
Provveditorato OO.PP. Napoli	Funzioni Stazione Appaltante	Disciplinare del 16.3.2004		6063-6064	In corso
Geom. Della Fera Michele	Attività di supporto definizione procedure espropriative	Convenzione del 23.4.2008	€. 18.396,00 (esclusi oneri prev. e spese)	6057/02-6062	In corso
Geom. Della Fera Michele	Attività di supporto definizione procedure espropriative	Convenzione del 23.10.2008	€. 80.115,00 (esclusi oneri prev. e spese)	6057/02-6057/3	In corso
Provveditorato OO.PP. Potenza	Attività Stazione Appaltante a titolo oneroso	Atto Aggiuntivo al Disciplinare del 5.3.2004 sottoscritto il 3.8.2010		6057-6062	In corso
Provveditorato OO.PP. Napoli	Funzioni Stazione Appaltante	Atto Aggiuntivo al Disciplinare del 16.3.2004 sottoscritto il 15.2.2011		6057/SF-6057/03-02 *	In corso
Geom. Della Fera Michele	Procedura espropriativa particelle area in frana Km. 23+700 circa	Convenzione del 2.8.2011	€. 9.775,00	6057/02	In corso
Ing. D'Anisi Lorenzo	Definizione e collocazione opere di sistemazione tombini	Convenzione del 6.10.2011	€. 14.000,00	6057/02	Pagamento saldo
Università degli Studi "Roma Tre" Dipartimento di Ingegneria	Attività di ricerca, consulenza scientifica/tecnica	Convenzione Quadro del 17.7.2013	€/////////	Tutti i progetti	In corso
Geom. Della Fera Michele	Supporto Procedura espropriativa	Convenzione dell'1.8.2014	€. 18.275,00	6057/02	In corso
Geom. Bologna Pasquale Lucio Antonio	Supporto Procedura espropriativa	Convenzione del 25.5.2016	€. 12.300,00	6057/03-01	In corso
Geom. Della Fera Michele	Redazione tipi di frazionamento	Convenzione del 26.7.2017	€. 36.890,00	6057/02 6057/03-01	In corso

SOGGETTO	OGGETTO ATTO	TIPO ATTO	IMPORTO	PROGETTO N°	ADEMPIMENTI RESIDUI
Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C.	Lavori urgenti di miglioramenti richiesti dall'ANAS	Contratto del 9.8.2018 Prot. n. 31.911	€ 37.886,06	6057/03-01	Pagamento saldo
C.G.A. s.r.l.	Lavori urgenti di installazione segnaletica integrativa richiesta da ANAS	Contratto del 10.9.2018 prot. n. 32.118	€ 4.414,24	6057/03-01	In corso
Studio Tecnico Geom. Guarino & De Bonis	Rilevazione dati per inserimento in DB catasto strade ANAS	Contratto del 14.9.2018 Prot. n. 32.177	€ 35.989,00	6057-6062	In corso
Ing. Artiaco Amiello	Predisposizione Piani Particellari di Esproprio grafici e descrittivi opere trasferite all'ANAS	Contratto del 18.9.2018 Prot. 32.194	€ 33.000,00	6057-6062	In corso
Areatecnica s.r.l.	Rilievo per trasferimento opere all'ANAS	Contratto del _____ Prot. n. _____	€ 39.000,00	6057-6062	In corso

* Le competenze del progetto 6057/03-02 sono state trasferite successivamente dalla Sede del Provveditorato OO.PP. di Salerno alla Sede di Potenza del medesimo Provveditorato relativamente alle funzioni di SUA avvalse.

COMMISSARIO AD ACTA - COMMA 2 ART. 86 L. 289/02						
PROGETTI EX ART. 32 L. 219/81						
CONVENZIONI, INCARICHI PROFESSIONALI E AFFIDAMENTI IN CORSO DIRETTAMENTE CON PROVVEDITORATO OO.PP. AVALSO						
SOGGETTO	OGGETTO ATTO	TIPO ATTO	IMPORTO	PROGETTO N°	ADEMPIMENTI RESIDUI	
Tecnologie Stradali s.r.l.	Lavori si ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga	Contratto d'appalto del 24.2.2017 Rep. n. 6997 approvato con decreto commissariale n. 1636 del 13.3.2017	€. 527.701,47	6057/02	Collaudo	
Impresa Falbo Pietro	Lavori di risanamento della galleria Montenuovo	Contratto d'appalto in corso di perfezionamento	€. 695.922,05	6057/03-01	In corso	
Akei Costruzioni Generali s.r.l.	Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del Viadotto Ficocchia	Contratto d'appalto del 20.4.2018 Rep. n. 12108 in corso di perfezionamento	€. 1.176.221,74	6057/SF	Perfezionamento contratto	
Prof.Ing. Monaco, Prof. Ing. De Liddo, Prof. Ing. Vacca	Collaudazione opere prog. 6057/03-01 5° lotto 1° stralcio	Prot. n. 531 del 16.1.2013 - Presa atto con decreto commissariale n. 1196 del 23.9.2013	€.	6057/03-01	Pagamento competenze professionali	
Prof.Ing. Mezzina	Collaudazione lavori di ripristino viadotto Farenga	Prot. n. 1585 del 22.3.2017 - Presa atto con decreto commissariale n. 1833 del 2.2.2018	€. 13.695,13	6057/02	Pagamento competenze professionali	
Ing. Perillo Gerardo	Progettazione strutture svincolo Muro Lucano	Disciplinare del 20.2.2017 Rep. n. 2000286	€. 18.795,93	6057/03-02	In corso	

2b.4)

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02

CONTABILITA' SPECIALE 3250

COMPLETAMENTO EX C. 1 ART. 86 L. 289/02 ATTIVITA' RESIDUE PROGETTI TRASFERITI EX D.M. 21.12.2005 E D.M. 2.8.2017

IMPEGNI ED EROGAZIONI

nr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PRO	CONCESSIONARIO	SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	ATTUALI IMPEGNI	EROGAZIONI EFFETTUATE	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' RESIDUE	
1	39	60	6001	PZ	CONS. DI BALVANO	190.769,06	0,00	%%%	0,00	0,00
2	39	60	6002	PZ	IMPRESA MALTAURO	5.437,31	0,00	%%%	0,00	0,00
3	39	40	6003	SA	CONSORZIO INFRASTRUTTURE BUCCINO S. GREGORIO MAGNO *	15.239.426,48	1.342.387,66	1.342.387,66	0,00	0,00
4	39	40	6003	SA	CONSORZIO INFRASTRUTTURE BUCCINO S. GREGORIO MAGNO	2.023.199,06	2.311.376,22	2.311.376,22	0,00	0,00
5	39	40	6004	AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	5.479,92	0,00	%%%	0,00	0,00
6	39	40	6005	AV	INCOMIR	0,00	0,00	%%%	0,00	0,00
7	39	40	6006	AV	ICLA Costruzioni Generali SpA	3.710.587,83	4.946.709,99	1.649.911,02	3.296.798,97	1
8	39	40	6007	SA	CONSORZIO COIN.FRA	192.973,31	192.973,31	87.456,01	105.517,30	2
9	39	40	6008	AV	CONSORZIO GILT	3.649,53	0,00	%%%	0,00	0,00
10	39	60	6009	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	0,00	0,00	%%%	0,00	0,00
11	39	40	6010	AV	CONSORZIO IN.FRAV.	38.009,86	0,00	%%%	0,00	0,00
12	39	40	6011	AV	CONSORZIO GILT	99.952,44	0,00	%%%	0,00	0,00
13	39	40	6012	AV	ICLA Costruzioni Generali SpA	1.138.355,19	1.198.090,88	67.455,12	1.130.625,76	1

aggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	CONCESSIONARIO	SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	ATTUALI IMPEGNI	EROGAZIONI EFFETTUATE	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' RESIDUE
14	39	40	6013	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	0,00	0,00	%%%	0,00
15	39	40	6014	SA	CONSORZIO CO.IM.PA	0,00	0,00	%%%	0,00
16	39	40	6015	AV	CONSORZIO IN.FRA.SUD.	17.132,50	0,00	%%%	0,00
17	39	40	6016	AV	INCOMIR	0,00	18.664,20	18.355,12	329,08
18	39	60	6017	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	44.894,07	0,00	%%%	0,00
19	39	60	6018	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	0,00	**	%%%	0,00
20	39	60	6019	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	20.141,82	0,00	%%%	0,00
21	39	60	6020	PZ	CONSORZIO MELANDRO VIGGIANO	0,00	0,00	%%%	0,00
22	39	40	6021	AV	CONSORZIO GUT	32.078,41	0,00	%%%	0,00
23	39	60	6051	PZ	IMPRESA MALTURO	655.073,96	600.000,00	600.000,00	0,00
24	39	40	6052	SA	CO.INFRA Consorzio Infrastrutture	559.115,16	85.267,79	85.267,79	0,00
25	39	40	6053	SA	CO.INFRA Consorzio Infrastrutture	7.223.625,29	7.223.625,29	7.223.625,29	3
26	39	40	6054	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	1.696.761,82	150.000,00	150.000,00	0,00
27	39	40	6055	AV	CONSORZIO INFRAV	6.507.310,89	3.507.310,89	2.159.366,00	1.347.942,89
28	39	60	6066	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	598.272,70	83.653,91	83.653,91	0,00
29	39	60	6057	PZ	I.C.L.A. COSTRUZIONI GENERALI SPA	25.073,54	309.321,16	309.321,16	0,00
30	39	40	6058	AV	CONSORZIO IN.FRA.SUD.	1.349.655,01	0,00	%%%	0,00
31	39	60	6059	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	1.197.629,85	820.239,66	820.239,66	0,00
32	39	60	6062	PZ	I.C.L.A. COSTRUZIONI GENERALI SPA	8.793,79	225.675,86	225.675,86	0,00
33	39	40	6063	AV	I.C.L.A. COSTRUZIONI GENERALI SPA	52.557,65	170.441,11	170.441,11	0,00

	raggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	CONCESSIONARIO	SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	ATTUALI IMPEGNI	EROGAZIONI EFFETTUATE	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' RESIDUE
34	39	40		6064	AV	I.C.L.A COSTRUZIONI GENERALI SPA	50.000,00	65.758,55	65.758,55	0,00
35	39	40		6066	AV	Consorzio INCOMIR	267.449,90	219.053,68	219.053,68	0,00
36	39	60		6067	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	2.790.718,95	2.077.357,96	2.077.357,96	0,00
37	39	40		6068	SA	CONSORZIO COIN.FRA	480.247,21	480.247,21	30.112,21	450.135,00
38	39	60		6069	PZ	I.C.L.A COSTRUZIONI GENERALI SPA	4.959.481,14	2.999.285,80	438.971,36	2.560.314,44
39	39	60		6070	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	56.550,12	0,00	%%%	0,00
40	39	40		6071	AV	CONSORZIO IN.CO.MIR.	101.011,85	101.011,85		101.011,85
41	39	40		6075	SA	CONSORZIO COIN.FRA	1.132.241,72	1.132.241,72		1.132.241,72
42	39	60		6076	PZ	IMPRESA MALTAURO	583.567,86	0,00	%%%	0,00
43	39	60		6076	PZ	IMPRESA MALTAURO	25.914,78	0,00	%%%	0,00
44	39	60		6077	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	1.035.047,59	69.567,90	69.567,90	0,00
45	39	60		6077	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	5.951.922,02	2.651.922,02	908.501,77	1.743.420,25
46	39	40		6080	SA	CONSORZIO INFRASTRUTTURE BUCCINO S. GREGORIO MAGNO	636.401,58	1.925,31	1.925,31	0,00
47	39	40		6091	AV	SNAM PROGETTI	1.916.417,53	56.600,00	56.600,00	0,00
48	39	40		6094	SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	460.468,56	0,00	%%%	0,00
49	39	40		6095	AV	SNAM PROGETTI	208.588,07	0,00	%%%	0,00
50	39	40		6096	SA	SNAM PROGETTI	0,00	0,00	%%%	0,00
51	39	40		6097	SA	SNAM PROGETTI	0,00	0,00	%%%	0,00
52	39	60		6101	SA	Consorzio Nucleo Balvano	2.042,61	0,00	%%%	0,00
53	39	40		6102	AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	0,00	0,00	%%%	0,00

	reggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	CONCESSIONARIO	SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	ATTUALI IMPEGNI	EROGAZIONI EFFETTUATE	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' RESIDUE
54	39	40		6103	SA	CONSORZIO COIN.FRA	0,00	26.401,83	26.401,83	0,00
55	39	40		6104	AV	CONSORZIO GIIT	6.832,39	6.832,39		6.832,39
56	39	40		6105	AV	SNAM PROGETTI	7.101,32	0,00	%%%	0,00
57	39	40		6106	AV	CONSORZIO GIIT	8.664,38	0,00	%%%	0,00
58	39	40		6107	SA	Consorzio CO IM PA	0,00	0,00	%%%	0,00
59	39	40		6108	AV	CONSORZIO IN.FRA.SUD.	12.130,35	0,00	%%%	0,00
60	39	60		6109	PZ	CONSORZIO MELANDRO-VIGGIANO	64.466,79	0,00	%%%	0,00
61	39	99		6150		ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI	97.260,85	0,00	%%%	0,00
62	39	99		6151		ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI	1.320.541,68	0,00	%%%	0,00
63	39	60		6202	PZ	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA	0,00	0,00	%%%	%%%
64	39	40		6203	SA	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	66.154,59	0,00	%%%	%%%
65	39	40		6205	SA	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
66	39	40		6207	SA	CONSORZIO DESTRA SELE	761,97	0,00	%%%	0,00
67	39	40		6208	SA	EAMP-ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLESE	12.453,85	0,00	%%%	0,00

reg.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	CONCESSIONARIO	SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	ATTUALI IMPEGNI	EROGAZIONI EFFETTUATE	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' RESIDUE
68	39	60	6209	PZ	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA	0,00	0,00	%%%	0,00
					TOTALI	64.890.388,31	33.273.964,19	14.175.169,25	19.098.794,94

* di cui €. 10.112.340,30 (residui anno 1997) trasferiti successivamente dal MiSE al Commissario con D.M. n. 1101 del 7.12.2009

** Trasferimento di €. 237.143,11 disposto con d.m. n.59/B5/MSE dell'8.11.2006 ma non effettuato per somma già utilizzata e non disponibile (v.note ministeriale perv.18.5.09)

L'economia costituita dalla differenza tra le somme trasferite al Commissario ad Acta e gli attuali impegni, pari a €. 31.616.424,12 è stata in parte utilizzata, per €.26.150.101,27, per i completamenti ex c. 2 art. 86 L.289/02.

Nota: L'attività attenta dell'Ufficio Commissariale svolta anche mediante strategie progettuali, oculata gestione, ricorso a transazioni per definizione di contenziosi, nonché a transazioni in materia espropriativa per acquisizione di suoli, ecc., ha consentito di registrare una economia complessiva di €.5.504.755,38.

- 1) Completamento espropri
- 2) Risoluzione contenzioso
- 3) Approvazione collaudo, risoluzione contenziosi, pagamento professionisti, ecc.
- 4) Recupero saldo a debito Concessionario
- 5) Pagamento saldo lavori (sospeso per inadempienza contributiva) - Risoluzione contenziosi
- 6) Verifica trasferimento suoli
- 7) Risoluzione contenzioso, pagamento professionisti

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02											
CONTABILITA' SPECIALE 3250											
COMPLETAMENTO LAVORI EX C. 2 ART. 86 L. 289/02											
Concessioni ex art. 32 L. 219/81 revocate dal MISE											
IMPEGNI ED EROGAZIONI											
regio	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	(CONCESSIONARIO) STAZIONE APPALTANTE	SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	SOMME COME RIDISTRIBUITE	TOTALI DI PROGETTO ATTUALMENTE IMPEGNATI (1)	EROGAZIONI EFFETTUATE	ATTUALI IMPEGNI DISPONIBILI PER ATTIVITA' RESIDUE	
39	60		6057	PZ	ex I.C.L.A. S.p.A.	35.754.000,00					
69	39	60	6057	1	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		4.135.000,05	5.306.734,09	4.824.783,49	481.950,60	1
70	39	60	6057	2	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		17.430.120,00	22.557.349,45	20.036.868,82	2.520.480,63	2
71	39	60	6057	3° lotto 1° stralcio	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		13.486.950,95	23.444.410,77	19.604.311,68	3.840.099,09	3
72	39	60	6057	3° lotto 2° stralcio	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ			7.415.648,57	53.230,52	7.362.418,05	4
73	39	60	6057	SF	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ			1.965.528,22	42.643,37	1.942.884,85	4
39	60		6062	PZ	ex I.C.L.A. S.p.A.	5.269.929,00					
74	39	60	6062	PZ	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. PZ		5.269.928,00	5.267.107,00	4.462.152,32	804.954,68	1
75	39	60	6062	2	(ex I.C.L.A. S.p.A.) - PROV. OO.PP. PZ - COMMISSARIO AD ACTA			472.951,99	368.634,34	104.317,65	5
76	39	40	6063	AV	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. NA	2.571.728,00	2.571.728,59	2.661.864,38	1.993.164,40	668.699,98	1
77	39	40	6064	AV	(ex I.C.L.A. S.p.A.) PROVVEDITORATO INTERR. OO.PP. NA	702.471,00	1.404.400,00	1.336.634,70	956.715,11	379.919,59	1
					Autot.		0,41				
					TOTALI	44.298.128,00	44.298.128,00	70.448.229,27	52.342.504,15	18.105.725,12	

1 La differenza tra le somme trasferite, come ridistribuite (€ 44.298.128,00), e i totali dei progetti attualmente impegnati (€ 70.448.229,27) è stata attinta dalla economia realizzata su altri progetti rientranti nel medesimo art. 32 L.219/81, trasferiti per i completamenti ex c. 1 art. 86 L.289/02.

1) Completamento espropri;

2) Collaudo lavori viadotto Farenza, pagamento competenze professionali, risoluzione riserve ATI esecutrice, completamento espropri;

3) Esecuzione lavori risanamento galleria Montenuovo, pagamento competenze professionali, completamento espropri;

4) Esecuzione lavori;

5) In corso istruttoria per chiusura progetto.

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02			
CONTABILITA' SPECIALE 3250			
COMPLETAMENTO LAVORI EX C. 1 E C. 2 ART. 86 L. 289/02 GIA' ART. 32 I. 219/81			
IMPEGNI ED EROGAZIONI			
	TOTALI SOMME TRASFERITE AL COMMISSARIO	TOTALI SOMME IMPEGNATE	EROGAZIONI EFFETTUATE
COMMA 1	64.890.388,31	33.273.964,19	14.175.169,25
COMMA 2	44.298.128,00	70.448.229,27	52.342.504,15
TOTALI	109.188.516,31	103.722.193,46	66.517.673,40

2b.5)

Ministero dello Sviluppo Economico
Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

**Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di
completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02**

Lavori in corso e/o in fase di chiusura contabile

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano le viabilità Nerico- Muro Lucano – Calitri – Baragiano e Calitri – Ofantina e relativo svincolo la cui esecuzione era stata affidata negli anni '80 in concessione all'ATI ICLA S.p.A. oggi in liquidazione, con specifiche Convenzioni successivamente revocate dal MiSE.

Per la chiusura di tutte le attività connesse con il terremoto Irpinia è stato nominato nel febbraio 2003 un Commissario ad Acta, ivi inclusi i completamenti dei suddetti lavori rimasti per anni in abbandono.

I progetti di completamento infrastrutturale interessati, come individuati dal Mise in sede di trasferimento al Commissario, sono:

- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 – Viabilità Muro Lucano-Baragiano
- n. 39/40/6063 – Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 – Svincolo strada Calitri-Ofantina

Un cenno a parte va fatto per il prog. 6053, già in Concessione al Consorzio CO.INFRA., trasferito con D.M. del 2.8.2017 e riportato in fondo alla presente Relazione.¹⁾

PROG. n.39/60/6057 – VIABILITA' NERICO-MURO LUCANO

I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e rinumerati 39/60/COM/6057/01 – 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 – 2° lotto, 39/60/COM/6057/03-01 – 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 – 3° lotto 2° stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

L'asse principale ha una lunghezza complessiva di circa 28 Km. ed ha caratteristiche geometriche del tipo C V secondo le norme CNR con una carreggiata di m. 9,50 costituita da due corsie da m. 3,50 ciascuna e da due banchine laterali da m. 1,25 ciascuna. Le diverse viabilità secondarie hanno una carreggiata che a seconda dell'importanza delle singole viabilità varia per ciascuna di esse da

¹ I restanti 67 progetti trasferiti al Commissario (v. c.1 art. 86 L. 289/02) richiedevano modesti interventi costruttivi ma notevoli incombenze in campo amministrativo-contabile, espropriativo, contenzioso, ecc.

2b.5)

un minimo di m. 4 a m. 6.

Prog. n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico – Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. + bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).

L'importo del progetto del I lotto ammonta a €5.306.734,09 di cui € 2.540.780,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a € 94.825,99 appaltati all'Impresa Calabria Pasquale s.r.l., € 596.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari a € 19.946,37 appaltati all'Impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed € 2.169.492,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tutti i lavori del 1° lotto sono ultimati, collaudati, consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti in via anticipata provvisoria, divenuta definitiva una volta approvati i collaudi t.a., nei rapporti Mise/Provincia (Provincia di Potenza, Provincia di Avellino) ed in parte in via definitiva in via definitiva (ANAS e Comune di Pescopagano) e regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve.

A fronte dell'importo originario impegnato di € 5.306.734,09 sono stati erogati complessivamente € 4.824.783,49 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di € 481.950,60.

Prog. n. 39/60/COM/6057/02

Lavori del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro Lucano lunghezza tratta circa 21 Km.).

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta a €22.557.349,45 di cui € 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €321.750,68, € 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, € 527.701,47 compresi oneri di sicurezza pari a € 43.300,00 per il progetto redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed € 7.017.527,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi al viadotto Farenga).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. AKEI Costruzioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori principali sono stati ultimati in data 23.12.2016.

Sono state collaudate staticamente tutte le opere d'arte realizzate.

E' stato altresì emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in data 6.10.2017 approvato con decreto commissariale n. 1784 del 4.12.2017.

2b.5)

Le opere relative al tratto di circa Km. 3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr. Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 9+100 sono state consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza, e regolarmente aperte al traffico, con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Con l'approvazione del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise e Provincia.

All'attualità anche le n. 5 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto di competenza, al Comune di Muro Lucano con verbale in data 14.9.2017 approvato con decreto commissariale n. 1720 del 3.10.2017 pubblicato nella GURI n. 286 del 7.12.2017 e al Comune di Castelgrande con verbale in data 11.10.2017 approvato con decreto commissariale n. 1728 del 23.10.2017 pubblicato nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Anche dette consegne sono divenute definitive con l'approvazione del collaudo.

Si sottolinea che tutte le restanti tratte dell'asse principale, tutte, come detto, collaudate, non potendo ancora essere trasferite in via definitiva all'ANAS nelle more della funzionalità della intera tratta Nerico-Muro Lucano, sarebbero state come di norma consegnate da questo Ufficio in via provvisoria alla Provincia e nella fattispecie a quella di Potenza. Tuttavia, stante il rifiuto della Provincia alla presa in carico per problematiche gestionali, a seguito di incontri e corrispondenza con la Regione Basilicata, era stata concordata la consegna di tutte le restanti opere realizzate alla medesima Regione Basilicata e da quest'ultima contestualmente consegnate all'ANAS quale soggetto gestore. A seguito di successivi contatti e riunioni è stato successivamente stabilito di procedere direttamente alla consegna definitiva all'ANAS, stante peraltro l'intervenuto decreto di statizzazione del 20.2.2018 pubblicato nella GURI n. 98 del 28.4.2018. E' stata quindi effettuata la predisposizione degli atti ulteriori e di dettaglio richiesti dall'ANAS medesima per la citata consegna definitiva, comunque possibile stante l'intervenuta collaudazione tecnico-amministrativa di tutte le opere oltre che statica. La consegna della citata documentazione è avvenuta in data 19.3.2018 (v. nota prot. n. 30511 del 16.3.2018) presso l'ANAS di Potenza. Numerose ulteriori documentazioni specifiche sono state richieste nel frattempo dalla stessa ANAS.

Sopralluoghi congiunti sui lavori sono stati quindi effettuati in data 21.3.2018 e in data 6.6.2018.

A seguito della richiesta dell'ANAS S.p.A. formulata in data 13.6.2018 in sede di ulteriore riunione presso la Regione Basilicata, lo svincolo di Castelgrande, rientrante nelle opere del 3° lotto 1° stralcio, è stato consegnato al Comune di Castelgrande a partire dagli inviti sull'asse da questo Ufficio con verbale in data 30.7.2018 approvato con decreto Commissariale n. 1936 del 2.8.2018, pubblicato nella GURI n. 217 del 18.9.2018.

Con verbale in data 31.7.2018 approvato con decreto commissariale n. 1937 del 3.8.2018, pubblicato anch'esso nella GURI n. 217 del 18.9.2018, sono state consegnate in via definitiva all'ANAS S.p.A. le opere della viabilità Nerico-Muro Lucano realizzate in parte con il progetto di 2° lotto e in parte con il progetto di 3° lotto 1° stralcio, costituite dal tratto di asse principale compreso

2b.5)

tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano).

Si rappresenta che l'ANAS S.p.A. ha richiesto altresì:

- 1) la realizzazione di alcuni interventi urgenti di miglioramento al fine di garantire l'immediata apertura del tratto funzionale della strada compreso tra lo svincolo di Castelgrande e l'uscita per Muro Lucano;
- 2) la produzione di documentazione espropriativa particolareggiata;
- 3) la rilevazione dei dati necessari per l'inserimento nel DB di catasto ANAS;
- 4) la realizzazione di un rilievo al fine di realizzare complessi elaborati atti a determinare gli esatti elementi geometrici dell'asse viario in argomento.

Per quanto riguarda il precedente punto 1) è stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, nell'ambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, il progetto dei lavori urgenti di miglioramenti richiesti dall'ANAS per l'importo di €. 41.430,89 di cui €.38.934,86 per lavori da assoggettare a ribasso, €. 703,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.792,76 per somme a disposizione. Detto progetto è stato approvato con decreto commissariale n. 1925 del 9.7.2018. L'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. dei citati lavori all'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. (prot. n. 31.911 del 9.8.2018) per l'importo di €. 37.182,79 al netto del ribasso offerto del 4,50% oltre oneri di sicurezza pari a €. 703,27. Detti lavori sono stati ultimati il giorno 31.8.2018 ed è stata certificata in data 11.9.2018 dal D.L. la regolare esecuzione attestando l'importo totale dei lavori eseguiti in €. 37.885,19 di cui €. 37.181,92 per lavori e €. 703,27 per oneri di sicurezza.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 2) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. all'ing. Aniello Artiago (prot. n. 32.194 del 18.9.2018) per la predisposizione dei Piani Particellari di Esproprio grafici e descrittivi ed attività connesse per l'importo di €. 33.000,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il 15 febbraio 2019.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 3) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. allo Studio Tecnico Guarino & De Bonis (prot. n. 32.177 del 14.9.2018) per le attività di rilevazione dei dati necessari per l'inserimento nel DB di catasto per l'importo di €. 35.989,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il 12 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le attività di cui al precedente punto 4) l'Ufficio Commissariale ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. alla Società Areatecnica s.r.l. (prot. n. 32.217 del 19.9.2018) per le attività di realizzazione di un rilievo per l'importo di €. 39.000,00. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è stato stabilito entro il

2b.5)

29.12.2018.

L'ANAS S.p.A. ha, altresì, richiesto successivamente l'installazione di segnaletica integrativa in corrispondenza dell'innesto con Muro Lucano. Detti lavori, il cui progetto è stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, nell'ambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, sono stati affidati dall'Ufficio Commissariale che ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. alla Società C.G.A. s.r.l. di Brienza (PZ) (prot. n. 32.118 del 10.9.2018) per l'importo di € 4.414,24. Il termine per l'ultimazione delle citate attività è previsto entro il mese di ottobre 2018.

Nell'ambito del presente 2° lotto dei lavori è stato approvato il progetto, redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino della continuità della pista esistente – tratto compreso tra la progr. Km. 11+000 e Km. 11+400. Per l'esecuzione di detti lavori si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, all'ATI Akei esecutrice dei lavori principali. La Direzione dei Lavori è affidata a funzionario di questo Ufficio. Detti lavori sono stati ultimati in data 28.7.2017 ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 15.9.2017.

I lavori di ripristino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. a seguito di gara pubblica esperita dal Provveditorato OO.PP. di Potenza per l'importo netto di € 484.401,47 oltre oneri di sicurezza pari a € 43.300,00, previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione relative al progetto generale unitamente alle relative ulteriori somme a disposizione pari a € 68.374,35, sono stati ultimati in data 25.9.2017, giusta certificato di ultimazione e, comprese lavorazioni marginali, in data 21.11.2017, giusta attestazione del D.L. Sono in avanzata fase le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, mentre risulta emesso il certificato di collaudo statico.

In fase di esecuzione dei citati delicatissimi lavori è risultata una anomalia, riscontrata dal Consulente Tecnico dell'Ufficio Commissariale, in corrispondenza delle testate della longherina centrale. Pertanto sono stati eseguiti i lavori di saldatura carpenteria di collegamento longherine del viadotto Farenga affidati per l'importo di € 38.688,22 alla citata Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. Detti lavori sono stati ultimati in data 7.12.2017, giusta certificato del D.L. ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 18.12.2017 per l'importo di € 38.669,85.

Resta da consegnare soltanto il tratto compreso tra lo svincolo di Rapone (progr. Km. 9+450) e lo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800). La consegna di tale ulteriore tratto è stata subordinata da ANAS S.p.A. all'esecuzione di lavori di risanamento all'interno della galleria Montenuovo, lavori previsti nell'ambito del progetto di 3° lotto 1° stralcio.

2b.5)

Le attività residue in avanzato corso riguardano:

- 1) pagamento saldo lavori;
- 2) completamento procedure espropriative;
- 3) collaudo tecnico-amministrativo opere di ripristino viadotto Farenga;
- 4) chiusura contabile progetto;
- 5) Risoluzione riserve ATI Akei, già oggetto delle Relazioni del D.L., del Collaudatore, del RUP e che per ragioni di ulteriore completezza si ritiene di sottoporre anche al C.T.A.. Attualmente l'ATI Akei è sottoposta ad interdittiva della Prefettura di Napoli.

A fronte dell'importo impegnato di €. 22.557.349,45 sono stati erogati complessivamente €. 20.036.868,82 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.2.520.480,63.

La cura e l'attenzione sempre posta dall'Ufficio Commissariale nel garantire sicurezza, affidabilità progettuale e competenza direzionale (affidata sempre a funzionari pubblici) hanno consentito risultati importanti oltre che in termini tecnici per la professionalità dei medesimi funzionari anche in termini economici.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-01

Lavori del III lotto 1° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano – Svincolo di Castelgrande – n.4 cavalcavia).

L'importo del progetto del 1° stralcio del 3° lotto ammonta a €.23.444.410,77 di cui €.18.145.616,39 per lavori principali compresi oneri di sicurezza, €.161.292,00 per spese di progettazione, €. 999.340,40 compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo, €. 29.737,19 compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.396,71 per lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle del Comune di Muro Lucano, inseriti tra le somme a disposizione del progetto e €. 4.108.424,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione (compresi detti lavori relativi alla galleria Montenuovo e relativi ai lavori di ripristino).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all'A.T.I. Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 6.4.2017 ed è stato emesso il certificato di collaudo in data 5.12.2017 approvato con decreto commissariale n. 1807 del 15.12.2017 con accertamento di una economia di €. 628.564,10 dovuta essenzialmente ad una ridotta lavorazione sull'asse entro il quinto. Detta somma sarà utilizzata per la realizzazione dello svincolo di Muro Lucano a livelli sfalsati, che L'ANAC, su richiesta di parere di questo Ufficio, non aveva (sorprendentemente comunque) ritenuto opera complementare.

Le opere relative all'impianto di illuminazione galleria artificiale Progr. Km. 9+100 circa sono state

2b.5)

consegnate in via anticipata e provvisoria alla Provincia di Potenza con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Come già segnalato al paragrafo precedente, con l'approvazione del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i rapporti tra Mise e Provincia.

All'attualità anche le n. 4 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto di competenza, al Comune di Muro Lucano e al Comune di Castelgrande con verbali in data 10.10.2017 approvati con decreti commissariali n. 1726 e n. 1727 del 23.10.2017 pubblicati nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Dette consegne sono divenute definitive con l'approvazione del collaudo.

Tutti i collaudi statici risultano redatti e si è provveduto alla certificazione ex art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 ai fini della presa in consegna anticipata delle opere in argomento.

Per la consegna delle opere principali vedasi punto precedente.

Per quanto riguarda i lavori di risanamento della galleria Montenuovo, consistenti essenzialmente nella posa in opera di pannelli di rivestimento, il cui progetto è stato redatto da questo Ufficio, si rappresenta che i medesimi lavori, aggiudicati all'Impresa Pietro Falbo di Luzzi (CS) per l'importo al netto del ribasso di €. 695.922,05, saranno consegnati il 1 ottobre p.v. in via d'urgenza e sotto riserva di legge nelle more del perfezionamento del contratto d'appalto. L'ultimazione degli stessi è prevista entro la fine del mese di gennaio 2019.

I lavori di ripristino della continuità della viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle di Muro Lucano realizzati dall'ATI Troiano esecutrice dei lavori principali, e diretti da funzionario di questo Ufficio, sono stati ultimati in data 5.7.2017 ed è stata dichiarata la regolarità dell'esecuzione con atto in data 10.7.2017. Detta viabilità è compresa nelle n. 4 viabilità secondarie consegnate al Comune di Muro Lucano con il citato verbale in data 10.10.2017.

Inoltre risulta esaminato favorevolmente, con prescrizioni, il progetto redatto da questo Ufficio relativo all'illuminazione dello svincolo di Rapone che, tuttavia presumibilmente non potrà essere affidato da parte di questo Ufficio la cui scadenza è al 31.12 p.v..

Le attività residue riguardano:

- 1) pagamento saldo lavori;
- 2) completamento procedure espropriative,
- 3) realizzazione lavori di risanamento della galleria Montenuovo;
- 4) realizzazione illuminazione dello svincolo di Rapone;
- 5) chiusura contabile progetto;
- 6) risoluzione riserve ATI Troiano.

2b.5)

L'ANAS sostiene di non poter prendere in consegna la tratta dallo svincolo di Rapone (progr. Km. 9+450) allo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800), proprio a causa di tali lavori in corso. Il sottoscritto non condivide tale posizione, ma ad evitare conflitti istituzionali, si astiene dall'imporre il trasferimento delle opere con Decreto. C'è infatti da sottolineare che tali opere restano di fatto senza manutenzione e senza custodia, non essendo titolato il Commissario ad intervenire in tal senso.

A fronte dell'importo impegnato di €. 23.444.410,77 sono stati erogati complessivamente €. 19.604.311,68 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.3.840.099,09.

Prog. n. 39/60/COM/6057/03-02

Lavori del III lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7.415.648,67 di cui €. 6.439.914,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

All'attualità risulta completata la progettazione esecutiva e si è in attesa del parere del C.T.A..

Occorre purtroppo sottolineare che i tempi operativi del Provveditorato sono particolarmente lunghi.

Le attività residue riguardano pertanto:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) affidamento ed esecuzione lavori;
- 3) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile.

A fronte dell'importo impegnato di €. 7.415.648,67 sono stati erogati complessivamente €.53.230,62 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.7.362.418,05.

Prog. n. 39/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del viadotto "Ficocchia").

L'importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

E' in corso da parte del Provveditorato avvalso la stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria Akei Costruzioni Generali s.r.l., sospesa per intervenuta interdittiva da parte della Prefettura di Napoli.

Le attività residue riguardano pertanto:

2b.5)

- 1) contrattualizzazione, esecuzione lavori, collaudazione dei lavori;
- 2) consegna definitiva opere, attualmente in esercizio provvisorio;
- 3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 sono stati erogati complessivamente €.42.643,37 per spese di rilievi e indagini, di consulenze tecniche e di indennità di missioni, per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.1.942.884,85.

Prog. n. 39/60/COM/6062: (collegamento Muro Lucano – Baragiano lunghezza tratta di circa 5,4 Km.)

L'importo del progetto ammonta a €. 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.943,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali sono stati appaltati all'ATI Lopardo ed altri.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Comune di Muro Lucano, Provincia di Potenza, A.N.A.S.) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative,
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 5.267.107,00 sono stati erogati complessivamente €.4.462.152,32 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.804.954,68.

Prog. n.39/60/COM/6062/02: (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94)

Il ripristino di detto tratto, che collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell'ambito di altro progetto e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11.3.2004, costituisce collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale Basentana-Muro Lucano. Detti lavori di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi dell'art. 86 c. 1 L. 289/02 a seguito di richiesta dell'ANAS destinatario del medesimo tratto in questione.

L'importo del progetto ammonta a €. 472.951,99 di cui €. 336.341,75 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori sono stati appaltati all'Impresa Bochicchio Nunzio.

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati all'Ente competente (A.N.A.S.) ed in regolare esercizio.

2b.5)

Le attività residue riguardano:

- 1) chiusura contabile progetto (istruttoria in corso).

A fronte dell'importo impegnato di €. 472.951,99 sono stati erogati complessivamente €.368.634,34 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.104.317,65.

Prog. n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a €. 30.000,00, €. 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.596,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all'Impresa L.C.M. s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (Provincia di Avellino e Comune di Calitri) e sono regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 sono stati erogati complessivamente €.1.993.164,40 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.668.699,98.

Prog. n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593.420,36 per lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106.100,39 per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del progetto, ed €. 610.247,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi detti lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e l'A.I. di Nerico.

I lavori principali sono stati appaltati all'Impresa Edil Viro, le opere integrative e complementari all'Impresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di collegamento svincolo per

2b.5)

Calitri e l'A.I. di Nerico all'Impresa Edilteconstrade s.r.l..

I lavori sono ultimati, collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti (ANAS, Provincia di Avellino, Comune di Calitri, Consorzio ASI di Avellino) e sono in regolare esercizio.

Le attività residue riguardano:

- 1) completamento procedure espropriative;
- 2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.336.634,70 sono stati erogati complessivamente €.956.715,11 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di €.379.919,59.

Aspetti economici-finanziari

Per tutto quanto esposto a fronte complessivamente di €. 109.188.516,31, di cui €.44.298.128,00 per completamento lavori progetti revocati ex c. 2 art. 86 L. 289/02 ed €.64.890.388,31 per completamento n. 68 progetti successivamente trasferiti, assegnati originariamente al Commissario quali residui risalenti all'anno 1997, risultano erogati €.66.517.673,40 e resta quindi una disponibilità di €. 42.670.842,91.

Con dette risorse disponibili dovrà provvedersi sostanzialmente al recupero del viadotto Ficocchia per €.1.942.884,85, alla realizzazione dello svincolo per Muro Lucano per €. 7.362.418,05, alla pannellatura della galleria Montenuovo per €. 1.100.000,00, all'eventuale illuminazione di Rapone, al pagamento del saldo dei lavori del 2° lotto, del 3° lotto 1° stralcio e dei lavori del viadotto Farenga, alle eventuali riserve per presunti 700 mila €, al completamento delle procedure espropriative.

In definitiva, senza considerare i ribassi sui lavori in particolare dello svincolo di Muro Lucano, resterebbero comunque circa €. 31.500.000,00 di economie sui residui, si ripete risalenti all'anno 1997, mai aggiornati.

Con dette risorse dell'anno 1997 stanziato per realizzare i lavori allora di progetto rimasti incompiuti questo Ufficio oltre a detti completamenti, ha aggiornato i progetti, ha eseguiti numerosi lavori di adeguamento alle nuove norme intervenute, ha riparato frane e scoscendimenti importanti, ha ripristinato le opere ammalorate, ha curato ogni aspetto connesso con la sicurezza non previsto in origine, ha realizzato migliorie importanti per milioni di €. (vedasi per tutte pannellature gallerie, impianti illuminazione, ecc.). In più dall'anno 2012 ha finanziato la propria stessa esistenza.

Le notevoli economie recuperate sulle somme assegnategli sono state rese possibili mediante:

- riprogettazione razionale di lavori e suddivisione funzionale degli stessi;
- affidamento di incombenze tecniche all'interno dell'Amministrazione;
- oculata gestione delle risorse evitando ogni possibile contenzioso;
- definizione di circa 800 transazioni in campo espropriativo con risultati economici notevoli a vantaggio dell'Amministrazione;

2b.5)

- impegno lavorativo spontaneo dei funzionari pubblici MISE addetti (peraltro part-time con unica eccezione) alla Struttura Commissariale oltre ogni limite abituale, con presenza e comunque reperibilità continua;
- instaurazione di rapporti collaborativi ottimali con il territorio in tutte le sue espressioni;
- assoluta trasparenza e quindi fiducia e disponibilità da parte dei terzi.

Si ritiene pertanto che, a parte il progetto 6053 che segue, la gestione commissariale potrebbe concludersi per la parte ex art. 32 L. 219/81 entro i primi mesi del 2019 esclusi i lavori in fase di affidamento e di consegna.

Per tale motivo è importante che il subentro al 31.12.2018 da parte dell'Amministrazione/i trasferitaria/e avvenga con continuità partendo con immediatezza.

Tra i risultati più significativi raggiunti da questa gestione figurano pertanto, in conclusione:

- qualificazione, aggiornamento, crescita professionale di tutti i funzionari MISE di supporto;
- oculata gestione del denaro pubblico;
- esclusione sostanziale di contenziosi (un caso) nei confronti del Commissario e di riserve (un caso) da parte degli appaltatori;
- instaurazione di meccanismi per l'immediatezza delle verifiche, dei controlli e dei pagamenti (nessuna somma per interessi o oneri connessi);
- autofinanziamento con economie sui lavori;
- utilizzazione di risorse risalenti all'anno 1997 realizzando opere ed interventi ulteriori e concretizzando una economia finale;
- fiducia del territorio e delle istituzioni locali sull'operato dello Stato.

Qualche strumentale voce politica e giornalistica contraria, su basi suggestive e generiche relative al terremoto dell'Irpinia è facilmente contestabile perché per lo più non conferente.

Prog. n. 39/40//6053: (Viabilità FVS – 1° lotto)

Come noto, detto progetto, unico di completamento rimasto nelle competenze MISE per le particolari condizioni in cui era venuto a trovarsi sotto il profilo contabile ed amministrativo, è stato trasferito alle competenze dell'Ufficio Commissariale con D.M. del 2.8.2017. In data 4.5.2018 è stata accreditata la somma residua di €. 7.223.625,29 per la definizione tecnica e amministrativa delle opere.

E' nota peraltro la situazione di contenzioso esistente tra Concessionario e MISE in cui il medesimo progetto versa.

L'Ufficio del sottoscritto è in attesa di ricevere dalla Div. 8/DGIAI le necessarie ulteriori documentazioni richieste con note n. 28.784 del 12.10.2017, n. 29.721 del 4.1.2018, n. 30.193 dell'8.2.2018, n. 31.466 del 28.6.2018, n. 31.991 del 27.8.2018.

All'AGS, inoltre, è stato chiesto, con nota n. 29.645 del 21.12.2017, l'effettivo stato contenzioso con l'ex Concessionario, che risulta tuttavia definito in Appello a favore dell'Amministrazione con

2b.5)

Sentenza n. 5631/2017 del 23.5.2017 della Corte di Appello di Roma Prima Sezione Civile, impugnata dal medesimo ex Concessionario mediante ricorso in cassazione.

Ulteriori contenziosi sussistono con alcuni professionisti (eredi Criscuolo; eredi Vallebella). Per quanto riguarda il contenzioso Vallebella questo Ufficio, con nota n. 32.103 del 6.9.2018, ha chiesto, sulla base della nota della Div. II Contenzioso della DGIAl n. 256496 del 20.7.2018, al legale degli eredi Vallebella gli elementi utili al fine del pagamento di quanto stabilito dalla Sentenza n. 11758/2017 del Tribunale di Roma.

Per quanto riguarda il contenzioso Criscuolo si sono avuti ulteriori contatti con il legale degli eredi Criscuolo con il quale è stato fissato incontro per il 9.10 p.v..

Si ritiene tuttavia che il saldo riconosciuto a detti eredi Criscuolo e Vallebella con separate Sentenze passate in giudicato, contrasti con la dichiarata inidoneità del Certificato di Collaudo, come sempre sostenuto da questo Ufficio.

Al fine di un definitivo chiarimento, è stata interessata l'AGS tramite la Div. 2/DGIAl.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/09 art. 86

2b.6) I CONTENZIOSI E LE ATTIVITA' RESIDUE

Nessun rilievo e tanto più nessun contenzioso è stato mosso a partire dall'inizio dell'attività Commissariale (21.2.2003) nei confronti del sottoscritto e dei suoi collaboratori.

Si richiamano tutte le precedenti Relazioni dalle quali risulta che soltanto la Provincia di Potenza ha excepto su un Decreto Commissariale, risultando però soccombente sia al TAR che al C.S.

Altro contenzioso coinvolgente indirettamente il Commissario è quello denominato "Piumelli", volto a contestare attività del MiSE poi trasferite a questo Ufficio, e quello denominato "Massari" pure originato da attività precedenti quelle Commissariali.

Vari e pesanti sono invece i contenziosi concernenti progetti assegnati alle competenze di questo Ufficio e che tuttora, a distanza di molti lustri, non risultando definiti impediscono l'esecuzione di attività conclusive in termini contabili e contrattuali.

Da sottolineare che la Struttura Commissariale, composta da soli funzionari MiSE della DGIAI, 6 elementi part-time ed uno solo a tempo pieno, si avvale per questioni di Contenzioso della Div. II[^] di tale Direzione, e per i compiti di Ragioneria alla Div. V[^].

In realtà questo Ufficio fornisce relazioni tecnico-amministrative alla Div. II[^] oltre alle eventuali perizie di parte, e provvede direttamente ai pagamenti più urgenti (ad evitare ritardi ed interessi) sostituendosi nell'attività specifica alla Div. V[^], alla quale fornisce comunque le distinte di pagamento già istruite, complete anche delle eventuali verifiche ex Equitalia.

Dalle documentazioni agli atti è individuabile, ricostruibile e verificabile ogni atto e corrispondenza relativa ai singoli procedimenti per quanto riguarda l'attività Commissariale e lo stato dell'arte.

Gravissima è risultata comunque nell'economia del lavoro l'abolizione della consulenza giuridica diretta, come ripetutamente segnalato, senza però alcun esito.

**COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02
D.M. 21.12.2005**

Comma 1: Elenco progetti con contenzioso (ex MiSE)

	reggr.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	OGGETTO CONTENZIOSO
1	39	40		6006	AV	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	N.I. Calitri	SORTO ANTE NOMINA COMMISSARIO Espropriazioni (Gervasi c/MISE)
2	39	40		6007	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	N.I. Contursi	Espropriazioni (Di Menza c/MISE)
3	39	40		6053	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Fondo Valle Sele 1° lotto	Lavori (COINFRA c/MISE) - Espropriazioni (vari c/MISE)
4	39	40		6055	AV	CONSORZIO IN.FR.AV.	Fondo Valle Sele 3° lotto	Espropriazioni (Comune di Caposele c/MISE)
5	39	40		6068	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Oliveto Citra	Lavori (COINFRA c/MISE)
6	39	60		6077	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 2° lotto	Lavori (Pizzarotti c/MISE) - (riserve-pag.saldo)

2b.6)

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02

D.M. 21.12.2005

Comma 1: ELENCO PROGETTI CON ATTIVITA' CONTABILI E CONCESSORIE DA CONCLUDERE

	reg.	regione	sigla	numero di progetto e lotto	PROV	Concessionario	LAVORI	NOTE
1	39	40		6006	AV	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	N.I. Calitri	In corso completamente espropri
2	39	40		6012	AV	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	N.I. Nerico	In corso completamente espropri
3	39	40		6016	AV	CONSORZIO INCOMIR	N.I. S.Miango sul Calore	In corso completamente espropri
4	39	40		6053	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada Fondo Valle Sele 1° lotto	Collaudo - Pagamento professionisti
5	39	40		6068	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada Fondo Valle Sele-Oliveto Citra	Pagamento professionisti
6	39	60		6069	PZ	I.C.L.A. COSTR.GENERALI SPA	Strada Rapone-Ofantina-Muro Lucano	In corso completamente espropri
7	39	40		6071	AV	CONSORZIO INCOMIR	Svincolo ferroviario S.Miango sul Calore	In corso completamente espropri
8	39	40		6075	SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Ospedale di Oliveto Citra	Restituzione saldo a debito del Concessionario
9	39	40		6104	AV	CONSORZIO GI.T	Impianto depurazione N.I.Conza	Verifica per eventuale trasferimento suoli al Consorzio ASI di Avellino



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

2b.7) GLI ESPROPRI E LE TRANSAZIONI

Come più volte relazionato, il settore espropriativo è risultato assai insidioso sia per la frammentazione delle documentazioni ricevute in sede di trasferimento, sia per la vastità della materia.

Decine di migliaia di particelle sono state oggetto di ricognizioni (presso più archivi) da parte di questo Ufficio, di verifiche, di frazionamenti ecc.

Ovviamente per alcune attività specialistiche (immissioni in possesso, frazionamenti ecc.) si è ricorsi a professionalità esterne, attentamente selezionate.

Ma soprattutto, una volta definite le problematiche e le procedure specifiche, si è provveduto a centinaia di transazioni con un enorme impegno professionale e temporale ma anche con economie per svariati milioni di Euro.

Questioni ancora non del tutto risolte concernono le questioni demaniali mai affrontate dal 1981 all'anno 2003.

Cronoprogrammi attendibili anche se non dotati di certezze profetiche sono stati forniti al MIT per eventuale subentro e, naturalmente, al MiSE.

In relazione alle nuove acquisizioni di aree questo Ufficio ha provveduto direttamente a tutte le incombenze, mentre per le questioni annose ed irrisolte riguardanti in particolare le Concessioni revocate dal MiSE, ci si è avvalsi della collaborazione della Soc. Areateknica rimasta a carico del Concessionario ICLA revocato, grazie ad atto transattivo Commissariale che ha anche ridotto il pignoramento esecutivo vigente presso il MiSE di svariati milioni di Euro.

Per quanto possa sembrare non credibile, si sottolinea che tale indiscutibile successo, passato sotto assoluto silenzio da parte del MiSE, è stato ottenuto grazie ai riconoscimenti di stima e di affidabilità nei confronti di questo Ufficio, che ha fondato la propria azione sulla disponibilità, sulla lealtà, sulla tempestività e sulla ricerca dell'efficienza operativa a favore di ogni interlocutore e soggetto terzo.

ESPROPRI EX ART. 32 LEGGE 219/1981
SITUAZIONE AL 31/05/2018

N.	Progetto	Riferimento Progetto	Totale Particelle da definire	Pratiche con superfici in variazioni di competenza diretta MISE.	Particelle Da Definire	Particelle da Definire					Totale
						Decreti in fase di predisposizione	Offerte Indennità Proposte	Atte Costatate in attesa della documentazione per la stipula della transazione	In corso depositi nella ex Cassa DD.PP.	In attesa di stime commissione (Potenza - Avellino)	
1	Nucleo Industriale di Nerico	39/40/6012	4	0	4	0	4	4	0	4	4
2	Nucleo Industriale di Caliri	39/40/6006	129	0	129	18	8	27	76	129	129
3	Svincolo Caliri - Ojantina	39/40/6064	10	0	10	5	7	3	10	10	10
4	Strada Caliri Ojantina	39/40/6063	77	0	77	15	32	25	77	77	77
5	Strada Rapone	39/60/6069	36	0	36	16	11	4	5	36	36
6	Strada Baragliano	39/60/5062	57	7	50	15	14	0	12	50	50
7	Strada Muro Lucano	39/60/6057	561	85	476	82	50	21	162	476	476
			874	92	782	128	193	80	255	782	782

(*) Trattasi di particelle in variante di diretta competenza della struttura commissariale (Es. Prat. Ferrara - Prog. 6062 - Prat. Cesuro - prog. 6057 etc.)

(**) Comprende ditte proprietarie che hanno stipulato atto di transazione a saldo e ditte che hanno ricevuto acconto ma redigendo la stima definitiva non devono percepire alcun ulteriore importo

(***) Sono in corso le offerte delle indennità - Circa il 50% già eseguite ed in attesa di risposte da parte degli aventi diritto. Per le restanti sono in corso le stime a saldo da validare da parte della struttura commissariale - Successivamente si procederà all'invio agli aventi diritto.

(****) Ditte che hanno comunicato la loro volontà di definire ma che devono completare l'invio della documentazione

(***** E' in corso il deposito nell'ex cassa DD.PP. per le ditte non concordatarie

(***** Sono state richieste alle commissioni espropri di Potenza e di Avellino già da diversi anni. Solo adesso la commissione di Potenza sta cominciando a provvedervi ma con molta lentezza. La commissione di Avellino vi ha provveduto in un primo momento ma attualmente si è completamente fermata.

CRONOPROGRAMMA SVOLGIMENTO ATTIVITA' PER DEFINIZIONE PROCEDURE EX ART. 32		GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'							
1A	Acquisizione della documentazione necessaria alla stipula degli atti di transazione.							
1C	Inizio e firma degli atti di transazione a saldo da sottoscrivere presso la struttura commissariale.							
2A	Predisposizione delle schede di valutazione per le ditte che hanno ricevuto (da R.L.A. e/o dalla Struttura Commissariale) un anticipo delle indennità.							
2C	Approvazione delle stime a saldo redatte da (1) per le ditte che hanno concordato l'indennità e ricevuto l'acconto							
3A	Predisposizione offerte indennità a saldo ed invio alla definizione dell'atto transattivo a saldo							
3C	Transmissione delle offerte indennità a saldo per le ditte concordatarie							
4A	Predisposizione dei documenti necessari al deposito delle indennità espropriative presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DI) PP.) per le ditte che nei termini stabiliti non producono la documentazione necessaria per lo stipula dell'atto transattivo							
4C	Deposito presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DI) PP.) delle indennità non accollate mediante bonifico							
5A	Predisposizione offerte indennità determinata dalle commissioni espropri (Potenza - Avellino)							
5C	Invio offerte indennità determinata dalle commissioni espropri (Potenza - Avellino)							
6A	Predisposizione dei documenti necessari al deposito delle indennità espropriative presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DI) PP.) per le ditte che ricevono la stima della commissione espropri. nei termini stabiliti. non producono la documentazione necessaria per lo stipula dell'atto transattivo							
6C	Deposito presso la ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DI) PP.) delle indennità non accollate di cui al punto 6A							
7A	Predisposizione dei decreti definitivi di esproprio							
7C	Emissione decreti definitivi di esproprio							
8A	Registrazione - Transcrizione - Volture e Notifica dei decreti definitivi di esproprio							

A Attività di ricognizione e verifica
C Attività di deliberazione

Nota 1 Il rispetto dei termini del cronoprogramma sono direttamente subordinati, soprattutto, alle attività di competenza delle commissioni espropri

Nota 2 Il punto 5C, in assenza delle stime delle commissioni entro il 15.09.2018, può essere sostituito dall'offerta dell'indennità provvisoria al fine di consentire entro il 31.12.2018 la definizione anche di queste procedure mediante emissione del decreto definitivo di esproprio

ESPROPRIEX ART. 32 LEGGE 219/1981 Progetto 39/60/6057													
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 31 AGOSTO 2018													
N	Progetto	Riferimento Progetto	Totale Dite interessate della procedura	Dite per le quali sono stati emessi i Decreti (Bancari)	Dite per le quali è in fase di predisposizione il decreto definitivo	Dite per le quali sono state proposte le procedure cautelative	Dite che non devono percepire alcun ulteriore importo	Dite interessate della nuova convenzione Maggio 2018 a seguito del finanziamento in Ufficio Contabile e Genio Della Fidej.	Dite in attesa delle documentazioni per la stipula della transazione	Dite che hanno pervenuto inquisizioni e sono dovute restituire	Dite per le quali è depositato nelle Casse DD.PP. Detti Territoriali dello Stato	Dite non interessate a titolo di commissione (Prestazioni)	Totale Dite
1	Strada Mario Luciano	39/60/6057/1/1	136	42	1	0	10	23	50	10	15	0	136
2	Strada Mario Luciano	39/60/6057/1/1	86	34	0	0	4	24	11	2	6	0	86
3	Strada Mario Luciano	39/60/6057/2/1/1	33	8	1	0	2	0	1	0	7	0	33
4	Strada Mario Luciano	39/60/6057/1/1/1/1/1	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	5
5	Strada Mario Luciano	39/60/6057/1/1/1/1/1/1	8	2	0	0	0	0	0	0	1	0	8
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
(*)	Totale di dite in viazione a seguito dei frantumamenti redatti e della convenzione sottoscritta in data 22/05/2018. Sono in corso la redazione degli accordi bancari e la redazione delle ditte a saldo da validare da parte della scrivania commissariale. A seguito delle verifiche si provvederà alla restituzione delle incanti alle 49 ditte interessate.												
(**)	Comprende dite proprietarie che hanno stipulato atto di transazione a saldo e dite che hanno ricevuto avvello ma ridigendo la somma dell'atto non dovuto percepita alcun ulteriore importo.												
(***)	Dite per le quali sono stati emessi i Decreti Definitivi												
(****)	Dite per le quali sono in fase di predisposizione i Decreti Definitivi												
(*****)	A seguito delle verifiche dell'ufficio commissariale si definiranno le Dite che dovranno essere inviate alla Ragioneria Territoriale di Procura ex DD.PP.												
(*****)	A seguito delle verifiche dell'ufficio commissariale si definiranno le Dite che dovranno essere inviate alla Commissione Provinciale Espertari												
(*****)	Dite che hanno percepito importi superiori a quanto dovuto e devono restituire												

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE 49 DITTE INTERESSATE DALLA CONVENZIONE DEL 23 Maggio 2018																
		LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Gen-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mag-19	Giun-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	
1	Dato per le quali si prevede la somministrazione degli servizi bus per l'arrivo della procedura					20												
	Dato per le quali si prevede la somministrazione degli servizi bus per l'arrivo della procedura						29											
	Dato per le quali si prevede la somministrazione degli servizi bus per l'arrivo della procedura							10										
2	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo, dalle amministrazioni provinciali, comunali e regionali					10												
3	Adempimento previsto dal regolamento del Comune di Roma (D. 10/10/18) delle modalità di attuazione della procedura di gara di affidamento di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
4	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
5	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
6	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
7	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
8	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	
9	Prodotto come offerta sul mercato di servizi di trasporto pubblico per le ditte con un reddito meno di 400 mila euro annuo																	

Il rispetto dei termini del cronoprogramma sono afferenti alle subattività, alla somministrazione delle prestazioni, al pagamento delle indennità di
N. 1 / corrispondere ad una attività di competenza della Commissione Provinciale Esperta

<p align="center">CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLE 108 DITTE NON INTERESSATE DALLA CONVENZIONE DEL 23 Maggio 2018</p>		LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	
N	DESCRIZIONE ATTIVITA'																	
1	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 4) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019					63												
2	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019					15			30									
3	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019								16									
4	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019												16					
5	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019													16				
6	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019														16			
7	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019																	
8	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019																	
9	1) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro dicembre 2018 2) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro maggio 2019 3) Per le quali si prevede la definizione della procedura entro la fine dell'anno 2019																	

Il rispetto del cronoprogramma sono direttamente subordinati, alla sottoscrizione delle convenzioni, ai pagamenti delle indennità da versare alle ditte interessate ed alle attività di emergenza dalla Commissione Provinciale Espressi

Report Decreti definitivi di esproprio

24/09/2018

Numero Decret	Data Decreto	N Progetto
1355	09/04/2015	60/6057/2
1382	22/04/2015	60/6062
1386	04/05/2015	060/6062
1387	11/05/2015	60/6062
1388	26/05/2015	60/6057
1389	08/06/2015	40/6064
1410	21/07/2015	40/6063
1411	27/07/2015	40/6063
1413	28/07/2015	06057/2
1414	04/08/2015	60/6057/1
1417	14/09/2015	40/6006
1420	16/09/2015	40/6006
1438	28/09/2015	60/6057/2
1440	06/10/2015	60/6057/2
1442	14/10/2015	60/6057/2
1443	22/10/2015	060/6057/2
1445	28/10/2015	60/6057/2
1453	16/11/2015	60/6057/2
1456	25/11/2015	60/6057/3/1
1460	15/12/2015	060/6057/1
1469	07/01/2016	60/6057/2
1470	07/01/2016	60/6057/2
1471	11/01/2016	60/6062
1495	13/01/2016	60/6069
1497	03/02/2016	40/6006
1498	03/02/2016	40/6006
1499	19/02/2016	60/6057/3/1
1502	01/03/2016	60/6057/2
1503	01/03/2016	60/6057/2
1532	02/05/2016	40/6063
1536	12/05/2016	40/6064
1537	18/05/2016	40/6006
1538	18/05/2016	40/6012
1541	06/06/2016	60/6057/1
1547	12/07/2016	60/6057/2
1548	18/07/2016	60/6057/2
1568	12/09/2016	60/6057/1
1569	12/09/2016	60/6062
1571	19/09/2016	60/6057/2
1572	19/09/2016	60/6062
1573	28/09/2016	60/6069
1574	03/10/2016	60/6057/2
1575	03/10/2016	60/6057/2
1576	10/10/2016	60/6057/3
1579	19/10/2016	60/6062
1580	28/10/2016	40/6063
1581	28/10/2016	60/6057/2

Report Decreti definitivi di esproprio

24/09/2018

Numero Decret	Data Decreto	N Progetto
1582	28/10/2016	60/6057/1
1583	02/11/2016	60/6057/2
1617	09/01/2017	60/6057/3/1
1620	07/02/2017	60/6057/3/1
1635	08/03/2017	60/6057/2
1645	11/04/2017	40/6006
1646	11/04/2017	60/6057/1
1647	11/04/2017	60/6057/2
1649	19/04/2017	60/6057/2
1650	19/04/2017	60/6062
1707	28/08/2017	60/6057/2
1713	20/09/2017	60/6057/2
1714	20/09/2017	60/6057/3/1
1715	21/09/2017	60/6057/3/
1717	27/09/2017	060/6057/2
1718	27/09/2017	60/6062
1719	02/10/2017	60/6057/3/1
1730	03/11/2017	60/6057/3/1
1805	15/12/2017	60/6057/2
1810	18/12/2017	60/6057/3/1
1811	18/12/2017	60/6057/1
1814	29/12/2017	60/6057/1
1815	29/12/2017	60/6057/1
1816	29/12/2017	60/6057/3/1
1817	29/12/2017	60/6062
1820	08/01/2018	040/6012
1821	08/01/2018	040/6063
1822	12/01/2018	60/6057/2
1823	12/01/2018	60/6069
1824	12/01/2018	40/6006
1825	12/01/2018	40/6064
1829	30/01/2018	60/6057/2
1831	30/01/2018	60/6062
1832	30/01/2018	040/6063
1834	12/02/2018	60/6069
1835	12/02/2018	60/6062
1844	15/02/2018	40/6006
1849	19/03/2019	60/6057/2
1850	19/03/2018	60/6057/3/1
1856	20/04/2018	40/6003
1857	20/04/2018	40/6006
1859	26/04/2018	40/6006
1860	26/04/2018	40/6012
1874	15/05/2018	40/6063
1877	18/05/2018	60/6057/3/1
1878	18/05/2018	60/6057/3/1
1891	30/05/2018	60/6057/1

Report Decreti definitivi di esproprio

24/09/2018

Numero Decreto	Data Decreto	N Progetto
1892	01/06/2018	60/6057/2
1897	04/06/2018	40/6063
1898	04/06/2018	60/6057/2
1903	11/06/2018	60/6069
1909	04/07/2018	40/6063
1910	04/07/2018	60/6069
1911	04/07/2018	60/6057/3/1
1926	13/07/2018	40/6006
1928	18/07/2018	60/6069
1935	31/07/2018	60/6057/1
1951	18/09/2018	60/6062
1952	20/09/2018	60/6057/2

PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		NUMERO	TRANSAZIONI	
			DITTE	IMPORTI €. al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e	DITTE	IMPORTI RICHIESTI €. al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria		PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
6057	2	Pescopagano	Comune di Pescopagano (PZ)	342.508,64			1	220.954,87	
6057	1	Pescopagano	Di Napoli Antonia	2.641,00			2	1.690,78	
6057	1	Pescopagano	Borea Pietro	36.737,04			3	15.759,47	
6057	1	Pescopagano	Masini Margherita	3.079,87			4	1.737,77	
6057	2	Muro Lucano	Meluso Antonio	77.150,41			5	28.076,95	
6057	2	Castelgrande	Coppola Teresa	5.757,59			6	5.240,53	
6057	3	Castelgrande	Federici Vito, Muro Angela Maria	20.950,70			7	10.211,38	
6057	1	Pescopagano	Angiolillo Chiara	6.928,24			8	3.477,93	
6057	2	Muro Lucano	Rendina Santo Giovanni	13.563,13			9	5.164,19	
6057	2	Castelgrande	Coppola Vito	10.573,85			10	11.235,64	
6057	2	Castelgrande	Greco Agatina	8.324,41			11	5.459,53	
6062		Muro Lucano	Pepe Franco, Coca Russo Rosaria	686.535,54			12	497.083,04	
6057	2	Pescopagano	Pinto Giuseppina	26.170,23			13	10.673,28	
6057	2	Muro Lucano				Rendina Gerardo	14		26.759,14
6057	2	Muro Lucano				Tarricone Mario	15		8.749,65
6057	3	Muro Lucano	Cerone Vita Maria	59.038,04			16	20.267,81	
6057	2	Muro Lucano				Altieri Luigi (Rosario)	17		4.115,60
6057	1	Pescopagano	Roselli Francesco P., Pinto Teresa	9.738,62			18	6.345,07	
6057	1	Pescopagano	Roselli Arcadio Gerardo	7.302,32			19	2.873,41	
6057	1	Pescopagano	Zarrilli Giuseppe	6.868,94			20	3.223,91	
6057	1	Calliri	Metallo Michela	18.920,24			21	18.920,54	
6063		Calliri	Maffucci Teresa	30.191,55			22	13.041,80	
6064		Calliri	Maffucci Teresa	15.568,28			23	6.715,00	
6063		Calliri	Pastore Antonio Raffaele	15.909,12			24	15.909,12	
6057	1	Pescopagano	Erico Maria Lucia	45.620,37			25	24.553,42	
6063		Calliri	Zarrilli Vincenzo	4.287,83			26	1.626,45	
6063		Calliri	Santoro Iolanda, Capossela Giuseppe	29.097,15			27	10.617,46	
6057	2	Muro Lucano	Rendina Gerardo e Magro Carmela	10.504,04			28	3.366,36	
6057	3	Castelgrande	Gasparri Maria	14.229,84			29	5.951,79	

OMISSIS

OPUSCIS

PROG	Lotto Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		NUMERO	TRANSAZIONI	
		DITTE	IMPORTI RICHIESTI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e	DITTE	IMPORTI RICHIESTI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria		PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
			€		€		importo lordo	
TOTALI			6.350.513,46				3.849.631,21	4.408.043,82
							Euro	
TOTALI GENERALI							3.267.875,03	

* a fronte dei mesi soprapportati di effettiva occupazione della particella sono stati riconosciuti n.96 mesi



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

2b.8) I PARERI CONSULTIVI

Si è già accennato in questa sede ed ampiamente detto nelle precedenti Relazioni Commissariali circa l'assoluta necessità di disporre di una consulenza giuridica specialistica per i LL.PP., diretta ed immediatamente consultabile.

Fino all'anno 2012 tale consulenza (assegnata a professionista di riconosciuta competenza) ha prodotto un notevole numero di circostanziati pareri, a volte definitivamente chiarificatori, a volte inviati da questo Ufficio all'AGS, per conferma della base conoscitiva e della situazione proposta.

Aggiungendo a detta condizione essenziale la competenza indiscussa dell'Ufficio e la instaurazione di rapporti leali e costruttivi con i terzi, può affermarsi che non solo non sono stati avanzati contenziosi, ma si è goduto di una credibilità sul territorio che ha semplificato le relazioni interpersonali e con ogni Ente pubblico, ottenendo risultati in ordine soprattutto temporale di sicuro rilievo.

La forzata cessazione del rapporto di consulenza di cui sopra per incomprensibili motivazioni attribuite ad un insano (nella fattispecie) principio di spending-review¹⁾, certamente suggerito da funzionari ministeriali superficiali e non responsabili ha causato sicure difficoltà all'Ufficio, più volte peraltro evidenziate.

A parte ciò, vari pareri sono stati richiesti dal sottoscritto alle Avvocature ed anche all'ANAC, alcuni dei quali fondamentali.

Tra i pareri resi dall'ANAC figura tuttavia quello concernente la non complementarietà dei lavori dello Svincolo per Muro Lucano che, come già detto, non trova condivisione da parte del sottoscritto che lo giudica quanto meno precipitoso.

Alla replica pertanto avanzata non è stato dato ulteriore riscontro.

Nel rispetto di tale parere è stato quindi ridotto il lavoro già appaltato ed in corso, nei confronti del quale lo Svincolo suddetto doveva essere considerato complementare in base al quesito ed avviata la procedura per la relativa gara, tuttora non perfezionata dal Provveditorato avvalso con evidenti ripercussioni negative.

¹⁾ Si è ripetutamente segnalato come il sottoscritto abbia applicato i principi della spending-review con provvedimenti ben precedenti, tanto da restituire all'Amministrazione oltre 100.000 €/anno sulle spese di funzionamento. La riduzione delle risorse a tal fine del **66%** dimostra inequivocabilmente la miopia di una burocrazia di immagine e nel contempo di assoluta e dannosa inefficienza.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

2b.9) L'INCENTIVO

Ben diverso è stato il comportamento dei funzionari del Provveditorato sede di Potenza rispetto a quanto riportato nell'analogo paragrafo riguardante i lavori della Lioni-Grottaminarda.

Si rinvia tuttavia a quanto in detto paragrafo riportato, per non appesantire la presente Relazione.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 239/02 art. 56

2b.10) LE RELAZIONI SULL'ATTIVITA'

L'Ufficio Commissariale, a partire dal mese di giugno 2003, ha prodotto le seguenti relazioni e rendiconti:

Al MiSE (inizialmente GAB poi DGIAD)	Alla Corte dei Conti	Al Parlamento, Commissioni, MIT, ANAC
112 relazioni con cadenza bimestrale	14 relazioni annuali, a partire dall'esercizio 2014 a tutto il 2017	2 semestrali e 1 di fine anno, per un totale dal 2016 di 8 compresa la presente

Su richiesta della Regione Basilicata sono state prodotte nel corso degli anni Relazioni di aggiornamento sui lavori.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

3) L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMMISSARIALE

La Struttura Commissariale si articola in primo luogo in un Ufficio composto dal Commissario, da sette funzionari MiSE part-time (Ufficio di Salerno, uno dei quali oltre ad importanti compiti di Direzione dei lavori svolge le funzioni di Coordinamento dell'Ufficio), più un funzionario MiSE a tempo pieno (Ufficio di Roma) per il coordinamento delle segreterie, quest'ultimo con presenza continua e costante presso il sottoscritto e per i restanti con reperibilità praticamente senza soluzioni di continuità anche nei giorni festivi.

Per le attività di Stazione Appaltante, tra le alternative di legge che ne prevedevano l'individuazione nel Provveditorato ovvero nella provincia competenti per territorio, il sottoscritto operò la prima scelta oltre che per la tradizione e stabilità della struttura decentrata del Ministero, e quindi di valenza nazionale, anche per evitare eventuali effetti da modificazioni di carattere politico.

Con i Provveditorati di Campania e di Basilicata (oggi unificati) sono vigenti tuttora 3 Convenzioni di avvalimento.

Da sottolineare, come già segnalato, che tale organizzazione ha funzionato in maniera del tutto soddisfacente nella regione Basilicata con il personale del Provveditorato Puglia e Basilicata (poi come detto confluito nel Provveditorato Campania e Molise, Puglia e Basilicata), dove sono stati realizzati gli importanti interventi infrastrutturali altrove descritti¹.

Problemi organizzativi sono invece sorti nella regione Campania in relazione proprio ai lavori della Viabilità Lioni – Grottaminarda, tanto da portare almeno in passato a rendere non facili i rapporti tra Commissario e Provveditorato, anche a causa delle lagnanze e riserve rappresentate dal Concessionario..

In particolare sono stati sollevati i seguenti rilievi nei confronti di tale gestione:

a) Particolare farraginosità della Struttura nel suo complesso

Sostanzialmente la Struttura pubblica che governa detta viabilità è composta dall'Ufficio Commissariale di cui sopra, dalla Stazione Appaltante (Provveditorato) di cui sopra, dal RUP (Funzionario ora dirigente Regionale), dalla Direzione dei lavori (esterna).

Per la verità ognuna di tali articolazioni ha i propri precisi compiti che mai dovrebbero interferire o sovrapporsi.

Ma l'aspetto meno condivisibile di una diagnosi che concludesse per una certa pesantezza e farraginosità della organizzazione gestionale, è che tale organizzazione sia stata voluta e importata dal Commissario.

¹ Va detto che anche i lavori di completamento infrastrutturale in Campania (prog. 6063 e prog. 6064) furono condotti con l'avvalimento del Provveditorato Campania e Molise in maniera assolutamente soddisfacente.



Qui va infatti opposta l'osservazione che il sottoscritto si è avvalso (sempre con riferimento alla Viabilità Lioni – Grottaminarda), come accennato, con specifica Convenzione, dello stesso Provveditorato come Stazione Appaltante giusta art. 33 D.Lgs. 163/06 e quindi titolare di tutte le relative attività.

L'assenza della disponibilità a seguito di interpello o comunque di valutazioni di competenza, dichiarata dal Provveditore pro-tempore per l'incarico di Direttore dei lavori, comportava necessariamente la nomina di un professionista esterno da parte del sottoscritto².

Anche la richiesta regionale, principale finanziatrice dei lavori, di un proprio RUP veniva accolta dal medesimo Provveditorato e decretata dalla Regione senza alcuna intromissione del sottoscritto, non avendone titolo, e che infatti ha solo preso atto di tale determinazione.

In più tutto il personale prescelto per le restanti attività, inclusa la Commissione di Collaudo, è stato liberamente individuato dal Provveditore, avendone il sottoscritto preso successivamente soltanto atto nel rispetto della normativa in materia.

Non sembra davvero che si possano attribuire al Commissario appunti per miopia gestionale, né sembra di poter condividere alcuna sovrapposizione o interferenza di ruoli essendo ciascuno autonomo e complementare agli altri.

Nel merito invece occorre dire che la lettura della fitta corrispondenza intercorsa sulla efficienza operativa dimostra la sentita necessità di modificare qualcosa³.

Della nomina del Collaudatore statico subentrante al precedente dimissionario si è detto in varie precedenti relazioni, in particolare alla DGLAI/MiSE, e di cui al punto c) che segue.

b) Mancato pagamento dell'incentivo al personale

Tale effettiva situazione, lamentata dallo stesso Provveditore pro-tempore, costituisce in qualche modo reale giustificazione alle demotivazioni del personale del MIT addetto ai lavori ed a varie istanze di dimissioni, che risultano tuttavia rientrate da tempo.

Ma anche in questo caso sono state le stesse disposizioni e circolari ministeriali ad escludere, almeno nel caso in esame, tale possibilità.

Controverse e contraddittorie sono state spesso anche le interpretazioni delle norme da parte di varie Sezioni della Corte dei Conti, ma alquanto paradossali sono state alcune conclusioni del MIT (V. circolare "Chiovelli") che, a giudizio del sottoscritto, non aveva distinto i ben diversi rapporti contrattuali nascenti da obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, creando peraltro sperequazioni ingiustificabili tra dipendenti pubblici e liberi professionisti nell'espletamento del medesimo tipo di incarico.

La questione appare tuttavia in via di soluzione grazie alla recente Circolare MIT n. 36196 del 10.7.18 (in linea peraltro con quanto sostenuto dallo scrivente nelle varie sedi), ed il sottoscritto sta provvedendo in tal senso.

² L'incarico esterno era peraltro auspicabile essendo assai improbabile trovare le necessarie competenze per i lavori in esame presso la P.A., a parte la necessità di presenza quasi fissa sui lavori e la reperibilità che ne consegue, impossibile per un dipendente pubblico incaricato di altri compiti istituzionali d'Ufficio.

³ Tali considerazioni non devono indurre a ritenere riconoscibile alcuna pretesa in proposito da parte del Concessionario, non essendo riconducibili ad alcun danno in termini di attività produttive, fatta salva prova contraria.



La mancanza assoluta di un supporto giuridico⁴, come già segnalato, rende particolarmente gravoso il compito del sottoscritto che può basarsi solo sulla propria esperienza e sullo studio, senza però alcuna conferma nemmeno in prima approssimazione delle proprie convinzioni o interpretazioni.

e) Vacatio del Collaudatore statico

Il Collaudatore statico occupa una posizione fondamentale nell'ambito della stessa struttura organizzativa Commissariale e si è già accennato alle conseguenze di un periodo di vacatio di tale figura.

Nel caso specifico tra le dimissioni del precedente collaudatore e la nomina del nuovo sono intercorsi circa sei mesi, ma gli effetti negativi sotto il profilo operativo sono stati molto più estesi ed anche oggetto di riserve da parte del Concessionario⁵.

Si conferma la posizione del sottoscritto critica in relazione alle modalità delle dimissioni che si rintraccia nella fitta corrispondenza sull'argomento.

In conclusione va detto che la vastità della materia trattata dal Commissario non consente una informativa di dettaglio ricognitiva su ogni incombenza, né la possibilità di fornire tutti i relativi commenti ad ogni Relazione.

La lettura integrata delle Relazioni prodotte negli anni consente tuttavia di comporre pienamente il mosaico delle attività espletate e delle criticità eventuali.

Si aggiunga che Relazioni bimestrali che consentono un aggiornamento molto significativo, sono costantemente prodotte per il MiSE, mentre sotto il profilo contabile viene redatto un rendiconto annuale completo alla Corte dei Conti sulla contabilità speciale⁶.

⁴ La riduzione delle spese di funzionamento ad € 100.000 ha comportato la cessazione di una importante consulenza legale. La superficialità di tale riduzione è stata oggetto di numerose lagnanze da parte del sottoscritto per la ridotta garanzia da poter dare all'Amministrazione in termini giuridici e legali, lagnanze rimaste tuttavia inascoltate.

⁵ Dette riserve nel complesso per circa 30M€ sono state trattate con schema transattivo attualmente presso l'ADS di Napoli, che le annullerebbe totalmente.

⁶ Come ampiamente descritto in precedenti relazioni il Commissario gestisce due distinte contabilità: la speciale n. 3250 a controllo successivo e la ordinaria 2244 a controllo preventivo, destinata alle spese di funzionamento.



Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta L. 289/02 art. 86

4) LA CONTABILITA' ORDINARIA 2244 E LA DELEGA DAL DG

Il comma 3 dell'art. 86 della L. 289/02 (Finanziaria 2003) stabiliva in € 300.000,00/anno a carico del MISE il costo di gestione su apposita contabilità Commissariale ordinaria n. 2244 intestata "Spese per il funzionamento compreso il compenso, l'indennità ed il rimborso e spese di missione...", prevedendo la totale autonomia dell'Ufficio, e includendo a carico della stessa ogni onere per acquisto apparecchiature informatiche, per manutenzioni, per materiali d'uso e di ricambio ecc., oltre che per compenso commissariale (€ 65.000/anno) e sue missioni (autorizzate fino a circa 15.000€/anno ma limitate al massimo e rendicontate per una media di circa 5000€/anno).

Della suddetta disponibilità finanziaria di € 300.000, ogni anno, fino al 2011 incluso, il Commissario, antesignano della spending review, ha restituito una media di oltre 100.000€ al Ministero per un totale di oltre un milione di €.

Diversa è la situazione dal 2012: a giugno di tale anno, con d.l. 83 convertito nella L. 134 dell'8.8.2012, venivano ridotte ad € 100.000,00/anno le risorse per funzionamento.

Il provvedimento veniva per giunta interpretato dal MEF come retroattivo all'1.1.2012 e soprattutto il carico del finanziamento veniva spostato dal MiSE ad apodittiche economie sui lavori di competenza Commissariale.

Come già detto, la riduzione del 66% delle spese di funzionamento annuale (da € 300.000 a € 100.000) risultava tale da impedire non solo la prosecuzione di progetto finalizzato concordato con i sindacati, ma anche la consulenza giuridica, essenziale per incombenze complesse e variegate come quelle Commissariali e già oggetto di gara pubblica conclusa, ma anche di escludere la possibilità di effettuare la manutenzione delle numerose apparecchiature informatiche, con conseguenze gravi sulla inefficienza attuale di alcune di esse e sulla perdita di migliaia di dati per uno specifico incidente.

Si aggiungano infatti i ritardi inaccettabili nell'assegnazione delle risorse finché queste hanno fatto capo al MiSE, e si considerino i gravi contraccolpi di cui appresso sulla corretta funzionalità dell'Ufficio anche quando le risorse provengono dalla contabilità speciale dello stesso Commissario, a partire quindi dal 2012:

- Anno 2012 - assegnazione per cassa a novembre
- Anno 2013 - " " a settembre (con riduzione di € 5.000)
- Anno 2014 - " " a fine novembre
- Anno 2015 - " " a dicembre (oltre il 5.12 e quindi con impossibilità di erogazioni per tutto il 2015)
- Anno 2016 - " " a luglio
- Anno 2017 - " " a marzo (con riduzione di € 4000)
- Anno 2018 - " " a febbraio



A far data dall'esercizio 2016 è stata poi richiesta da parte dell'UCB una Determina del Direttore Generale I.I. di "delega delle funzioni necessarie per la gestione del capitolo 2244 - piano di gestione 1 - *"Spese per il funzionamento compreso il compenso, l'indennità ed il rimborso e spese di missione..."* - in favore del Commissario ad Acta, adottata quindi negli ultimi 3 esercizi finanziari.



182190035400
